

UHE BELO MONTE

RELATÓRIO DE ANDAMENTO

**ACORDOS ESTABELECIDOS ENTRE NORTE ENERGIA
E PREFEITURAS MUNICIPAIS**

EDUCAÇÃO – SAÚDE – SANEAMENTO BÁSICO

Março 2011

1. Introdução

As ações antecipatórias da UHE Belo Monte foram previstas no EIA e posteriormente no PBA, especificamente nos Planos de Requalificação Urbana e Plano de Saúde Pública. O objetivo dessas ações é o de preparar a região, especialmente as sedes dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu e comunidades próximas aos canteiros de obras, para a sobrecarga prevista nos sistemas locais de educação, saúde e saneamento.

Na Licença Prévia - LP 342/10 foram previstas condicionantes específicas que reforçam a necessidade de implantação das ações antecipatórias (Condicionantes 2.7, 2.10 e 2.11).

Logo após a assinatura do contrato de concessão com a ANEEL, em agosto de 2010, a Norte Energia, recém constituída, emvidou esforços de articulação junto as Prefeituras Municipais da Área de Influência Direta - AID da UHE Belo Monte, para estabelecer as parcerias previstas, uma vez que a responsabilidade para o atendimento as demandas de saúde, educação e saneamento é do Estado, nos casos previstos com ênfase nas responsabilidades municipais.

As tratativas, bem como os Acordos assinados, foram comunicados ao IBAMA por meio de correspondências ou dos relatórios de andamento das ações antecipatórias (1º relatório – Nov/10; 2º relatório – Dez/10; 3º relatório – Mar/11), além das freqüentes reuniões técnicas e da vistoria do IBAMA, em novembro de 2010, que enfatizou as ações antecipatórias.

A Licença de Instalação - LI 770/10, emitida em 26/01/11, estabelece que as informações sobre o andamento dos convênios sejam encaminhadas mensalmente por meio de relatório específico (Condicionante 2.9).

2. Parcerias Estabelecidas

Para o atendimento das ações antecipatórias no que se refere a fortalecimento da saúde, educação e saneamento a Norte Energia estabeleceu Termos de Anuência e Acordos de Cooperação Técnica e Financeira. As prioridades foram dadas aos municípios onde estão sendo instalados os canteiros iniciais, ou seja, Vitória do Xingu e Anapu, onde se localizam as comunidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal, respectivamente. Essas duas comunidades ficam próximas ao Canteiro do Sítio Belo Monte.

Também foram estabelecidas parcerias para atendimento a sede desses municípios, bem como com Altamira, cidade pólo da região, onde deve se concentrar a maior parte dos migrantes; Brasil Novo e Senador José Porfírio, localizados na AID, e Pacajá para ações de controle de malária.

A relação de termos de parceria celebrados pela Norte Energia e municipalidades encontra-se no quadro abaixo (Quadro 1).

Quadro 1 - Relação de Instrumentos de Parceria celebrados entre a NESA e Prefeituras Municipais para atendimento as ações antecipatórias das instalações iniciais

| Instrumento | Objeto | Data de Assinatura |
|--|--|---------------------------|
| <i>Vitória do Xingu</i> | | |
| Termo de Anuência SANEAMENTO | Construção de edificações – Sistema de Água e Esgoto da Localidade de Belo Monte. | 01/11/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação EDUCAÇÃO | Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação | 23/09/2010 |
| Termo de Anuência SAÚDE | Construção de Edificações e serviços de operacionalização – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Saúde | 01/11/2010 |
| Termo de Anuência SAÚDE | Construção de Edificações e serviços de Operacionalização – Adequação da Estrutura e Equipamentos de Saúde do Município | 01/11/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação SANEAMENTO | Formulação, detalhamento e apresentação de Projetos básicos de sistema de abastecimento de água e de sistema de esgotamento sanitário em Vitória do Xingu. | 16/09/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação SANEAMENTO | Formulação, detalhamento e apresentação de Projetos básicos de sistema de abastecimento de água e de sistema de esgotamento sanitário em Belo Monte. | 16/09/2010 |
| Termo de Anuência EDUCAÇÃO | Construção de edificações tendentes a adequação da estrutura de equipamentos de educação . | 01/11/2010 |
| Termo de Anuência SAÚDE | Construção de Edificações e Serviços de Operacionalização – Adequação da Estrutura e Equipamentos de Saúde do Município | 14/12/2010 |
| Termo de Anuência EDUCAÇÃO | Construção de edificações tendentes a adequação da estrutura de equipamentos de educação . | 14/12/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação SANEAMENTO | Viabilidade da Implantação de Aterro Sanitário . | 14/12/2010 |
| Convênio SAÚDE | Plano de Ação de Controle da Malária | 03/03/2011 |
| Termo de Acordo para Cooperação REQUALIFICAÇÃO URBANA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Projeto de requalificação urbana e articulação institucional – Sede e Belo Monte | 17/03/2011 |

| Instrumento | Objeto | Data de Assinatura |
|---|---|---------------------------|
| ANAPU | | |
| Termo de Anuência SANEAMENTO | Construção de Edificações – Sistema de Água e Esgoto da Localidade de Belo Monte do Pontal | 26/10/2010 |
| Termo de Anuência SAÚDE | Construção de Edificações – Adequação da Estrutura e Equipamentos de Saúde na Localidade de Belo Monte do Pontal | 26/10/2010 |
| Termo de Anuência EDUCAÇÃO | Construção de Edificações – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação de Belo Monte do Pontal | 28/10/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação EDUCAÇÃO | Formulação, detalhamento e apresentação do projeto de recomposição/adequação dos equipamentos de educação. | 21/09/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação SANEAMENTO | Formulação, detalhamento e apresentação de Projetos básicos de sistema de abastecimento de água e de sistema de esgotamento sanitário. | 14/09/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação SAÚDE | Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de equipamentos de Saúde. | 21/09/2010 |
| Convênio SAÚDE | Plano de Ação de Controle da Malária | 03/03/2011 |
| Termo de Acordo para Cooperação REQUALIFICAÇÃO URBANA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Projeto de requalificação urbana e articulação institucional – Belo Monte do Pontal | 17/03/2011 |
| ALTAMIRA | | |
| Termo de Acordo para Cooperação SANEAMENTO | Projetos Básicos – Sistema de abastecimento de Água e sistema de esgotamento sanitário. | 16/09/2010 |
| Termo de Anuência SEGURANÇA | Construção de Edificações e serviços de operacionalização – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Segurança | 19/11/2010 |
| Termo de Anuência SAÚDE | Construção de Edificações e Serviços de Operacionalização – Adequação da Estrutura e Equipamentos de Saúde do Município | 19/11/2010 |
| Termo de Anuência EDUCAÇÃO | Construção de Edificações – Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação. | 19/11/2010 |
| Termo de Anuência BALCÃO DE ATENDIMENTO | Balcão de atendimento | 11/11/2010 |
| Termo de Anuência SANEAMENTO | Implantação de Aterro Sanitário. | ---/01/2011 |
| Acordo de Cooperação técnica e financeira. SAÚDE | Auxílio financeiro ao hospital municipal no valor de R\$ 120.000,00 para contratação de profissionais da área de saúde, aquisição de medicamentos e materiais hospitalares. | 18/02/2011 |
| Termo de Acordo para Cooperação REQUALIFICAÇÃO URBANA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Projeto de requalificação urbana e articulação institucional | 17/03/2011 |

| Instrumento | Objeto | Data de Assinatura |
|---|--|---------------------------|
| Convênio SAÚDE | Plano de Ação de Controle da Malária | 03/03/2011 |
| BRASIL NOVO | | |
| Termo de Acordo para Cooperação EDUCAÇÃO | Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação | 23/09/2010 |
| Convênio SAÚDE | Plano de Ação de Controle da Malária | 03/03/2011 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | | |
| Termo de Acordo para Cooperação EDUCAÇÃO | Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Educação | 22/09/2010 |
| Termo de Acordo para Cooperação SAÚDE | Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura e Serviços de Saúde | 22/09/2010 |
| Convênio SAÚDE | Plano de Ação de Controle da Malária | 03/03/2011 |
| PACAJÁ | | |
| Convênio SAÚDE | Plano de Ação de Controle da Malária | 03/03/2011 |

3. Situação das obras

Obras para os setores de educação, saúde e saneamento estão entre os principais objetos dos Acordos estabelecidos.

O cronograma dessas obras encontra-se no **Anexo I**, com a previsão de início e término, bem como a justificativa de alterações de datas, conforme solicitado pelo IBAMA, por meio do Ofício 254/11.

Também no **Anexo II** são apresentadas fotos recentes (18/03/2011) da situação que se encontram as obras das ações antecipatórias.

4. Situação das Aquisições de Equipamentos e Materiais

Além das obras, uma série de equipamentos e materiais foi prevista nos acordos com as Prefeituras Municipais. Esses equipamentos e a situação em que se encontram suas aquisições são apresentados nos quadros do **Anexo III**, onde estão discriminados por município e área que serão aplicados – saúde, educação, saneamento, segurança, meio ambiente.

ANEXO I

**Cronograma das Obras das Ações
Antecipatórias**

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Fim - Relatório | | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Início | Fim - Relatório | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | Justificativas | | | | | | | |
| Ações Antecipatórias - LI nº 770/2011 (Instalações Específicas) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Educação Vitória do Xingu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escola (4 salas e equipamentos) | 22/11/2010 | 12/04/2011 | 31/08/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Popo semi-artesiano (escola) | 22/11/2010 | 30/04/2010 | 31/08/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Saúde Vitória do Xingu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hospital Municipal (Reforma e ampliação) Projeto - Contratação - Execução | 15/03/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Educação Belo Monte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escola (ampliação 2 salas) Projeto - Contratação - Execução | 15/12/2010 | 30/04/2011 | 31/07/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Belo Monte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Abastecimento de Água (Popo semi-artesiano) Projeto - Contratação - Execução | 08/11/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de abastecimento de Água (Rede de Água) Projeto - Contratação - Execução | 06/12/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Educação para o saneamento | 28/02/2011 | 30/03/2011 | 30/03/2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Agrovila Km 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Abastecimento de Água (Popo semi-artesiano) Projeto - Contratação - Execução | 22/11/2010 | 30/06/2011 | 31.07.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de abastecimento de Água (Rede de Água) Projeto - Contratação - Execução | 01/02/2011 | 30/06/2011 | 31.07.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Educação Anapu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Início | Fim - Relatório 15/02/2011 | Fim - Relatório 14/03/2011 | Justificativas | 2011 | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| Ampliação Escola Maria das Dores 20 salas. Projeto - Contratação - Execução | 25/11/2010 | 30/06/2011 | 31/12/2011 | de dezembro/2011. As primeiras 10 salas de aula tiveram seu término ajustado para 31/12/11 estabelecendo a conclusão de todas as salas para dezembro/2011. As primeiras 5 salas já estão em funcionamento (início das aulas ocorreu em 14/03/11). | | | | | | | |
| Popo semi-artesiano (escola) Projeto - Contratação - Execução | 19/11/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Saúde Anapu | | | | | | | | | | | |
| Reforma Hospital Dr. Fernando Dourado - Projeto - Contratação - Execução | 15/03/2011 | 30/06/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Acordo para Cooperação Institucional, Técnica e Análise, assinado em 21/09/10, prevê a conclusão das obras em 30/06/10. Contudo, devido a necessidade de prazo para a conclusão do objeto, o prazo estimado para a obra será o necessário para a conclusão do objeto. A data inicialmente prevista no relatório emitido em 15/02/11 foi estimada em 30/06/11. Estão sendo efetuados levantamentos "in loco" para determinação e definição da totalidade do escopo dos serviços, de maneira que a previsão atual de conclusão das obras está mantida em dezembro/2011. | | | | | | | |
| Educação Belo Monte do Pontal | | | | | | | | | | | |
| Escola José Andrade Silva (ampliação) - Projeto - Contratação - Execução | 17/11/2010 | 30/04/2011 | 30/06/2011 | O projeto inicial previa a ampliação de somente uma sala de aula. Termo de Acordo em 28/10/10 previa a inclusão de 1 refeitório, seu término foi ajustado para 30/06/11. | | | | | | | |
| Saúde Belo Monte do Pontal | | | | | | | | | | | |
| Posto de saúde UBS - Projeto - Contratação - Execução | 17/11/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Saneamento Belo Monte do Pontal | | | | | | | | | | | |
| Sistema de Abastecimento de Água (Popo semi-artesiano) Projeto - Contratação - Execução | 08/11/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Sistema de abastecimento de Água (Rede de Água) Projeto - Contratação - Execução | 06/12/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Educação para o saneamento | 28/02/2011 | 28/03/2011 | 28/03/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Monitoramento da População Migrante | | | | | | | | | | | |
| Balcão de Atendimento 1 - Altamira | 12/11/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Balcão de Atendimento - Vitória do Xingu | 12/11/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Balcão de Atendimento - Movel | 17/12/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Ações Antecipatórias - LI Geral | | | | | | | | | | | |
| Educação Vitória do Xingu - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral / construção escola / creche - Escola Dulcinéia (sede do município) - | 01/02/2011 | 30/06/2011 | 31/12/2011 | O ofício nº 081/GAB de 18/11/10 prevê a conclusão de 6 salas para junho/2011 e 6 salas para dezembro/2011. As primeiras 6 salas tiveram seu término programado para dezembro/2011, conforme relatório de 14/03/11, estabelecendo a conclusão de todas as salas para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma e cobertura de quadra poliesportiva - Escola Evangelho (Belo Monte) | 20/03/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Início | Fim - Relatório | | Justificativas | 2011 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 15/02/2011 | 14/03/2011 | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | | | | | |
| Reforma geral - Escola Leonardo Da Vinci | 31/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral e construção de 1 sala - Escola N. Sra. das Graças (travessão 27) | 25/03/2011 | 30/12/2011 | 30/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de escola com 2 salas de aula - Escola Vila Rica (travessão 27) | 01/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral e construção de 1 cômodo - Escola Gerosina (travessão 27) | 25/03/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de 2 salas - Escola Duque de Caxas (travessão CNEC) | 01/03/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de 2 salas - Escola Piratininga (travessão CNEC) | 30/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de 2 salas - Escola NSA III (travessão CNEC) | 01/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral e construção de 1 cômodo - Escola NSA I (Paquigamba km 60) | 30/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral e construção de 1 cômodo - Escola Boa Esperança II (travessão CNEC) | 25/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral e construção de 1 cômodo - Escola Santa Helena (Via Santo Antônio) | 01/03/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral - Escola São Raimundo Nonato (Cobra-choca) | 25/03/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de 1 sala e 1 cômodo - Escola Bom Jardim I (Cobra-choca) | 01/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma e construção de 1 sala e 1 cômodo - Escola Benedito da Silva Raposo (4 Bocas) | 25/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Reforma geral - Escola Napoleão Bonaparte (Km 32 Norte) | 25/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Saúde Vitória do Xingu - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reforma e ampliação das instalações da Secretaria Municipal de Saúde | 30/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de Prédio UBS Tipo I (Centro da Sede Municipal) | 30/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de Prédio UBS Tipo I (Banana) | 01/02/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de Prédio UBS Tipo I (travessão 27 balçada) | 25/03/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Construção de Prédio UBS Tipo I (Cobra-choca) | 01/02/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Vitória do Xingu - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projeto Básico da ETA | 30/11/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |
| Projeto Básico da Rede de Abastecimento de Água | 30/11/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | | | | |

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Início | Fim - Relatório | Fim - Relatório | Justificativas | 2011 | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| Construção de UBS Porte I (Beira Vista) | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 14/03/2011 | Item justificativa anterior, acrescentando-se que, por parte da Prefeitura, falta a definição de alguns detalhes. | | | | | | | |
| Construção de UBS Porte I (Santa Ana) | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Item justificativa anterior, acrescentando-se que, por parte da Prefeitura, falta a definição de alguns detalhes. | | | | | | | |
| Construção de UBS Porte I (Brasília) | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Item justificativa anterior, acrescentando-se que, por parte da Prefeitura, falta a definição de alguns detalhes. | | | | | | | |
| Reforma e ampliação do Hospital Municipal São Rafael | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Item justificativa anterior, acrescentando-se que está em fase de levantamento dos dados a serem realizados e o planejamento para iniciar a reforma. | | | | | | | |
| Educação Altamira - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF Artur Teixeira | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. As atividades de levantamento de campo para a definição do que é necessário reformar já encontra-se em fase de aprovação pela Prefeitura e, somente após a aprovação, será possível o início das atividades de campo. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF Geraldo Emílio Bezerra | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. As atividades de levantamento de campo para a definição do que é necessário reformar já encontra-se em fase de aprovação pela Prefeitura e, somente após a aprovação, será possível o início das atividades de campo. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF João Rodrigues | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. A Prefeitura está propondo um reformulação das atividades previstas. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF José Edison Burlamaqui de Miranda | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. As atividades de levantamento de campo para a definição do que é necessário reformar já encontra-se em fase de aprovação pela Prefeitura e, somente após a aprovação, será possível o início das atividades de campo. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF Nossa Senhora Aparecida | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. As atividades de levantamento de campo para a definição do que é necessário reformar já encontra-se em fase de aprovação pela Prefeitura e, somente após a aprovação, será possível o início das atividades de campo. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF Professora Riza Maria de Moura Aciolo | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. As atividades de levantamento de campo para a definição do que é necessário reformar já encontra-se em fase de aprovação pela Prefeitura e, somente após a aprovação, será possível o início das atividades de campo. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Reforma com ampliação da EMEF Saint Claire | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | O Termo de Cooperação Institucional, Técnica e Financeira e Manifestação de Anuência, assinado em 19/11/10, prevê a conclusão dessa atividade em Julho/2011. As atividades de levantamento de campo para a definição do que é necessário reformar já encontra-se em fase de aprovação pela Prefeitura e, somente após a aprovação, será possível o início das atividades de campo. Portanto, o término das atividades foi postergado para dezembro/2011. | | | | | | | |
| Construção de 2 escolas na zona rural | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Construção de 1 escola EMEI no bairro Bela Vista | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Aguardando a indicação do terreno, pela Prefeitura, para início das obras. Estima-se para conclusão a data de 31/12/11. | | | | | | | |
| Construção de 1 escola EMEF no bairro Bela Vista | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Aguardando a indicação do terreno, pela Prefeitura, para início das obras. | | | | | | | |

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Início | Fim - Relatório 15/02/2011 | Fim - Relatório 14/03/2011 | Justificativas | 2011 | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| Construção de 1 escola EMEI no bairro Nova Atiamira | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Esma-se para conclusão a data de 31/12/11. Aguardando a indicação do terreno, pela Prefeitura, para início das obras. Esma-se para conclusão a data de 31/12/11. | | | | | | | |
| Construção de 1 escola EMEI no bairro Multaó | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Aguardando a indicação do terreno, pela Prefeitura, para início das obras. Esma-se para conclusão a data de 31/12/11. | | | | | | | |
| Construção de 1 escola EMEI no bairro Jardim França | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | No início do mês de março/2011 houve a aprovação do projeto pela Prefeitura. Obra já contratada e estima-se sua conclusão em 31/12/11. A Prefeitura irá se posicionar quanto esta data. | | | | | | | |
| Construção de 1 escola EMEF no bairro Jardim França | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | No início do mês de março/2011 houve a aprovação do projeto pela Prefeitura. Obra encontra-se em fase de contratação e estima-se sua conclusão em 31/12/11. A Prefeitura irá se posicionar quanto esta data. | | | | | | | |
| Construção de 1 escola EMEF na Ilha do Espanhol | 28/02/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Aguardando a indicação do terreno, pela Prefeitura, para início das obras. Esma-se para conclusão a data de 31/12/11. | | | | | | | |
| Saneamento Atiamira - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Projeto/Construção do Alvaro Sanitário | 01/04/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | | | | | | | | |
| Projeto Básico da Rede de Abastecimento de Águas | 30/11/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Projeto executivo e implantação da Rede de Abastecimento de Água | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 31/12/2011 | Projeto básico concluído. Obra já contratada aguardando definição da Prefeitura para aprovação do planejamento das obras, uma vez que haverá interferência com a população. A data de conclusão está estimada em 31/12/11. A Prefeitura irá se posicionar quanto a esta data. | | | | | | | |
| Projeto Básico da Rede de Coleta de Esgoto | 30/11/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Projeto executivo e implantação da Rede de Coleta de Esgoto | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 31/12/2011 | Projeto básico concluído. Obra já contratada aguardando definição da Prefeitura para aprovação do planejamento das obras, uma vez que haverá interferência com a população. A data de conclusão está estimada em 31/12/11. A Prefeitura irá se posicionar quanto a esta data. | | | | | | | |
| Saúde Anapu - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Construção de prédio em alvenaria com 224,50 m ² padrão UBS tipo I - Pau Furado (Vila Nova Canaã) | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Construção de prédio em alvenaria com 224,50 m ² padrão UBS tipo I - Vila Acrolina | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Construção de prédio em alvenaria com 224,50 m ² padrão UBS tipo I - Centro | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Construção de prédio em alvenaria com 224,50 m ² padrão UBS tipo I - Alto Bonito | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Construção de prédio em alvenaria com 224,50 m ² padrão UBS tipo I - Novo Programa | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | Aguardando definição da Prefeitura quanto a localização e aprovação de projeto. Prazo estimado em 31/12/11 | | | | | | | |
| Construção de Posto de Saúde na localidade de Vrola, Jaibá | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Construção de Posto de Saúde na localidade de Surubim/Novo horizonte | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Prédio em alvenaria com 170 m ² de área construída com recepção, triagem, sala de consultas, sala de enfermagem e dispensário de medicamentos e equipamentos de ambulatório médico - Sede do Município | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Início | Fim - Relatório 15/02/2011 | Fim - Relatório 14/03/2011 | Justificativas | 2011 | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | |
| Construção de Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NUVE - Anapu Sede | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Instalação de um novo hospital na sede do município, para atendimentos especializados em todas as áreas clínicas - R\$ 20.000.000,00 | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Instalação de novas UBS nas Agrovilas (12 UBS) Valor Unitário R\$ 250.000,00 - Valor Total R\$ 3.000.000,00. | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Instalação de novas UBS nos bairros (7 UBS) Valor Unitário R\$ 250.000,00 - Valor Total R\$ 1.750.000,00. | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Construção de Hospital em Belo Monte R\$ 8.000.000,00 | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | Aguardando definição da Prefeitura quanto a localização e aprovação de projeto. Preço estimado em 30/07/12 | | | | | | | |
| Reforma das Unidades básicas de Saúde existentes e troca de seus equipamentos (5 UBS) Valor Unitário R\$200.000,00 - Valor Total R\$1.000.000,00 | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Construção/implantação de um Centro de Apoio Psicossocial (CAPS Infantil, CAPS Adulto, Psicologia e outros) R\$ 1.000.000,00. | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Ampliação/equipagem do Centro de Vigilância Sanitária R\$ 100.000,00 | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Centro Especializado Psiquiátrico para alojamento de pessoas com distúrbio mentais R\$ 1.000.000,00 | 01/04/2011 | | 30/07/2012 | | | | | | | | |
| Educação Anapu - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Construção de escola com 4 salas de Ensino Infantil e 6 salas de Ensino Fundamental - Bairro São Luiz | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Construção e ampliação - reforma de 4 salas de aula e construção de mais 4 - Bairro Alto Bonito | 28/02/2011 | | 31/12/2011 | Aguardando definição da Prefeitura quanto a localização e aprovação de projeto. Preço estimado em 31/12/11. | | | | | | | |
| Construção de mais 4 salas de aulas, contígua a escola Dr.ACY de Jesus Barros Pereira, próxima a Belo Monte do Pontal ou micro-ônibus de médio porte para transporte entre Vila Isabel e Belo Monte do Pontal. | 01/04/2011 | | 31/12/2011 | | | | | | | | |
| Saneamento Anapu - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Reservatório tipo tupa metálico, coluna seca, volume instantâneo a reservar 20 mil litros. Garantir pressão entre 8 a 10 metros de coluna de água. | 01/04/2011 | | 31/12/2011 | Serviço já realizado. Faltava somente a interligação do sistema de ligação/desliga automático. | | | | | | | |
| Rede de Energia para atender o poço artesiano | 01/04/2011 | | 31/12/2011 | Sistema de energização em funcionamento. Falta o sistema de ligação/desliga automático. | | | | | | | |
| Educação Belo Monte do Pontal - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Construção de 2 salas de aula e refeitório - Escola José de Andrade Silva - Bairro São Luiz - Projeto (BELO MONTE DO PONTAL) ESCOLA JOSÉ ANDRADE SILVA (AMPLIAÇÃO) | 14/12/2010 | 30/04/2011 | 30/06/2011 | O projeto inicial previa a ampliação de somente uma sala de aula (Termo de Anuência assinado em 28/10/10), com término previsto para 30/04/11. Com a ampliação para 2 salas de aula e a inclusão de 1 refeitório, seu término foi ajustado para 30/06/11. | | | | | | | |
| Educação Senador José Porfírio - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | |
| Construção e ampliação - Escola Luiz Rebelo (Resaca) | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Construção e ampliação - Escola Francisco Merêncio (Bambu) | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Construção de escola com 4 salas de aula para o Ensino Infantil | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |
| Construção de escola com 6 salas de aula para o Ensino Fundamental | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | |

UHE BELO MONTE - AÇÕES ANTECIPATÓRIAS - ACORDOS ESTABELECIDOS

| Ações | Início | Fim - Relatório 15/02/2011 | Fim - Relatório 14/03/2011 | Justificativas | 2011 | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | | |
| Saúde Senador José Porfírio - Projeto, Contratação e Execução | | | | | | | | | | | | |
| Construção de UBS Porte I na localidade Vila Bom Pastor | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |
| Construção de UBS Porte I na localidade Itatá | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |
| Construção de UBS Porte I na localidade Bambu | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |
| Adequação de UBS - Vila Nova | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |
| Adequação de UBS - Alto Brasil | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |
| Ampliação de UBS Porte II (Ressaca) | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |
| Construção de NUVE (Sede) | 05/04/2011 | 30/07/2011 | 30/07/2011 | Sem alteração de data | | | | | | | | |

ANEXO II

Situação das Obras




Relatório Atual

Obras Antecipatórias

UHE Belo Monte

Atualização até 18 Março 2011

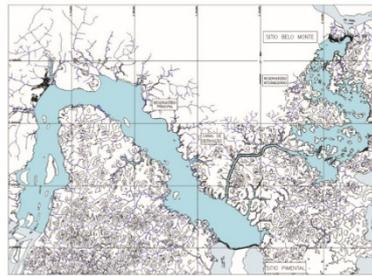

Introdução

O objetivo desta apresentação é propiciar uma visão resumida dos Programas Socioambientais e Obras Civas realizadas entre a Norte Energia S.A. e as prefeituras de Altamira, Anapú, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, no âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte.


O trabalho apresenta um resumo do objeto de cada termo de cooperação e seu status atual.






- 95 Obras de melhorias
- 15 Termos de Cooperação assinados
- 9 Termo de Anuência
- 5 Municípios

Obras por Município

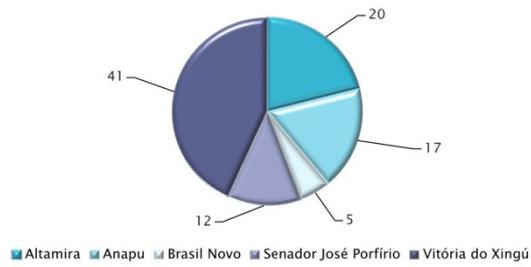

Mapa das obras e ações

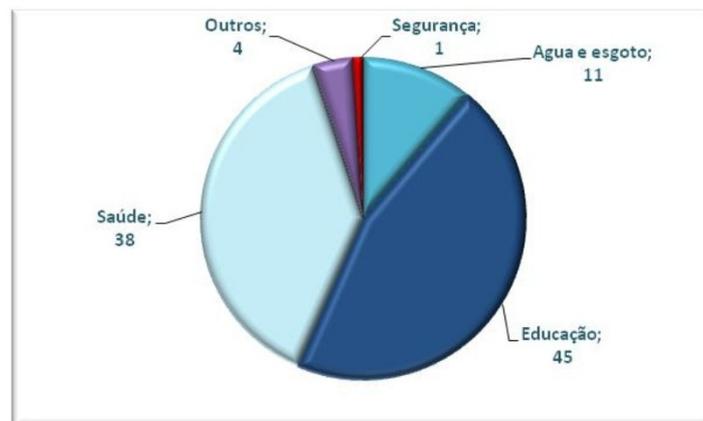

Nota: Levantamento efetuado com os seguintes Municípios (Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Brasil Novo e Senador José Porfírio)





ANAPU

- 3 Termos de Cooperação assinados - Licença Prévia 342/2010
- 3 Termos de Anuência
- 17 Obras



Anapu – Educação

1.1 - Recomposição / adequação dos equipamentos de educação – 21.09.2010

- **Construção / ampliação – Escola José de Andrade Silva – Belo Monte do Pontal;**
- Início da obra: 14.12.2010

Status Atual:

Em construção pela Secol – Término previsto 30.06.2011, apesar de aumentar mais 1 sala de aula, 1 refeitório e muro do terreno a conclusão será antecipada para 30.04.2011



Situação em : 22.02.2011



Situação em : 14.03.2011





Anapu - Saúde



1.2 - Recomposição / adequação dos equipamentos de saúde – 21.09.2010

▪ Construção de Unidade Básica de Saúde – UBS

- Pau Furado;
- Vila Acrolina;
- Centro;
- Nova Panorama;
- Alto Bonito.

Status Atual:

- Projeto em elaboração e em fase de contratação das empresas – Término da Construção 31.12.2011



Anapu - Saúde



1.2 – Continuidade

▪ Construção de Posto de Saúde:

- Vila Jatobá;
- Surubim/ Novo Horizonte

▪ Construção de Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NUVE:

- Anapu;

Status Atual:

- Projeto iniciado, em elaboração – Término da Construção 31.12.2011





Anapu - Saúde



1.2 – Continuidade



▪ Reforma e ampliação do Hospital Doutor Fernando Dourado

- Obra não iniciada

Status Atual:

- Em fase de contratação da obra – Término da Construção prevista 31.12.2011



Anapu - Saúde



1.2 – Continuidade

▪ Construção de uma UBS em Belo Monte do Pontal.

- Início da obra: 17.11.2010

Status Atual:

- Em execução pela Secol– Término da Construção 30.06.2011





Anapu – Água e Esgoto

1.3 – Água e Esgoto

▪ Sistema de Abastecimento de Água Belo Monte do Pontal

Status Atual:

- Em construção pela Firma e Franco - Proeng

Término da Construção 30.06.2011

▪ Perfuração do Poço Semi-Artesiano Belo Monte do Pontal

- Início da Obra: 08.11.2010 – Obra concluída.

Status Atual:

- Em construção P. Brasil – Término da Construção 30.07.2011

▪ Rede de Energia para o Poço Semi-Artesiano Belo Monte do Pontal

- Início da Obra: 02.02.2011

Status Atual: Em construção pela Icotel



VITÓRIA DO XINGU

- 4 Termos de Cooperação assinado - Licença Prévia 342/2010
- 6 termos de anuência
- 41 obras





Vitória do Xingu – Água e Esgoto



2.1 - Água e esgoto – 16.09.2010

▪ Sistema de Abastecimento de Água - Belo Monte

- Início da obra: 15.11.2010

Status Atual:

- Obra concluída pela Proeng, em fase de teste
- Previsão de término: 30.06.2011



Rede de água

▪ Sistema de Abastecimento de Esgoto Sanitário – Belo Monte

Status Atual:

- Projeto em fase de elaboração



Rede de elétrica



Vitória do Xingu – Água e Esgoto



2.2 – Aterro Sanitário, Água e esgoto – 16.09.2010

▪ Sistema de Abastecimento de Água - Vitória do Xingu

▪ Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário – Vitória do Xingu

▪ Construção de aterro sanitário em Vitória do Xingu

Status Atual:

- Projeto básico em elaboração
- Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água e Esgoto – Previsão de término da Construção: 31.10.2013
- Aterro sanitário, projeto em Elaboração – Previsão de término da Construção: 31.12.2011





Vitória do Xingu – Água e Esgoto



2.2 - Água e esgoto – 16.09.2010



Rede de água
Agrovila km 18

- **Sistema de Abastecimento de Água - Km 18**
- Início da obra: 01.02.2011
- **Perfuração de Poço Semi-Artesiano – Km 18**
- Início da obra: 20.11.2010
- **Sistema de Abastecimento de Esgoto – Km 18**

Status Atual:

- Em execução a rede de água pela Secol – previsão de término 31.07.2011
- Poço já executado pela P. Brasil, vazão obtida 11,6m³/h
- Elaboração do Projeto – Previsão de término da Construção: 31.07.2011



Poço Semi- artesiano
Agrovila km 18



Vitória do Xingu - Saúde



2.3 - Recomposição / adequação dos equipamentos de saúde– 23.09.2010

▪ Construção de UBS em Bananal

Status Atual

Projetos entregues a prefeitura em 01.02.2011 para aprovação da SEPLAN –
Previsão de término da Construção: 31.12.2011

▪ Construção de hospital (70 leitos) – sede municipal;

▪ Construção de UBS:

- Km 20, próximo a PA415;
- Km 27, próximo a transamazônica;
- Santo Antônio

Status Atual - Projeto em elaboração – Previsão de término: 31.12.2011





Vitória do Xingu - Saúde



2.3 – Unidade Básica de Saúde

▪ Construção de UBS – Belo Monte

▪ Início da Obra: 09.01.2011

Status Atual:

▪ Obra em execução pela Secol

▪ Previsão de término: 31.12.2011



Posto UBS Tipo 1 – Belo Monte



Posto UBS Tipo 1 – Belo Monte



Vitória do Xingu - Saúde



2.3 - Continuidade

▪ Reforma e ampliação de Núcleo de Vigilância em Saúde

▪ Sede Municipal (zona urbana)

▪ Construção do CAPS – Centro de Apoio Psico – social

▪ Sede Municipal (zona urbana)

▪ Construção de C.E.O – Centro de Especialidade Odontológica

▪ Sede Municipal (zona urbana)

▪ Construção de Posto de Saúde P.S. - Arroz Crú

Status Atual

▪ Projeto em elaboração – Término da Construção 31.12.2011



Vitória do Xingu - Saúde



2.3 - Continuidade

- **Construção de Posto de Saúde em Cobra Choca**
- Obra iniciada: 28.02.2011

Status Atual

- Construção pela Tropical Engenharia, de um Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS – CTA
- Construção de uma Unidade de Saúde Móvel Fluvial – USM - atendendo a Zona Ribeirinha.
- Previsão de término da Construção 31.12.2011



UBS – Cobra Choca



UBS – Cobra Choca



Vitória do Xingu – Saúde



2.3 - Continuidade

- **Reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal**

Status Atual

- Projeto em elaboração previsão de término de 10 leitos: 31.07.2011



- Término de 10 leitos: 31.12.2011

- **Aquisição de um veículo para atendimento odontológico**
- **Aquisição de 2 veículos**
- **Reforma e ampliação da estrutura física da Secretaria de Saúde**

Status Atual

- Aguardando projeto da prefeitura – Término da Construção 31.07.2011





Vitória do Xingu - Educação



2.4 - Recomposição / adequação dos equipamentos de Educação - 23.09.2010



Situação em 22.02.2011

- Construção de escola em Vitória do Xingu (4 salas) e poço semi artesiano
- Início da obra: 14.01.2011

Status Atual

- obra em construção pela C. Faz – Término previsto 31.08.2011.
- Poço já concluído pela P. Brasil.



Situação em 10.03.2011



Situação em 15.03.2011



Vitória do Xingu - Educação



2.4 - Recomposição / adequação dos equipamentos de Educação - 23.09.2010

- **Construção de escola em Belo Monte (2 salas)**

- Obra Iniciada: 07.01.2011

Status Atual

- Em construção pela W Norte – término previsto 31.07.2011



Situação em 22.02.2011



Situação em 15.03.2011



Situação em 15.03.2011



Vitória do Xingu - Educação



2.4 - Continuidade

- **Reforma/ ampliação de 1 sala na Escola**

Nossa Senhora da Graça – Travessão 27

Status Atual

- Projeto entregues à Prefeitura em 25.02.2011
- Término da Construção 31.07.2011



- **Reforma/ ampliação da Escola Villa Santo Antonio**

▪ Início da obra: 18.02.2011

Status Atual

- Obras em execução pela W Norte
- Término previsto para 31.07.2011 - Poço já perfurado



Vitória do Xingu - Educação



2.4 - Continuidade

- **Reforma/ ampliação da escola Villa Rica – Travessão 27**

Status Atual

- Projeto entregues para prefeitura, para aprovação, em 10.02.2011, contrato em elaboração com a JC Silva
- Previsão de Término: 31.07.2011

- **Reforma/ ampliação da escola Planaltina – CNEC**

- **Reforma/ ampliação da escola Nossa Senhora Aparecida III –**

Travessão CNEC

Status Atual

Empresa Tontini & Tontini contratada – previsão de término 31.12.2011



Escola Nossa Senhora Aparecida III – Situação em: 15.03.2011





Vitória do Xingu - Educação



2.4 - Continuidade

- Reforma/ ampliação da escola Raimundo Nonato – Cobra Choca
- Reforma/ ampliação da escola Duque de Caxias – CNEC
- Início da obra: 28.02.2011

Status Atual

- Em execução pela empresa Tropical Engenharia
- Previsão de término 31.07.2011



- Reforma/ ampliação da escola Bom Jardim I – Cobra Choca

▪ Início da Obra: 28.02.2011

Status Atual

- Em execução pela Tropical Engenharia
- Previsão de término 31.12.2011



Vitória do Xingu - Educação



2.4 – Continuidade

- Reforma/ ampliação da escola Agrovila Leonardo da Vinci
- Reforma/ ampliação da escola Boa Esperança II – CNEC

Status Atual

Projeto em elaboração – Término da Construção: 31.12.2011

- Reforma/ ampliação da escola e Creche Dulcinéia – Vitória do Xingu

Status Atual

Projeto entregue a Prefeitura em 21.02.2011

Término da Construção: 31.12.2011

- Aquisição de Kombi

Status Atual

Em aquisição



Escola Leonardo da Vinci



Escola Boa Esperança II



Escola Dulcinéia



Creche Dulcinéia





Vitória do Xingu - Educação

2.4 – Continuidade

- Reforma/ ampliação da escola Santa Helena

▪Obra Iniciada: 18.02.2011

Status Atual

Obra em execução pela W Norte – Previsão de Término: 31.07.2011

- Reforma/ ampliação da escola e Creche Dulcinéia – Vitória do

Xingu

Status Atual

▪Projeto entregue a Prefeitura em 21.02.2011

▪Término da Construção: 31.12.2011

- Aquisição de Kombi

Status Atual

▪Em aquisição



Creche Santa Helena



Vitória do Xingu



2.5 – Meio Ambiente

- Base de Resgate de Fauna e Flora – Blocos 01 e 02 - Acampamento Norte

Energia

▪ Obra Iniciada: 09.03.2011

Status Atual

▪Obra em execução pela W Norte – Previsão de Término:09.09.2011



Base de Resgate – Bloco 2





ALTAMIRA

- 5 Termos de Cooperação assinados - Licença Prévia 342/2010
- 21 obras



Altamira – Social

3.2 - Balcão de Atendimento - 11.11.2010

- Espaço Físico e Programa de ações relativas à mão de obra e apoio ao migrante;
- Implantação e operacionalização do “Balcão de Atendimento”

Status Atual:

- Implantado em dezembro de 2010. Espaço em pleno funcionamento – **10.114 cadastros**, sendo 1,15% imigrantes.





Altamira - Educação



3.3 - Continuidade

- **Construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) e uma escola de Ensino fundamental (4 salas) – “Bela Vista/Parque Ipê”;**

Status Atual:

- Aguardando definição pela prefeitura do terreno a ser implantada.

- **Construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) – Nova Altamira**

Status Atual:

- Projeto aprovado em 11-03-2011 pela Prefeitura. Terreno já indicado aguardando liberação pela Empresa Construtora.



Altamira - Educação



3.3 - Continuidade

- **Construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) – Multirão**

Status Atual:

- Aguardando definição pela prefeitura do terreno a ser implantada.

- **Construção de uma Escola Municipal de Ensino Infantil (6 salas) e uma escola de Ensino fundamental (4 salas) – “Jardim França”;**

Status Atual:

- Projetos aprovados em fase de construção pela empresa Alvino e Rosa – W Norte.



Local para a construção da Escola Municipal Jardim França





Altamira - Educação



3.3 - Continuidade

- **Construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (1 sala) – Ribeirinha Ilha do Espanhol**

Status Atual:

- Aguardando definição pela prefeitura do terreno a ser implantada.



Altamira - Saúde



3.4 - Adequação das Estruturas de Equipamentos de Saúde- 19.11.2010

- Aquisição de terreno e construção de uma UBS, porte I, localizada no Bairro Nova Altamira;



UBS – Nova Altamira

Status Atual:

- Aguardando disponibilização do terreno pela empresa construtora do projeto “minha casa, minha vida”, conforme orientação do Secretário de Planejamento do Município





Altamira - Saúde

3.4 - Continuidade

- **Aquisição de terreno e construção de uma UBS, porte I, localizada no Bairro Bela Vista.**

Status Atual:

- Projetos aprovados em 11.03.2011 – em fase de contratação
- Término da Construção 31.12.2011



Terreno UBS – Bela Vista

- **Aquisição de terreno e construção de uma UBS, porte I, localizada no Bairro Santa Ana.**

Status Atual:

- Projeto aprovado em 11-03-2011 pela Prefeitura. Terreno já indicado aguardando liberação pela Empresa Construtora
- Término da Construção 31.12.2011



Terreno UBS – Santa Ana



Altamira – Saúde



3.4 - Continuidade

- **Aquisição de terreno e construção de uma UBS, porte I, localizada no Bairro Brasília**

- Em fase de aprovação do Projeto - Término da Construção 31.12.2011

- **Reforma e Ampliação do Hospital São Rafael HSMR.**

Status Atual:

- Aguardando elaboração do Projeto
- Término da Construção 31.12.2011



3.5 - Adequação das Estruturas de Equipamentos de Segurança - 19.11.2010

- Aquisição de 4 veículos – caminhonete; 2 caminhões guincho; 10 motocicletas; 5000 placas de sinalização vertical, horizontal; 30 Semáforos; 300 cones de borracha; 50 conjuntos de uniforme completos; 60 rádios HT450; 10 equipamentos de informática, 1 repetidora de comunicação; 1 microônibus; 1 veículo caminhonete azul; 2 veículo leves; 10 motocicletas azuis; 50 conjuntos de armamento não letal M26 e 3 conjuntos de X26.



BRASIL NOVO

- 1 Termo de Cooperação assinado - Licença Prévia 342/2010 :
- 5 Obras





Brasil Novo - Educação



4.1 - Recomposição / adequação dos equipamentos de educação –

23.09.2010

- Construção e ampliação, Escola Brasil Novo (6 salas) - Centro;
- Construção e ampliação, Escola Irmã Terezinha(3 salas) – Centro;
- Construção e ampliação, Escola Paraíso (3 salas) – Cidade Nova;
- Construção, escola de educação infantil – Cidade Nova;
- Construção, escola de educação fundamental – Cidade Alta;

Status Atual:

- Em fase de estudo de engenharia e elaboração do projeto executivo – Término da Construção 31.12.2011



SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

- 2 Termos de Cooperação assinado - Licença Prévia 342/2010
- 12 Obras





Senador José Porfírio - Educação



5.1 - Recomposição / adequação dos equipamentos de educação –

22.09.2010

- Construção e ampliação, Distrito de Ressaca – Escola Luiz Rebelo;
- Construção e ampliação, Bambu – Escola Francisco Merêncio;
- Construção/ escolas novas, Bairro novo:
 - Ensino Infantil
 - Ensino Fundamental (4 salas)
 - Ensino Fundamental (6 salas)

Status Atual:

- Em fase de estudo de engenharia e elaboração do projeto - Término da Construção 31.07.2012



Senador José Porfírio - Saúde



5.2 - Recomposição / adequação dos equipamentos de saúde –

22.09.2010

- Construção de Unidade Básica de Saúde – UBS porte I
 - Vila Bom Pastor;
 - Itatá;
 - Bambú
- Adequação de Unidade Básica de Saúde – UBS porte I
 - Vila Nova
 - Alto Brasil

Status Atual:

- Em fase de estudo de engenharia e elaboração do projeto executivo – Término da Construção 31.07.2012





Senador José Porfírio - Saúde



5.2 - Continuidade

- Ampliação de Unidade Básica de Saúde – UBS porte II
 - Ilha da Ressaca
- Construção de Núcleo de Vigilância Epidemiológica – NUVE
 - Senador José Porfírio

Status Atual:

- Em fase de estudo de engenharia e elaboração do projeto executivo – Término da Construção 31.07.2012



Anapu - Educação



1.1 – Continuidade

- Construção / ampliação – Escola Maria das Dores;
- Início da obra: 25.11.2010

Status Atual:

Em construção pela Alvino e Rosa - W Norte – Término de 10 salas previsto 30.06.2011



- Construção / escolas novas – Bairro São Luis;

Projeto em elaboração – Término da Construção 31.12.2011





Vitória do Xingu - Saúde



2.3 – Continuidade

▪ Construção de UBS na Sede

Status Atual

▪ Projetos já elaborados e entregues a Prefeitura em 25.02.2011 – Previsão de término: 31.012.2011.

▪ Construção de UBS- Cobra Choca - ao lado da escola Bom Jardim I

Status Atual

▪ Projetos já elaborados e entregues a Prefeitura em 25.02.2011 – Em fase de construção pela Tropical Engenharia - Previsão de término: 31.012.2011.



UBS – Cobra Choca



UBS – Cobra Choca



Vitória do Xingu - Educação



2.4 - Continuidade

▪ Reforma/ ampliação da escola Gerosina – Travessão 27

Status Atual

Projeto em elaboração – Término da Construção: 31.07.2011

▪ Reforma/ ampliação da escola Benedito Silva Raposo – Quatro Bocas

Status Atual

Projeto entregue a Prefeitura em 25.02.2011, contrato em elaboração – Término da Construção: 31.07.2011

▪ Reforma/ ampliação da escola Nossa Senhora da Aparecida I – CNEC

Status Atual

Projeto entregue a Prefeitura em 15.03.2011 – Término da Construção 31.12.2011

▪ Reforma/ ampliação da escola Napoleão Bonaparte – Km32

Status Atual

Projeto em elaboração – Término da Construção 31.12.2011





Altamira – Água e Esgoto



3.1 - Água e esgoto – 16.09.2010

- Sistema de Abastecimento de Água
- Sistema de Abastecimento de Esgoto Sanitário
- Construção do Aterro Sanitário de Altamira

Status Atual:

- Em elaboração Projeto Básico de Sistema de Abastecimento e Aterro.



Altamira - Educação



3.3 - Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação - 19.11.2010



- Reforma com ampliação, da EMEF Arthur Teixeira
- Reforma com ampliação, da EMEF Geraldo Emídio



Status Atual:

- Levantamento de campo já realizado aguardando aprovação da Prefeitura para início do Projeto Executivo.
Término da Construção 31.10.2011





Altamira - Educação



3.3 - Adequação da Estrutura de Equipamentos de Educação -

19.11.2010

- Reforma com ampliação, da EMEF Nossa Senhora Aparecida
- Reforma com ampliação, da EMEF Prof. Rilza Maria de Moura Acácio
- Reforma com ampliação, da EMEF Saint Clair Passarinho
- Reforma com ampliação, da EMEF João Rodrigues
- Reforma com ampliação, da EMEF José Edson Burlamaqui de Miranda



Status Atual:

- Levantamento de campo já realizado aguardando aprovação da Prefeitura para início do Projeto Executivo.

Término da Construção 31.12.2011



Altamira - Segurança



3.5 - Continuidade

- Aquisição de 1 conjunto data kit M26 e um Kit X26; 53 conjuntos de porta cartuchos; 132 cartuchos Taser 10,6metros e 400 cartuchos Taser 6,4metros; fardamento completo; 5 equipamentos de informática; 1 data show; 1 tela de data show; recursos para treinamento de 62 guardas municipais; 1 caixa amplificadora; 2 microfones sem fio e 2 pedestais para microfones;

Status Atual

- Todos equipamentos já foram adquiridos e estão em fase de entrega para a prefeitura de Altamira.
- Prazo final de entrega – 30.03.2011 – **Aquisição concluída.**





Anapu - Educação



1.1 - Continuidade

- **Construção / ampliação – Escola Ricardo Júnior, Bairro Alto Bonito;**

Status Atual:

- Projeto executivo em fase de elaboração – Término da Construção 30.03.2011

- **Pleitos Adicionais: Construção de 4 salas ou micro ônibus. Aquisição de 3 micro ônibus com motoristas.**

Status Atual:

- Aguardando definição pela Prefeitura.



Vitória do Xingu – Água e Esgoto



2.1. - Água e esgoto - Continuidade – 16.09.2010

- **Perfuração de Poço Semi-Artesiano – Belo Monte**

- Início da Obra: 08.11.2010

Status Atual:

- Obra em execução pela P. Brasil
- Previsão de término: 30.06.2011

- **Construção de Rede de Energia – Belo Monte**

- Início da Obra: 02.02.2011

Status Atual:

- Obra em execução pela Icotel
- Previsão de término: 30.06.2011



1º Poço Semi-artesiano



2º Poço Semi-artesiano



Rede Elétrica para Atender aos Poços e a UBS



 *Norte Energia*

▶ Diretor Presidente

▶ Dr. Carlos Nascimento

▶ Diretor de Construção

▶ Luiz Rufato

▶ Diretor Financeiro

▶ Marcelo Perillo

▶ Diretor Socioambiental

▶ Antônio Coimbra

▶ Diretor de Fornecimento e Montagem

▶ Wellington Ferreira

▶ Diretor de Gestão

▶ Marco Antônio Azevedo

▶ Diretor de Relações Institucionais

▶ João Pimentel

Anexo III

Quadro da Situação das Aquisições de Equipamentos e Materiais

Acordos de Cooperação Técnica - UHE Belo Monte - Situação das Aquisições de equipamentos e materiais

| BRASIL NOVO | | | |
|-------------------------|---|---------------|--|
| Área | Objeto | Prazo | Situação |
| SANEAMENTO | Caminhão para coleta de lixo lixo-urbano - tipo coletor | 15/Abril/2011 | Em Processo de Aquisição |
| | Caminhão de fabricação nacional, cor BRANCA, Cabine avançada basculante confeccionada em chapa de aço, Truck, Tração 6x4, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M3 e todos os itens de segurança exigidos por lei. | 15/Abril/2011 | Em Processo de Aquisição |
| | Caminhão de fabricação nacional, cor BRANCA, equipado com Pipa para distribuição de água capacidade de 10.000 l, e todos os itens de segurança exigidos por lei. | 15/Abril/2011 | Em Processo de Aquisição |
| | Retro escavadeira, tração 4x4 com pneu, de fabricação nacional, zero quilometro, motor diesel, potência 85 hp, 2.200 rpm, direção hidráulica, com 4 (quatro) marchas à frente e 1 (uma) ré, capacidade da caçamba da pá de 1,00 m³, profundidade de escavação da retro de 4,7 m, com todos os equipamentos exigidos pelo código brasileiro de trânsito e demais equipamentos de série. | Julho/2011 | Em Processo de Aquisição |
| | Pá Carregadeira de rodas de fabricação nacional, motor turbo à diesel, 06 (seis) cilindros, potência de 152 hp, 2.500 rpm, direção hidrostática, totalmente hidráulica, pneus 17,5x25, dotada de transmissão com 04 (quatro) marchas à frente e 04 (quatro) a ré, freios multidiscos em banho de óleo, caçamba com dentes com capacidade para 1,91 m³, cabine aberta ROPS, equipamentos de segurança obrigatórios, peso operacional de 10.089 kg, alarme e luz de marcha ré, limpador e lavador de pá-brisa dianteiro, transmissão Power Shift, sistema elétrico de 24 volts, 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio, todos equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito | Julho/2011 | Em Processo de Aquisição |
| VITÓRIA DO XINGU | | | |
| Área | Objeto | Prazo | Situação |
| | 1 Terreno a ser adquirido pela municipalidade, sendo que os custo de aquisição NESA - Centro da Sede Municipal - Escola de 4 salas. | mar/11 | Adquirido pela NESA |
| | 1 Terreno a ser adquirido pela municipalidade, sendo que os custo de aquisição NESA - localidade Belo Monte | mar/11 | Doado pela comunidade, área de ampliação |
| | Armário vitrine de 1 porta | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Armário vitrine de 2 portas | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Balança Pedriática neonatal | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Biombo duplo em ferro laqueado | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Cardio sonar | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Escada de Armação em inox polido 2 degraus com piso de borracha | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa Antropométrica | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa Auxiliar em aço inoxidável | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa para exame clínico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Cadeira de banho para pacientes | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Cadeira de rodas | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Maca para transporte de cilindro de oxigênio | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Comadre | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Jarra de Inox | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Papagaio | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Berço para recém nascido com cuba em acrílico desmontável com rodízio | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Multinebulizador para aerosolterapia com 4 saídas | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Berço para recém nascido aquecido com cuba em acrílico desmontável com rodízio | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa Inox com duas prateleiras | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Balança antropométrica | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Ambu adulto com máscara | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Ambu infantil com máscara | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Ambu Neonatal | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Carro de emergência | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | desfibrilador | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Eletrocardiógrafo | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Foco cirúrgico móvel | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Monitor Cardíaco multiparâmetros | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Suporte para soro | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Incubadora | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Incubadora de transporte | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa para trocar fraudas | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Carro para transporte de medicamentos | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Carro fechado para transporte materiais limpos | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Carro fechado para transporte materiais sujos | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Carro de curativos | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Cama hospitalar | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Braçadeira para aplicar injeções | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Bisturi elétrico ambulatorial | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Autoclave para esterilização em vapor saturado sobre pressão | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Autoclave Odontológica | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Aparelho de RX móvel | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa de cabeceira | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Carro para prontuários | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Mesa de Mayo | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Otoscópio | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Bacia para banho | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Cuba redonda com capacidade de 200 ml | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Colar cervical | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Glicosímetro | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| | Instrumental Cirúrgico para sutura com: 10 pinças dissecação com dente 14 cm - 10 pinças dissecação sem dente 14 cm - 10 pinças tesoura de mayo reta - 10 pinças kelly curva 14 cm - 10 pinças kelly reta 14 cm - pinças porta agulha 14 cm - 10 cabos de bisturi nº 3 - 10 Pinças de assepsia pean 14 cm - 10 caixa de inox com tampa perfurada tamanho médio. | mar/11 | Em Processo de Aquisição |

Acordos de Cooperação Técnica - UHE Belo Monte - Situação das Aquisições de equipamentos e materiais

| | | |
|--|--------|--------------------------|
| Instrumental Cirúrgico para disseção venosa com: 2 farabeuf pequeno - 1 adson com dente - 1 adson sem dente - 2 hartman reta - 2 hertman curva - 1 porta agulha 14 cm delicado com widia - 1 pinça para assepsia - 1 tesoura de metzembraun curva - 1 tesoura de mayo reta - 1 cuba redonda - 1 cabo de bisturi n°3 | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Instrumental Cirúrgico para cateterismo vesical com: 1 Cuba redonda e 1 pinça foerster 25 cm ou cheron | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Instrumental Cirúrgico para acesso central: 2 baby hartman curva - 2 baby hartman reta - 1 cabo de bisturi n° 3 - 1 cuba redonda - 1 disseção com dente - 1 disseção sem dente - 2 Hertman curva 12 cm - 2 hartman reta de 12 cm - 2 farabeuf delicado - 1 pinça foerster reta - 1 porta agulha 14 cm - 1 tesoura mayo reta de 14 cm - 1 tesoura metzembraun 14 cm | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Instrumental Cirúrgico para parto normal com: 4 backaus - 1 cabo de bisturi n° 3 - 1 disseção com dente de 14 cm - 1 disseção sem dente 14 cm - 1 pinça de assepsia - 2 pinças allis 16 cm - 4 pinças kelly curva 14 cm - 2 pinças reta 14 cm - 1 porta agulha 14 cm - 1 tesoura de mayo 14 cm - 1 tesoura de metz curva 15 cm | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Oxímetro de pulso portátil | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| mocho fixo em aço inox, com assento estofado e altura regulável com encosto semicircular | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Ocúlos Plumbífero | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Negatoscópio 2 corpos | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Mesa para refeição | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Caixa perfurada com suporte de instrumento | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Cuba rim | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Maca de transporte | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Aparelho de fototerapia | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| umificador de O2 | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Máscara de venturi | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Agitador kline | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Analizador automático | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Analizador para imunoenensaio com fluorescência | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Balança analítica | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Banho Maria sorológico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Banho Maria Histológico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Bico de Bunsen | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Centrifuga de mesa | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Contador Hematológico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Cronômetro | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Aparelho de deionização | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Espectrofotômetro | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Microscópio Biológico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Refrigerador para conservação de sangue | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Refrigerador laboratorial , vertical de 500 l | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Sistema de eletroforese | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Estufa Bacteriológica | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Evaporador de tubo | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Poltrona para coleta de sangue NT 1608 | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Poltrona para descanso de pacientes | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Cama PPP - Pré Parto, Parto e Pós Parto | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Ultra som | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Amalgador com dosador automático | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Aparelho fotopolimerizável | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Balde esmaltado acionado por pedal | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| compressor odontológico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Equipo odontológico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Negatoscópio de mesa | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Sugador de sangue e secreções | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Madril para intubação endotraqueal tamanho adulto | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Madril para intubação endotraqueal tamanho infantil | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Pinça manguil adulto | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| pinça manguil infantil | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Regulador de pressão fixa com fluxômetro | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Foco Cirúrgico Fixo | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Aparelho de Raios-X Móvel | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Aspirador Portátil | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Bisturi Elétrico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Bomba de Infusão | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Bomba de Infusão de Seringa | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Carro de Anestesia | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Carro de Emergência | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Cardioversor | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Esignomanômetro de Pedestal | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Estetoscópio | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Foco Cirúrgico Móvel | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Microscópio Cirúrgico | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Monitor Multiparâmetros | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Refletor Parabólico de Luz Fria | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Caixa Básica - Instrumentais | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Régua de Gases | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Balde a Chute | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Balde a Pedal | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Carro para Transporte de Material | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Escada com O2 Degraus | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Mesa Cirúrgica | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Mesa Auxiliar para Instrumental | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Mesa de Mayo | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Banqueta giratória tipo mocho, para uso em consultório especializado e/ou centro cirúrgico. | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Mocho em aço inox para fácil esterilização e limpeza | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Negatoscópio - Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas. | mar/11 | Em Processo de Aquisição |

Acordos de Cooperação Técnica - UHE Belo Monte - Situação das Aquisições de equipamentos e materiais

| | | |
|--|--------|--|
| Suporte de Hamper - Dispositivo utilizado para descarte de roupas usadas | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Suporte de Soro de Chão | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Cesto de lixo para utilização em diversos ambientes | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| Relógio de parede analógico ou digital, confeccionado em plástico resistente. | mar/11 | Em Processo de Aquisição |
| dois Veículos tipo caminhonete 4X4 cabine dupla diesel, cor branca com ar condicionado e direção hidráulica. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| Veículo Odontomóvel - tipo furgão, equipado com gabinete odontológico (cadeira , mochocanetas odontológicas de baixa e alta rotação, aparelho de ar comprimido incluindo refletor e cuspeideira; autoclave, gabinete para acondicionamento de instrumental, frigobar para conservação de resina, pia de lavatório e um kit básico de instrumental odontológico) - cor branca | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.05.2011 |
| 6 Televisor de no mínimo 29" LCD com suporte de parede. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 11 Computador de 2GB de memória RAM, HD 320 GB, processador Pentium Corel 2 Duo, gravador de DVD, teclado, mouse, caixas de som, nobreaks e monitor de mínimo 17" | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 10 Impressora multifuncional | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| Aparelho de Fax | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 32 Central de ar tipo splitt 10.000 BTUS | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 23 Mesa em madeira com 3 gavetas para escritório | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 28 Cadeira sem braço com encosto para escritório | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 11 Cadeira com braço com encosto para escritório | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 9 Longarina com 5 lugares | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Poltrona para escritório com 3 lugares | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 11 Mesa para impressora | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 12 Armário de aço tipo estante com 6 prateleiras removíveis que suportem o peso de 50 kg | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 4 Arquivo de aço com 6 gavetas deslizante | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 7 Arquivo para pastas suspensa com 4 gavetões | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Arquivo de aço com 7 gavetas para cartão indice | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 23 Estante de aço com 7 prateleiras desmontável, estrutura metálica possui face única | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 11 Mesa para computador medindo 1,20 x 0,61 m, base reta com rebaixo para teclado, em madeira revestida de fórmica fosca | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 12 Poltrona para descanso de pacientes | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 4 Seladora de embalagem | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 7 Quadro de Avisos | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Quadro branco | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Freezer horizontal | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Máquina de lavar roupa industrial | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Exaustor tipo telescópio | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Fogão Industrial com 4 bocas | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 4 Armário de parede com 8 portas e divisórias em cada | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Calandra horizontal | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Caldeira de vapor | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Secadora de roupas industrial | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Mesa para dobra de roupas e tecidos | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 31 Lixeira plástica 10 l com pedal | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Lixeira plástica 150 l com pedal | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Escada doméstica com 7 degraus com revestimento antiderrapante, possuir ponteiros em polipropileno | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 2 Cama tipo beliche | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 5 Bebedouro elétrico para garrafão de água mineral | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Filtro de água esterilizador | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| 1 Forno de Microondas | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |

Acordos de Cooperação Técnica - UHE Belo Monte - Situação das Aquisições de equipamentos e materiais

| | | | |
|---|---|--|--|
| EDUCAÇÃO | 1 Geladeira de 280 l | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | 2 Refrigerador 230 l | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Mesas e Cadeiras para infante juvenil - Moveis Escolares: Conjunto para ativada infantil com 4 cadeiras Tampo MDF 18 mm (70x70 / 80x80 cm) Metalom 25x25 mm, Altura 55cm | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Pufes - Couro sintético; Enchimento com flocos de isopor; - Zipper invisível. Dimensões 34 cm x 35 cm x 35 cm | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Mesa para escritório de 1,20 x 0,60 com 2 gavetas c/chave Light com bordas em PVC em todo contorno, com estrutura em metalon quadrado, com pintura em epóxi pó texturizada. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Cadeira de Escritório Secretária Giratória com regulagem de altura a gás, Estofada em espuma injetada, com 30 mm de espessura. Medidas do ass/enc: ass- 390x390 enc- 290x360/320 aproximadamente, revestimento em tecido ou couríssimo. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Armário de aço com 02 portas de abrir, 04 prateleiras reguláveis, com chaves. Maçaneta Medidas: 1980 altura x 1200 largura x 400 profundidade. Cor cinza | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Armário em aço chapa 24 indicado p/materiais leves. Caso deseje em outras chapas mais reforçadas chapa (chapa 22 0,78mm) solicite orçamento específico com uma de nossas vendedoras | | |
| | Copiadora tipo Xerox e Scanner - | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Computador de 2GB de memória RAM, HD 320 GB, processador Pentium Corel 2 Duo, gravador de DVD, teclado, mouse, caixas de som, nobreaks e monitor de mínimo 17" | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Mesa para computadores - Rack para micro com teclado fixo. Medidas: 0,75 largura x 0,65 profundidade x 0,74 altura. Disponível nas cores: cinza | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Aparelho de DVD | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Televisor de 32" LCD | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Data Show - Projetor Multimídia MPS15 2500 ANSI Lumens | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Ventiladores de parede oscilatórios | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Ar condicionado 9.000 BTUS | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Carteira escolar - | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Mesas e Cadeiras para infante juvenil - Moveis Escolares: Conjunto para ativada infantil com 4 cadeiras Tampo MDF 18 mm (70x70 / 80x80 cm) Metalom 25x25 mm, Altura 55cm | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | 1 Fogão industrial de 4 bocas | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | 12 Fogões de 2 bocas | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| Armário de madeira para escritório alto, com 02 portas de abrir com chaves. Medidas: 0,80largura x 0,38profundidade x 1,60altura. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 | |
| 1 Veículo Kombi | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 | |
| 35 carteiras de sala de aula - Belo Monte | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 | |
| MEIO AMBIENTE | 1 Barco de 22 pés (7,5 m), casco de alumínio soldado e motor de 60 hp. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.05.2011 |
| | 1 Veículo tipo caminhonete 4X4 cabine dupla diesel, | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.05.2012 |
| | 3 GPS de navegação "Modelo GPSMAP® 60Cx ou compatível" - Dispositivo eficiente e resistente receptor GPS de alta sensibilidade, visor colorido, slot de cartão microSD, cartão microSD de 64 MB | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Computador de 2GB de memória RAM, HD 320 GB, processador Pentium Corel 2 Duo, gravador de DVD, teclado, mouse, caixas de som, nobreaks e monitor de mínimo 17" | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Mesa para escritório de 1,20 x 0,60 com 2 gavetas c/chave Light com bordas em PVC em todo contorno, com estrutura em metalon quadrado, com pintura em epóxi pó texturizada. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Cadeira de Escritório Secretária Giratória com regulagem de altura a gás, Estofada em espuma injetada, com 30 mm de espessura. Medidas do ass/enc: ass- 390x390 enc- 290x360/320 aproximadamente, revestimento em tecido ou courino. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Armário de madeira para escritório alto, com 02 portas de abrir com chaves. Medidas: 0,80largura x 0,38profundidade x 1,60altura. | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2011 |
| | Ar condicionado de 9000 btus | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2012 |
| | Ar condicionado de 12000 btus | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2013 |
| | 2 Veículos tipo caminhão caçamba para coleta de lixo urbano | mar/11 | Contrato assinado em 23.03.2011, previsão de entrega para 23.04.2014 |

ANAPU

| Área | Objeto | Prazo | Situação |
|------|---|--------|---|
| | Ambulância equipada 1º socorros e equipamentos de transportes | jul/11 | Solicitado a compra, previsão para entrega em junho. |
| | Troca de seus equipamentos (5 UBS) reformadas, Valor Unitário R\$200.000,00 - Valor Total R\$1.000.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESÁ |
| | Equipamentos para novas UBS nas agrovilas (12 UBS) Valor Unitário R\$ 200.000,00 - Total 2.400.000,01 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESÁ |
| | Equipamentos para novas UBS nos bairros (7 UBS) Valor Unitário R\$ 200.000,00 - Total 1.400.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESÁ |
| | Ambulância equipada para UTI móvel R\$ 170.000,00 | | Solicitado a compra, previsão para entrega em junho. |

Acordos de Cooperação Técnica - UHE Belo Monte - Situação das Aquisições de equipamentos e materiais

| | | | |
|--|--|---|---|
| SAÚDE | 4 Ambulâncias do tipo veículos traçados 4x4 equipadas para 1º socorros Valor Unitário R\$130.000,00 - Total 520.000,00 | | Solicitado a compra, previsão para entrega em junho. |
| | Inclusão de UTI e CTI nas unidades médicas R\$ 300.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESA |
| | Contratação de multiprofissionais da área da saúde para dar real segurança no atendimento aos usuários do SUS R\$ 5.000.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESA |
| | Capacitação continuada dos profissionais que atuam na área da saúde 360.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESA |
| | 1 médico de família, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde e 1 motorista de ambulância | jul/11 | Não Iniciado assunto sendo tratado pelo Dr. Ladislau |
| | Ampliação da cobertura de áreas endêmicas e capacitação de novos agentes epidemiológico R\$ 500.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESA |
| | Aumento na frota de veículos para uso do controle de Endemias e novos equipamentos para melhor efetivação dos serviços e novos equipamentos para melhor efetivação dos serviços disponíveis R\$ 700.000,00 | | Compra em andamento (Endemias), previsão de entrega para junho. |
| Aumento dos recursos financeiros para manter as demandas R\$ 17.656.000,00 | | Aguardando especificação por parte da Prefeitura, já solicitada pela NESA | |
| EDUCAÇÃO | 3 Micro-ônibus de médio porte (com motoristas) para Sede Municipal | | Solicitado a compra, previsão para entrega em junho. |
| | 15 carteiras de sala de aula (Escola José de Andrade Silva). | abr/11 | Solicitado a compra, previsão para entrega em maio |

ALTAMIRA

| Área | Objeto | Prazo | Situação |
|---------------------------|--|------------|---|
| EDUCAÇÃO | Os móveis e Equipamentos necessários à operacionalização das unidades previstas, bem como sua adequação quantitativa e qualitativa, serão objetos de tratativa entre as partes Convenientes. | | O Município ainda não fornecer a listagem dos equipamentos para ser aprovado pela NESA. |
| | DEMUTRAN | | |
| | 4 Veículos tipo caminhonete 4X4 cabine dupla diesel, na cor branca, com giroflex e rádio. | 31.07.2011 | Adquirido |
| | 10 Motocicletas na cor branca, modo 150cc, com giroflex e rádio. | | Adquirido |
| | 1 Caminhão Truck branco modelo 24.220 VW ou compatível, equipado com plataforma de guincho 10 m. | | Adquirido |
| | 1 Caminhão branco modelo 8.120 VW ou compatível, equipado com plataforma de guincho 6m. | | Adquirido |
| | 1 Caminhão branco modelo 5.140 VW ou compatível com Equipamento para pintura/sinalização de Pista. | | Adquirido |
| | Sinalização horizontal de vias – cruzamentos, rotatórias e faixas de pedestres – 20.000m ² . | | Adquirido |
| | 3.000 Placas para sinalização de trânsito | | Adquirido |
| | 2.000 Placas para sinalização com nomes de ruas | | Adquirido |
| | 108 Semáforo padrão (grupos focais, colunas, redes de alimentação e comunicação e controladores). | | Adquirido |
| | 300 Cones de Borracha padrão para sinalização de trânsito | | Adquirido |
| | 50 Sinalizador tipo colete para guarda de trânsito | | Adquirido |
| | 50 Calça Tática operacional padrão Demutran | | Adquirido |
| | 50 Camisa meia manga cor preta padrão Demutran | | Adquirido |
| | 50 Gorro Operacional cor preta padrão Demutran | | Adquirido |
| | 50 Coturno extra leve com zipper padrão Demutran | | Adquirido |
| | 60 Rádios HT 450 Motorola | | Adquirido |
| | 1 Repetidora para comunicação | | Adquirido |
| | 10 Computador de 2GB de memória RAM, HD 320 GB, processador Pentium Corel 2 Duo, gravador de DVD, teclado, mouse, caixas de som, nobreaks e Monitor LCD de 17" | Adquirido | |
| | 5 Impressoras multifuncional tipo HP Photosmart C3 – 180 ou Equivalente | Adquirido | |
| SEGURANÇA | GUARDA MUNICIPAL | | |
| | 50 Equipamentos armamento não letal - TASER M26, com coldre em polímero e carregador de pilhas. | 31.7.2011 | Adquirido |
| | 3 Equipamentos armamento não letal - TASER X26, com coldre em polímero, bateria digital descartável e três baterias extras. | | Adquirido |
| | 1 Data kit para Taser M26 | | Adquirido |
| | 1 Data kit para Taser X26 | | Adquirido |
| | 53 Porta cartuchos Taser | | Adquirido |
| | 132 Cartuchos Taser com alcance de 10,6 m | | Adquirido |
| | 400 Cartuchos Taser com alcance de 6,4 m | | Adquirido |
| | Treinamento Taser para 60 guardas | | Adquirido |
| | 1 Microônibus master tipo valare ou compatível, com capacidade 27 lugares na cor Azul marinho | | Adquirido |
| | 1 Veículos tipo caminhonete 4X4 cabine dupla diesel, na cor azul | | Adquirido |
| | 2 Veículos tipo leve para quatro passageiros, com giroflex, sirene e xadrex, para serviços operacionais, na cor azul marinho | | Adquirido |
| | 10 Motocicletas na cor branca, modo 150cc, com giroflex e rádio. | | Adquirido |
| | 247 Calça tecido Techno Rip Stop santista, de cor azul marinho | | Adquirido |
| | 247 Gandola de mangas compridas tecido Techno Rip Stop santista, de cor azul marinho | | Adquirido |
| | 116 Camisas de algodão de cor azul marinho | | Adquirido |
| | 140 Gorro ajustável (boné de bico), tecido Techno Rip Stop de cor azul | | Adquirido |
| | 124 Cinto de lona de cor azul marinho com fivela de cor preta, com as letras GM | | Adquirido |
| | 124 Cinto de Guarnição na cor preta. | | Adquirido |
| | 124 Porta tonfa na cor preta. | | Adquirido |
| | 124 Porta algema na cor preta | | Adquirido |
| | 124 Porta rádio HT na cor preta | | Adquirido |
| | 124 Coldre porta pistola 379 | | Adquirido |
| | 120 Coturno modelo Arroy plus tech, cor preta | | Adquirido |
| | 40 Tonfa confeccionada em polímero | | Adquirido |
| | 50 Algema confeccionada em aço com trava de segurança. | | Adquirido |
| | 70 Colete Balístico de Nivel II com capa de cor preta | | Adquirido |
| | 40 Rádio HT Motorola EP450 | | Adquirido |
| | 1 Data Show Sony TPL-ES4 2200 | | Adquirido |
| | 1 Tela de projeção para data show com tri-pé, | | Adquirido |
| | 1 Caixa amplificadora 500 wats | | Adquirido |
| | 2 Microfone sem fio stoner UHF SW-482/ST. | | Adquirido |
| 2 Pedestal para microfone | Adquirido | | |

| Acordos de Cooperação Técnica - UHE Belo Monte - Situação das Aquisições de equipamentos e materiais | | |
|--|---|--------------------------|
| | Caminhão coletor e compactador de lixo, tração de no mínimo 6 x 4, motor a diesel, direção hidráulica, potência de no mínimo 200 cv, mínimo de 2500 rpm, câmbio de no mínimo 6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) à ré, capacidade coletora de no mínimo 19 m ³ (dezenove metros cúbicos), com todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de série, 0 (zero) quilômetro, ano 2011, com garantia mínima de 1ano, cor branca. | Em Processo de Aquisição |
| | Caminhão trucado de fabricação nacional, cor BRANCA, Cabine avançada basculante confeccionada em chapa de aço, Truck, Tração 6x4, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10M3 e todos os itens de segurança exigidos por lei. | Em Processo de Aquisição |
| Aterro Sanitário | Motoniveladora de 165 Kw (225 hp) com escarificador e ripper-escarificador. | Em Processo de Aquisição |
| | Trator de esteira tipo D-6 ou FD9 ou equivalente com lâmina frontal. | Em Processo de Aquisição |
| | Pá Carregadeira de rodas de fabricação nacional, motor turbo à diesel, 06 (seis) cilindros, potência de mínima de 142 hp, 2.500 rpm, direção hidrostática, totalmente hidráulica, pneus 17,5x25, dotada de transmissão com 04 (quatro) marchas à frente e 04 (quatro) a ré, freios multidisks em banho de óleo, caçamba com dentes com capacidade para 1,91 m ³ , cabine aberta ROPS, equipamentos de segurança obrigatórios, peso operacional de 10.089 kg, alarme e luz de marcha ré, limpador e lavador de pá-brisa dianteiro, transmissão Power Shift, sistema elétrico de 24 volts, 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio, todos equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito | Em Processo de Aquisição |
