

PACOTE DE TRABALHO: 12.1.3 Projeto de Demolição e Desinfecção de Estruturas e Edificações

Atividades I Produtos


Item	Descrição
------	-----------



CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

12	12. PLANO DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
12.1	12.1 Programa de Desmatamento e Limpeza das Áreas dos Reservatórios
12.1.3	12.1.3 Projeto de Demolição e Desinfecção de Estruturas e Edificações
1	Planejamento
1	Planejamento
2	Execução
2.1	Mobilização de Máquinas e Pessoal
2.1	Mobilização de Máquinas e Pessoal
2.2	Demolição das Edificações do Reservatório do Xingu
2.2	Demolição das Edificações do Reservatório do Xingu
2.3	Demolição das Edificações do Reservatório Intermediário
2.3	Demolição das Edificações do Reservatório Intermediário
2.4	Desinfecção das Fontes de Contaminação do Reservatório do Xingu
2.4	Desinfecção das Fontes de Contaminação do Reservatório do Xingu
2.5	Desinfecção das Fontes de Contaminação do Reservatório Intermediário
2.5	Desinfecção das Fontes de Contaminação do Reservatório Intermediário
2.6	Remoção de Entulhos e Materiais Flutuantes do Reservatório do Xingu
2.6	Remoção de Entulhos e Materiais Flutuantes do Reservatório do Xingu
2.7	Remoção de Entulhos e Materiais Flutuantes do Reservatório Intermediário
2.7	Remoção de Entulhos e Materiais Flutuantes do Reservatório Intermediário
3	Relatórios
3.1	Relatórios Parciais
3.1	Relatórios Parciais
3.2	Relatórios Consolidados
3.2	Relatórios Consolidados

2011				2012				2013				2014				2015				2016															
T1	T2	T3	T4																																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

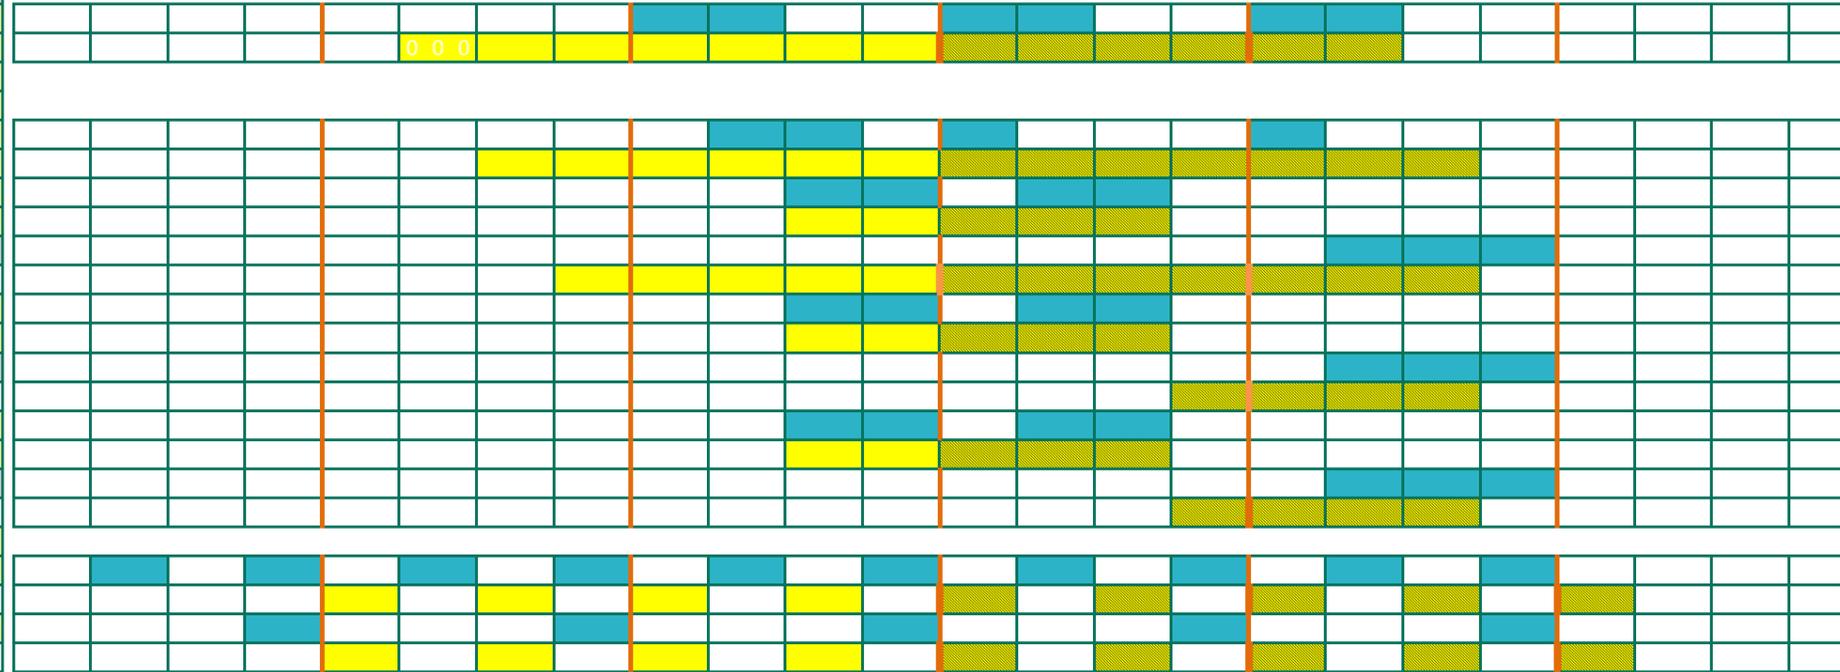

LEGENDA PBA Realizado Previsto
