


**Anexo 3.4-5 - Gráfico de Acompanhamento
da Instituição da Faixa de Servidão**



TRANSNORTE ENERGIA S/A.
ACOMPANHAMENTO FUNDIÁRIO

Atualização
27/03/2014

ITEM	ATIVIDADE FUNDIÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE		%	
			PREVISTA	EXECUTADA	EXECUTADA	À EXECUTAR
1.0	CADASTRO DAS PROPRIEDADES	Unid.	1.085	1.085	100,00%	-
1.1	PARTICULAR - NEGOCIÁVEIS	Unid.	1.011	1.011	-	-
1.1.1	AMAZONAS		323	323	-	-
1.1.2	RORAIMA		688	688	-	-
1.2	PÚBLICA	Unid.	12	12	-	-
1.2.1	AMAZONAS		8	8	-	-
1.2.2	RORAIMA		4	4	-	-
1.3	TRAVESSIAS	Unid.	62	62	-	-
1.3.1	AMAZONAS		16	16	-	-
1.3.2	RORAIMA		46	46	-	-
2.0	PERMISSÃO PARA ESTUDOS - PROCESSOS	Unid.	1.011	1.011	100,00%	-
2.1	AMAZONAS	Unid.	323	323	100,00%	-
2.1.1	PERMISSÃO LIBERADA / ASSINADA	Unid.	-	301	-	-
2.1.2	PERMISSÃO LIBERADA / VERBAL	Unid.	-	-	-	-
2.1.3	PERMISSÃO NÃO LIBERADA	Unid.	-	22	-	-
2.2	RORAIMA	Unid.	688	688	100,00%	-
2.2.1	PERMISSÃO LIBERADA / ASSINADA	Unid.	-	682	-	-
2.2.2	PERMISSÃO LIBERADA / VERBAL	Unid.	-	1	-	-
2.2.3	PERMISSÃO NÃO LIBERADA	Unid.	-	5	-	-
3.0	MARCAÇÃO DOS LIMITES DAS PROPRIEDADES	Unid.	1.085	1.085	100,00%	-
4.0	ELABORAÇÃO DOS CADASTROS E MEMORIAIS	Unid.	1.260	1.260	100,00%	-
5.0	NEGOCIAÇÃO FUNDIÁRIA	Km	721	550,12	76,27%	23,73%
5.1	AMAZONAS	km	247,03	198,01	80,16%	19,84%
5.2	RORAIMA	km	474,25	352,11	74,25%	25,75%
6.0	PAGAMENTO LIBERADO PARA INDENIZAÇÃO	Km	721	352,61	48,89%	51,11%
6.1	AMAZONAS	km	247,03	88,83	35,96%	64,04%
6.2	RORAIMA	km	474,25	263,78	55,62%	44,38%

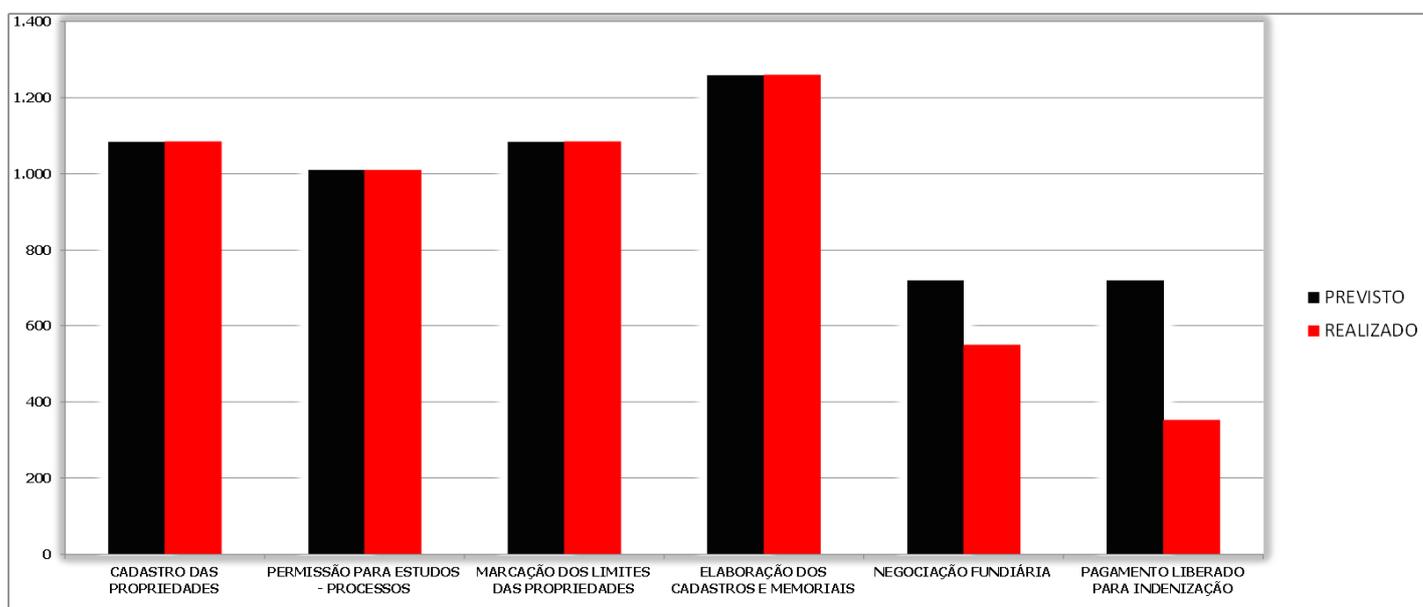



LT 500kV - ENGENHEIRO LECHUGA / EQUADOR / BOA VISTA

GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS

FUNDIÁRIO (NEGOCIAÇÕES / PAGAMENTO) - **Atualizado Até: 23/03/2014**

