



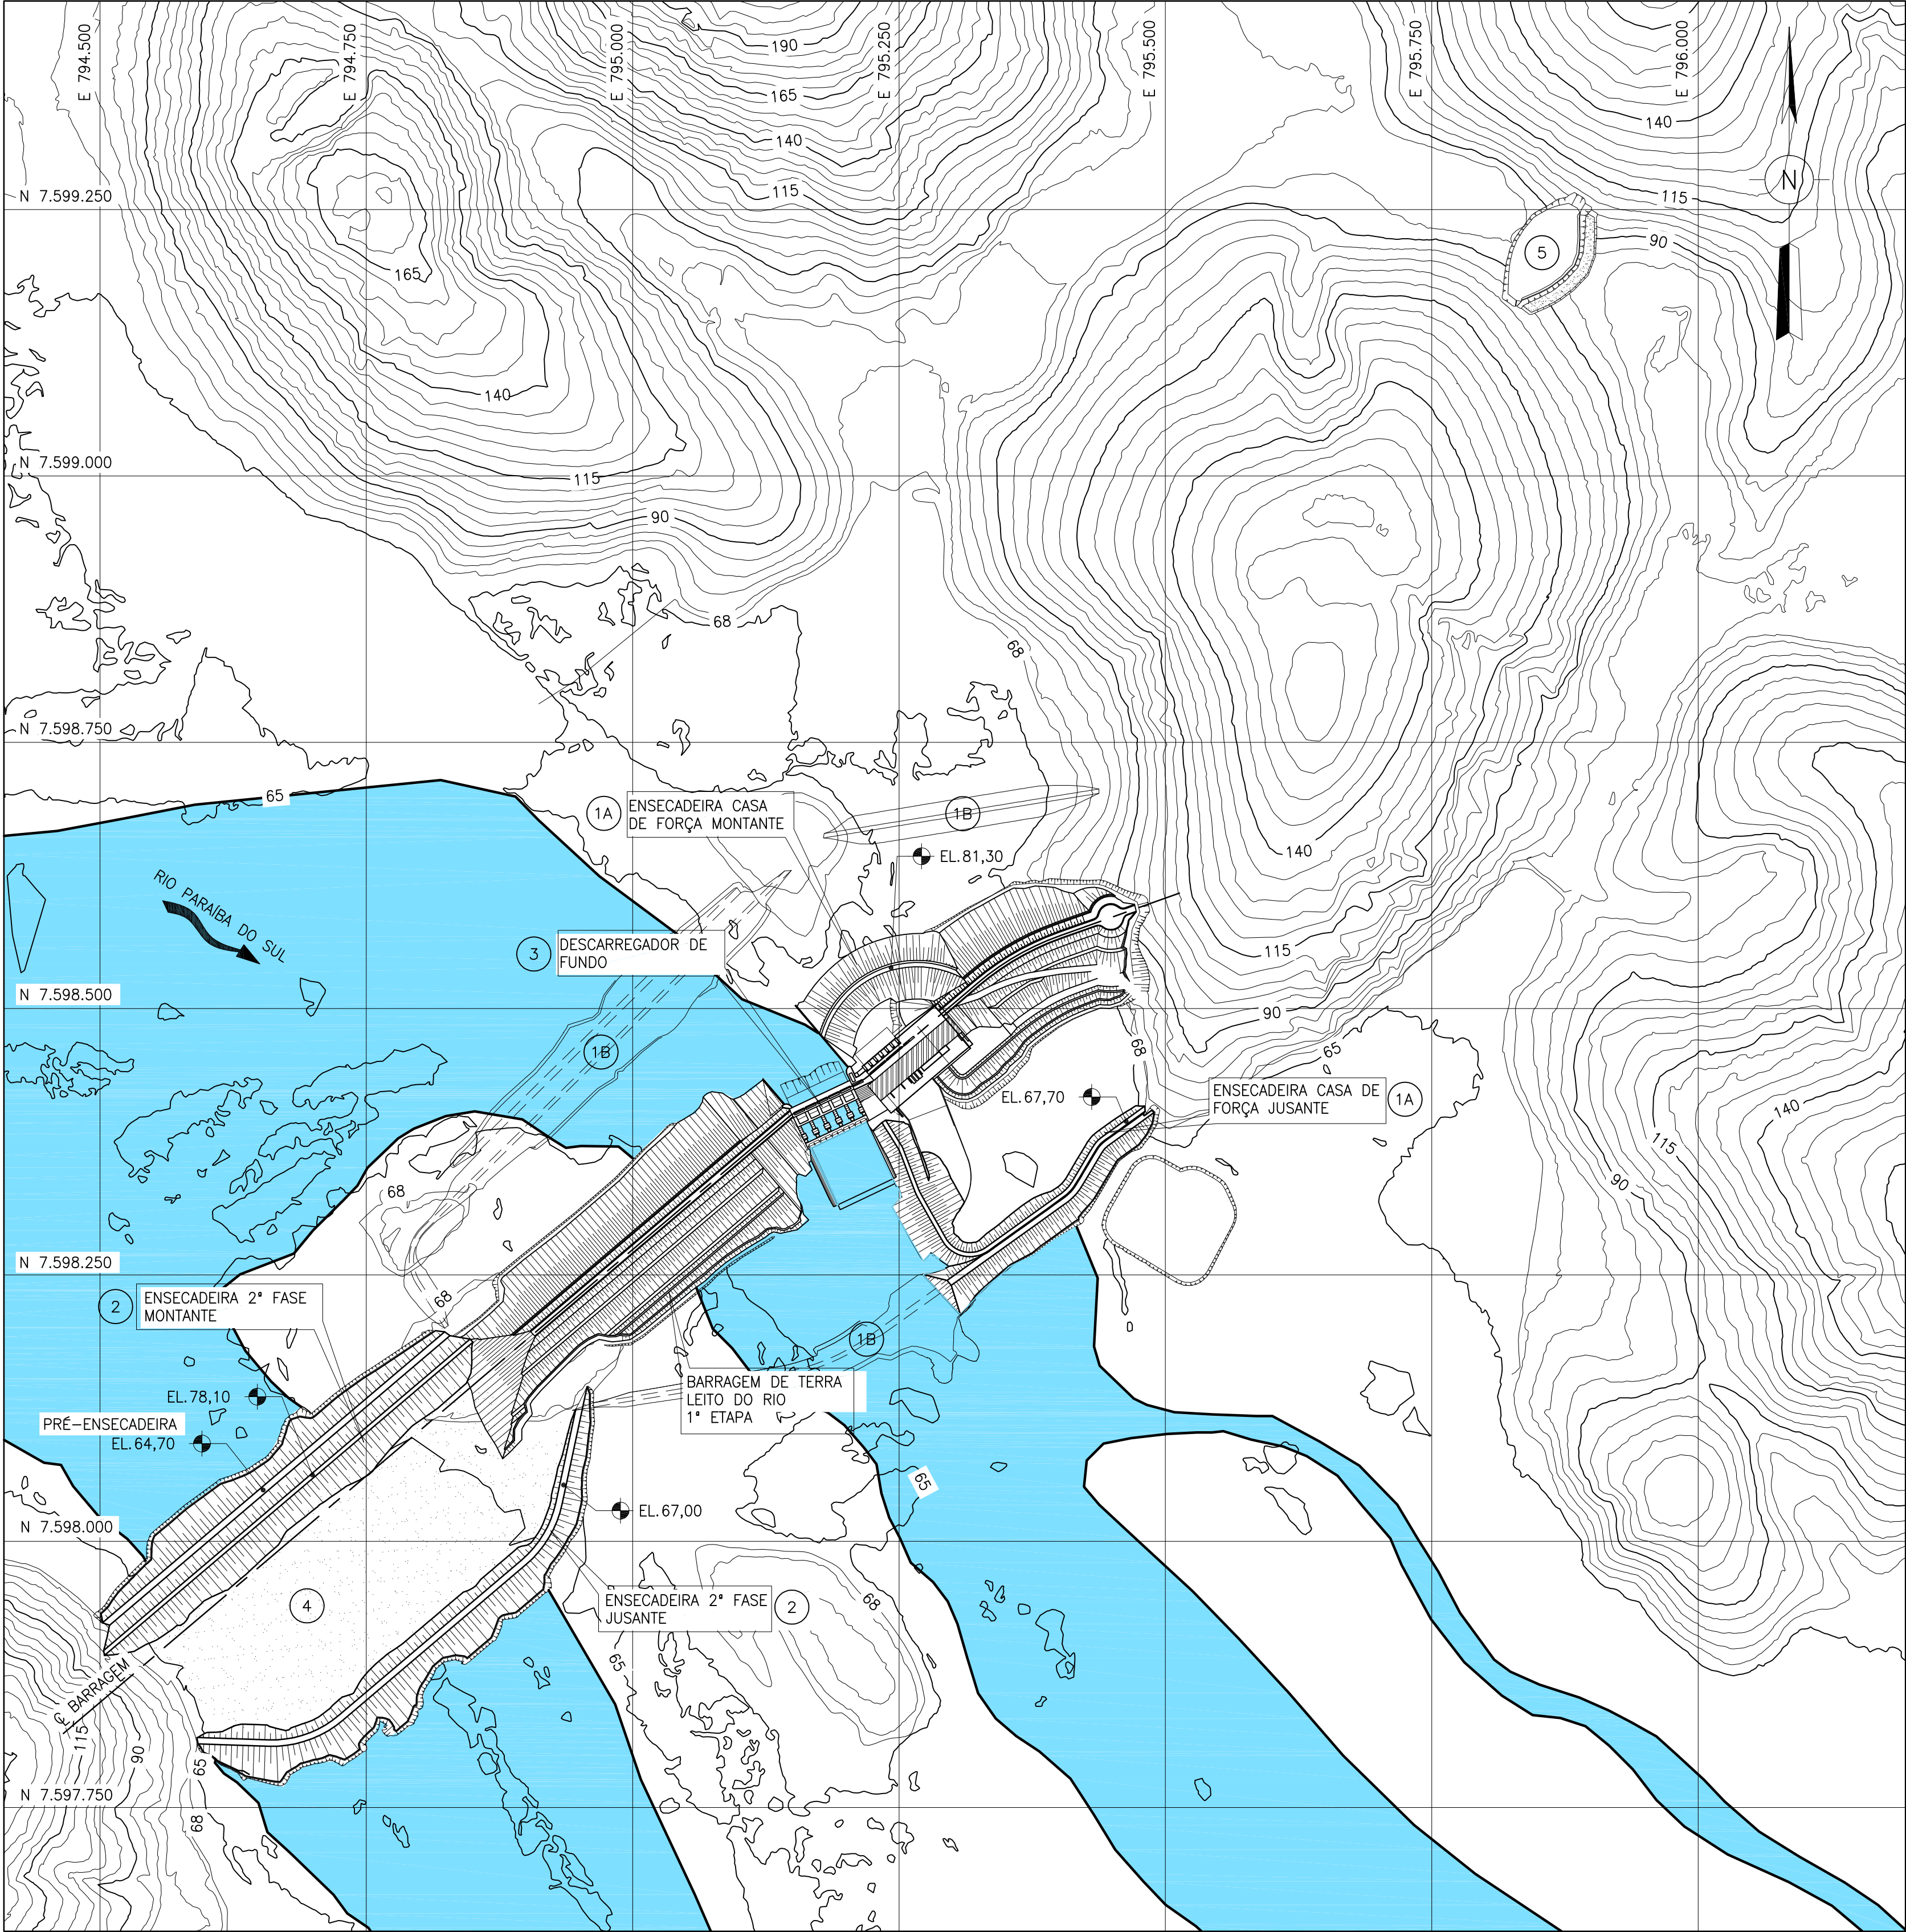

2ª FASE – 1ª ETAPA

LEGENDA DAS ATIVIDADES:

- 1A – CONSTRUÇÃO DA ENSECADURA DA CASA DE FORÇA MONTANTE NA EL.81,30 E JUSANTE NA EL.67,70 (TR 200 ANOS) – PERÍODO CHUVOSO;
- 1B – RETIRADAS ENSECADURAS DE 1ª FASE – PERÍODO SECO;
- 2 – CONSTRUÇÃO DAS ENSECADURAS DE 2ª FASE MONTANTE NA EL.78,10 E JUSANTE NA EL.67,00 (TR 50 ANOS) – PERÍODO SECO;
- 3 – DESVIO DO RIO PELOS 5 VÃOS DO DESCARREGADOR DE FUNDO – PERÍODO SECO;
- 4 – ESCAVAÇÃO, LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO DA 2ª ETAPA DA BARRAGEM DE TERRA NO LEITO DO RIO – PERÍODO SECO;
- 5 – LIMPEZA E TRATAMENTOS DA FUNDAÇÃO DO DIQUE, ESCAVAÇÃO DIQUE – PERÍODO SECO.



NOTAS:
1 – TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

0	EMISSÃO FINAL	LFM	MKT	MAI/16
Nº	DESCRIÇÃO	PREP.	APROV.	DATA

V L B E N G E N H A R I A



ELABORADO: FRN	VERIFICADO: JZS	APROVADO: MKT	DATA: MAI/16
GERENTE DE PROJETO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		
ENG. CIVIL: MARCELO KONRATH TURQUETI CREA: 113119/D-PR	ENG. CIVIL: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES LOPES CREA: 12.545/D-MG		



UHE ITAOCARA I

TÍTULO:	PROJETO BÁSICO GERAL SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA – 2ª FASE ARRANJO
---------	---

ESCALA: INDICADA	DIC. Nº 1530-IT B-DE-G11-0005	REV. 0
FOLHA: 2 DE 4	NÚMERO DO CLIENTE	REV.
