



1ª ETAPA

- 01 - EXECUÇÃO DA ENSECADIEIRA AUXILIAR DA 1ª FASE DE DESVIO - MARGEM ESQUERDA NA EL. 101,10.
- 02 - ESGOTAMENTO DA ÁREA INTERNA DA ENSECADIEIRA AUXILIAR DA 1ª FASE DE DESVIO - MARGEM ESQUERDA.
- 03 - EXECUÇÃO DA ESCAVACÃO DO CANAL DE DESVIO NA MARGEM ESQUERDA ATÉ A EL. 99,00.
- 04 - EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO INDUSTRIAL DA MARGEM DIREITA.

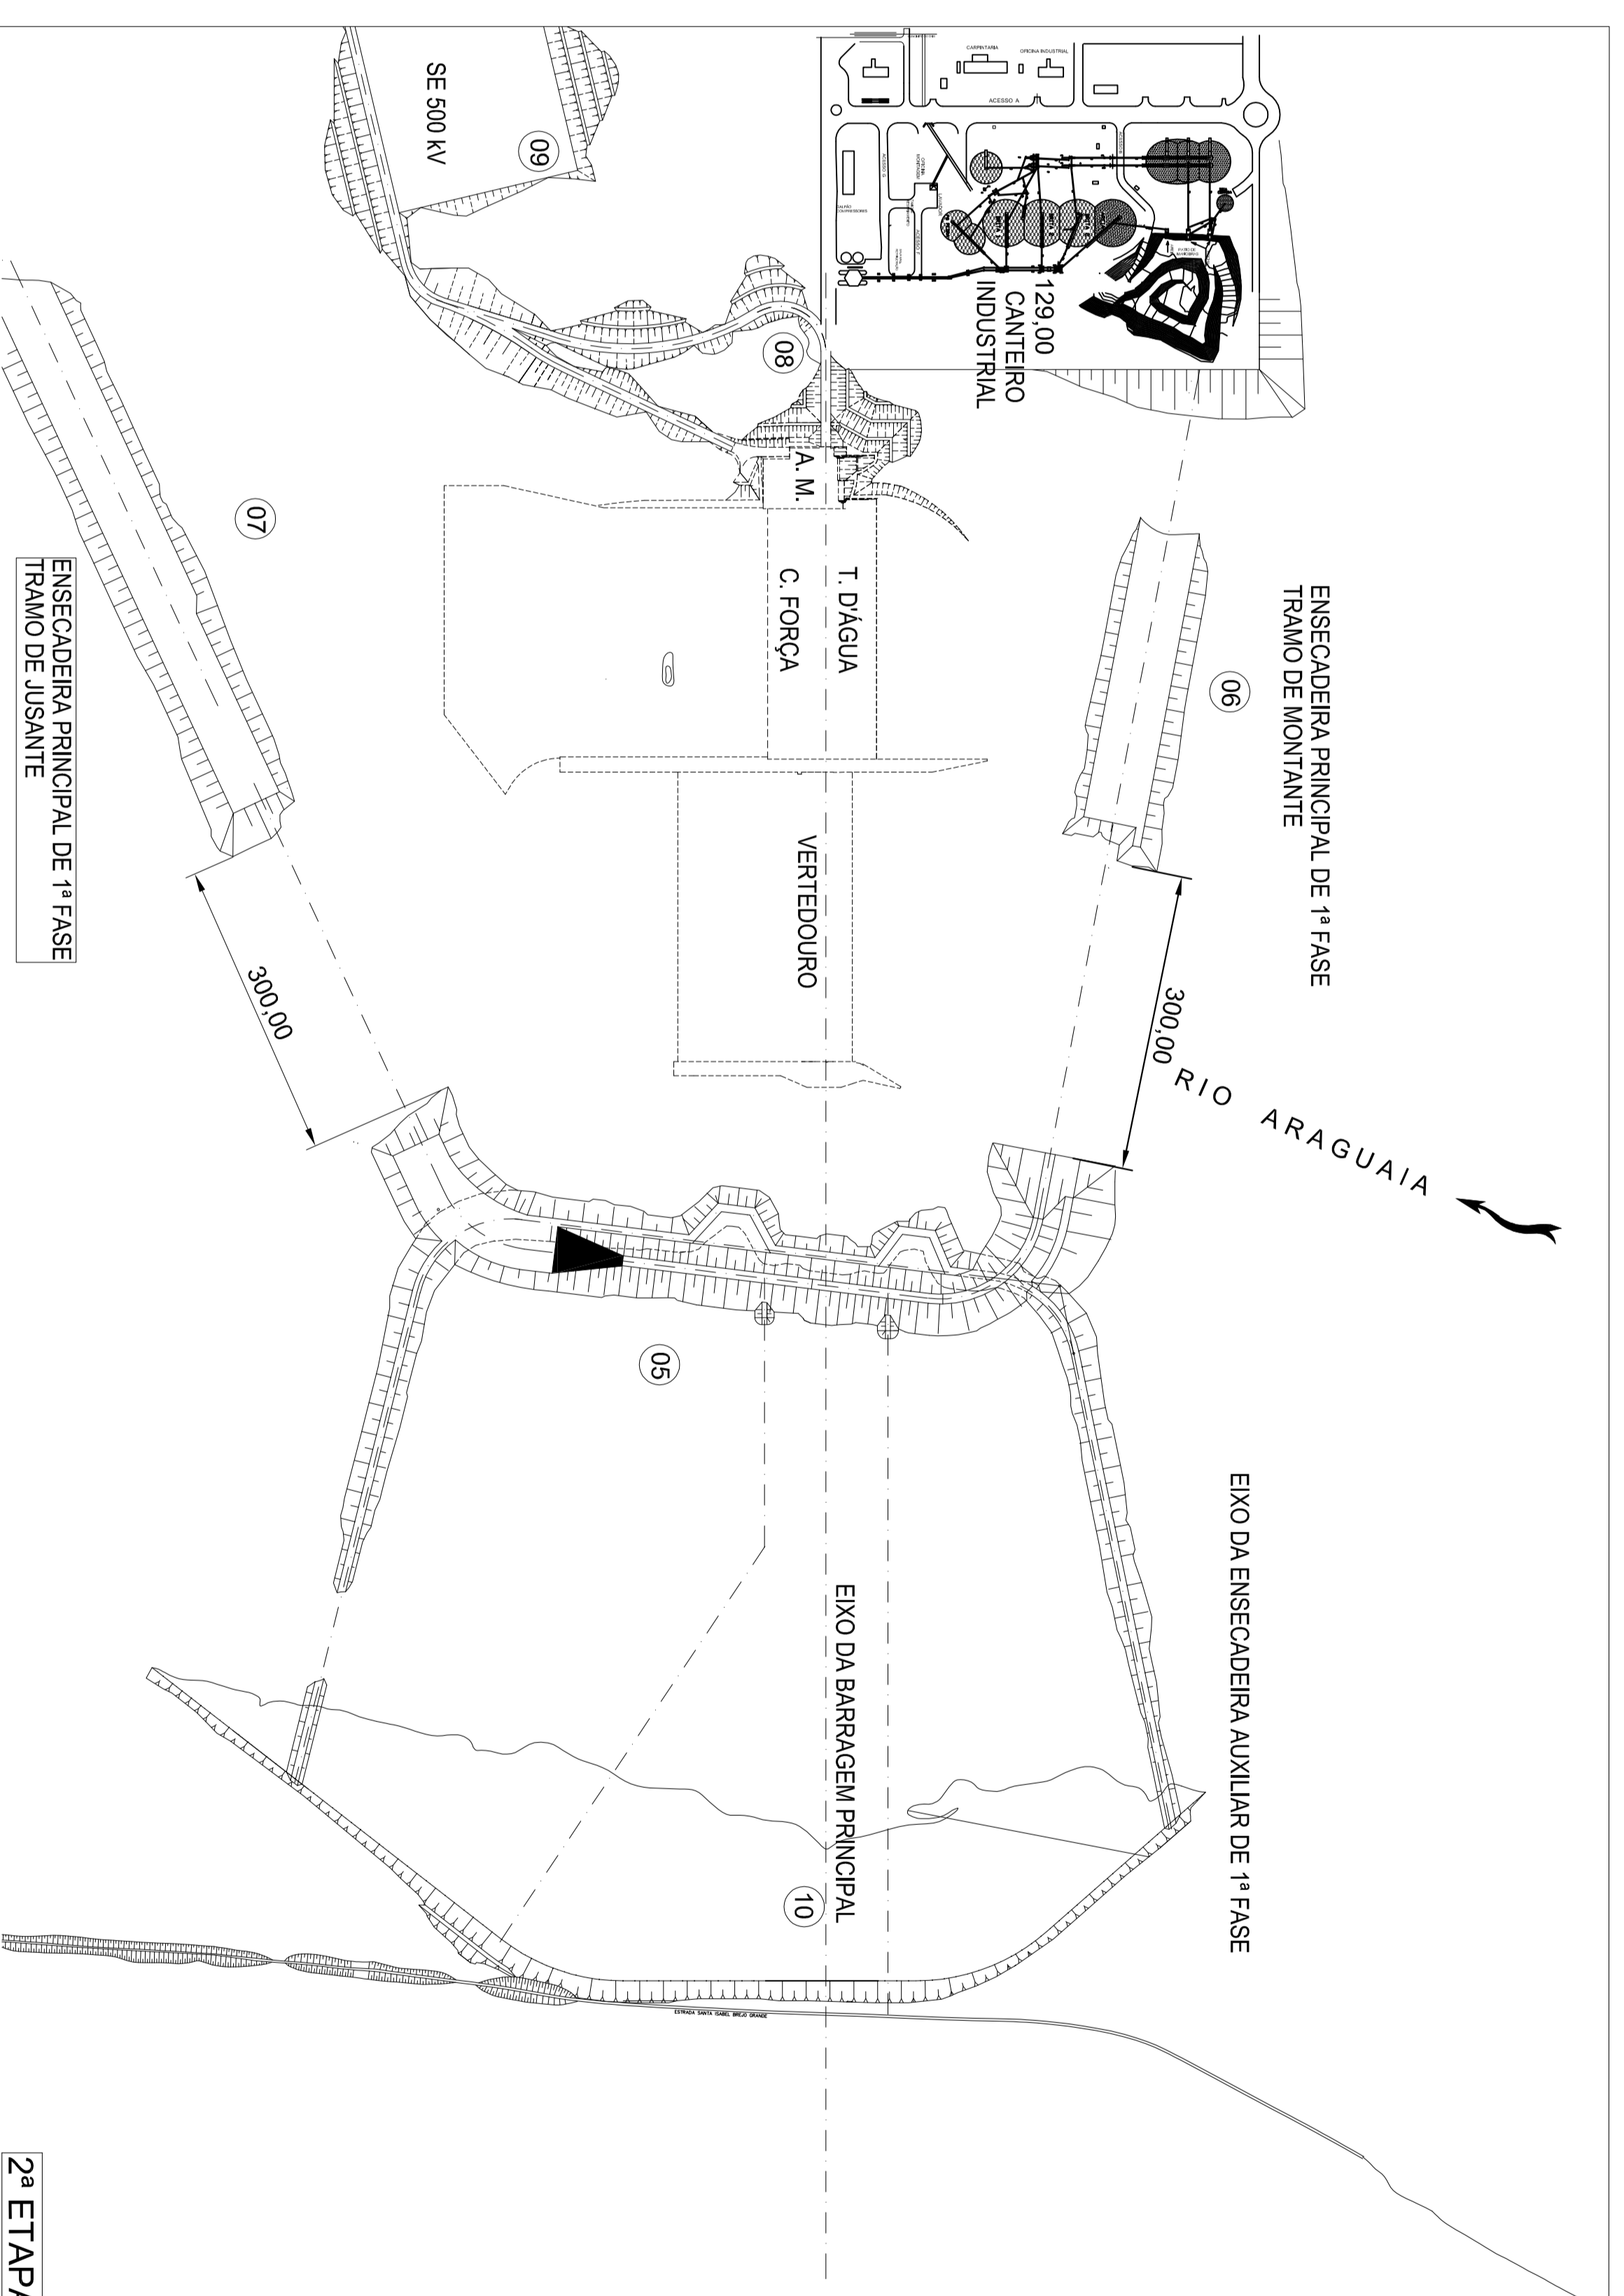


2ª ETAPA

- 05 - EXECUÇÃO DO TRAMO LONGITUDINAL DA ENSECADIEIRA PRINCIPAL DA 1ª FASE DE DESVIO NA ÁREA ENSECADA, ATÉ A COTA FINAL DE PROJETO.
- 06 - INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TRAMO TRANSVERSAL DE ENSECADIEIRA PRINCIPAL MONTANTE DA 1ª FASE DE DESVIO NA EL. 103,20.
- 07 - INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TRAMO TRANSVERSAL DE ENSECADIEIRA PRINCIPAL DA 1ª FASE DE DESVIO NA EL. 101,10.
- 08 - EXECUÇÃO DA ESCAVACÃO COMUM NA REGIÃO DA ÁREA DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO 500 KV.
- 09 - EXECUÇÃO DA ESCAVACÃO COMUM NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 500 KV.
- 10 - EXECUÇÃO DA LIMPEZA GROSSA E INJEÇÕES EXPLORATORIAS NA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL.

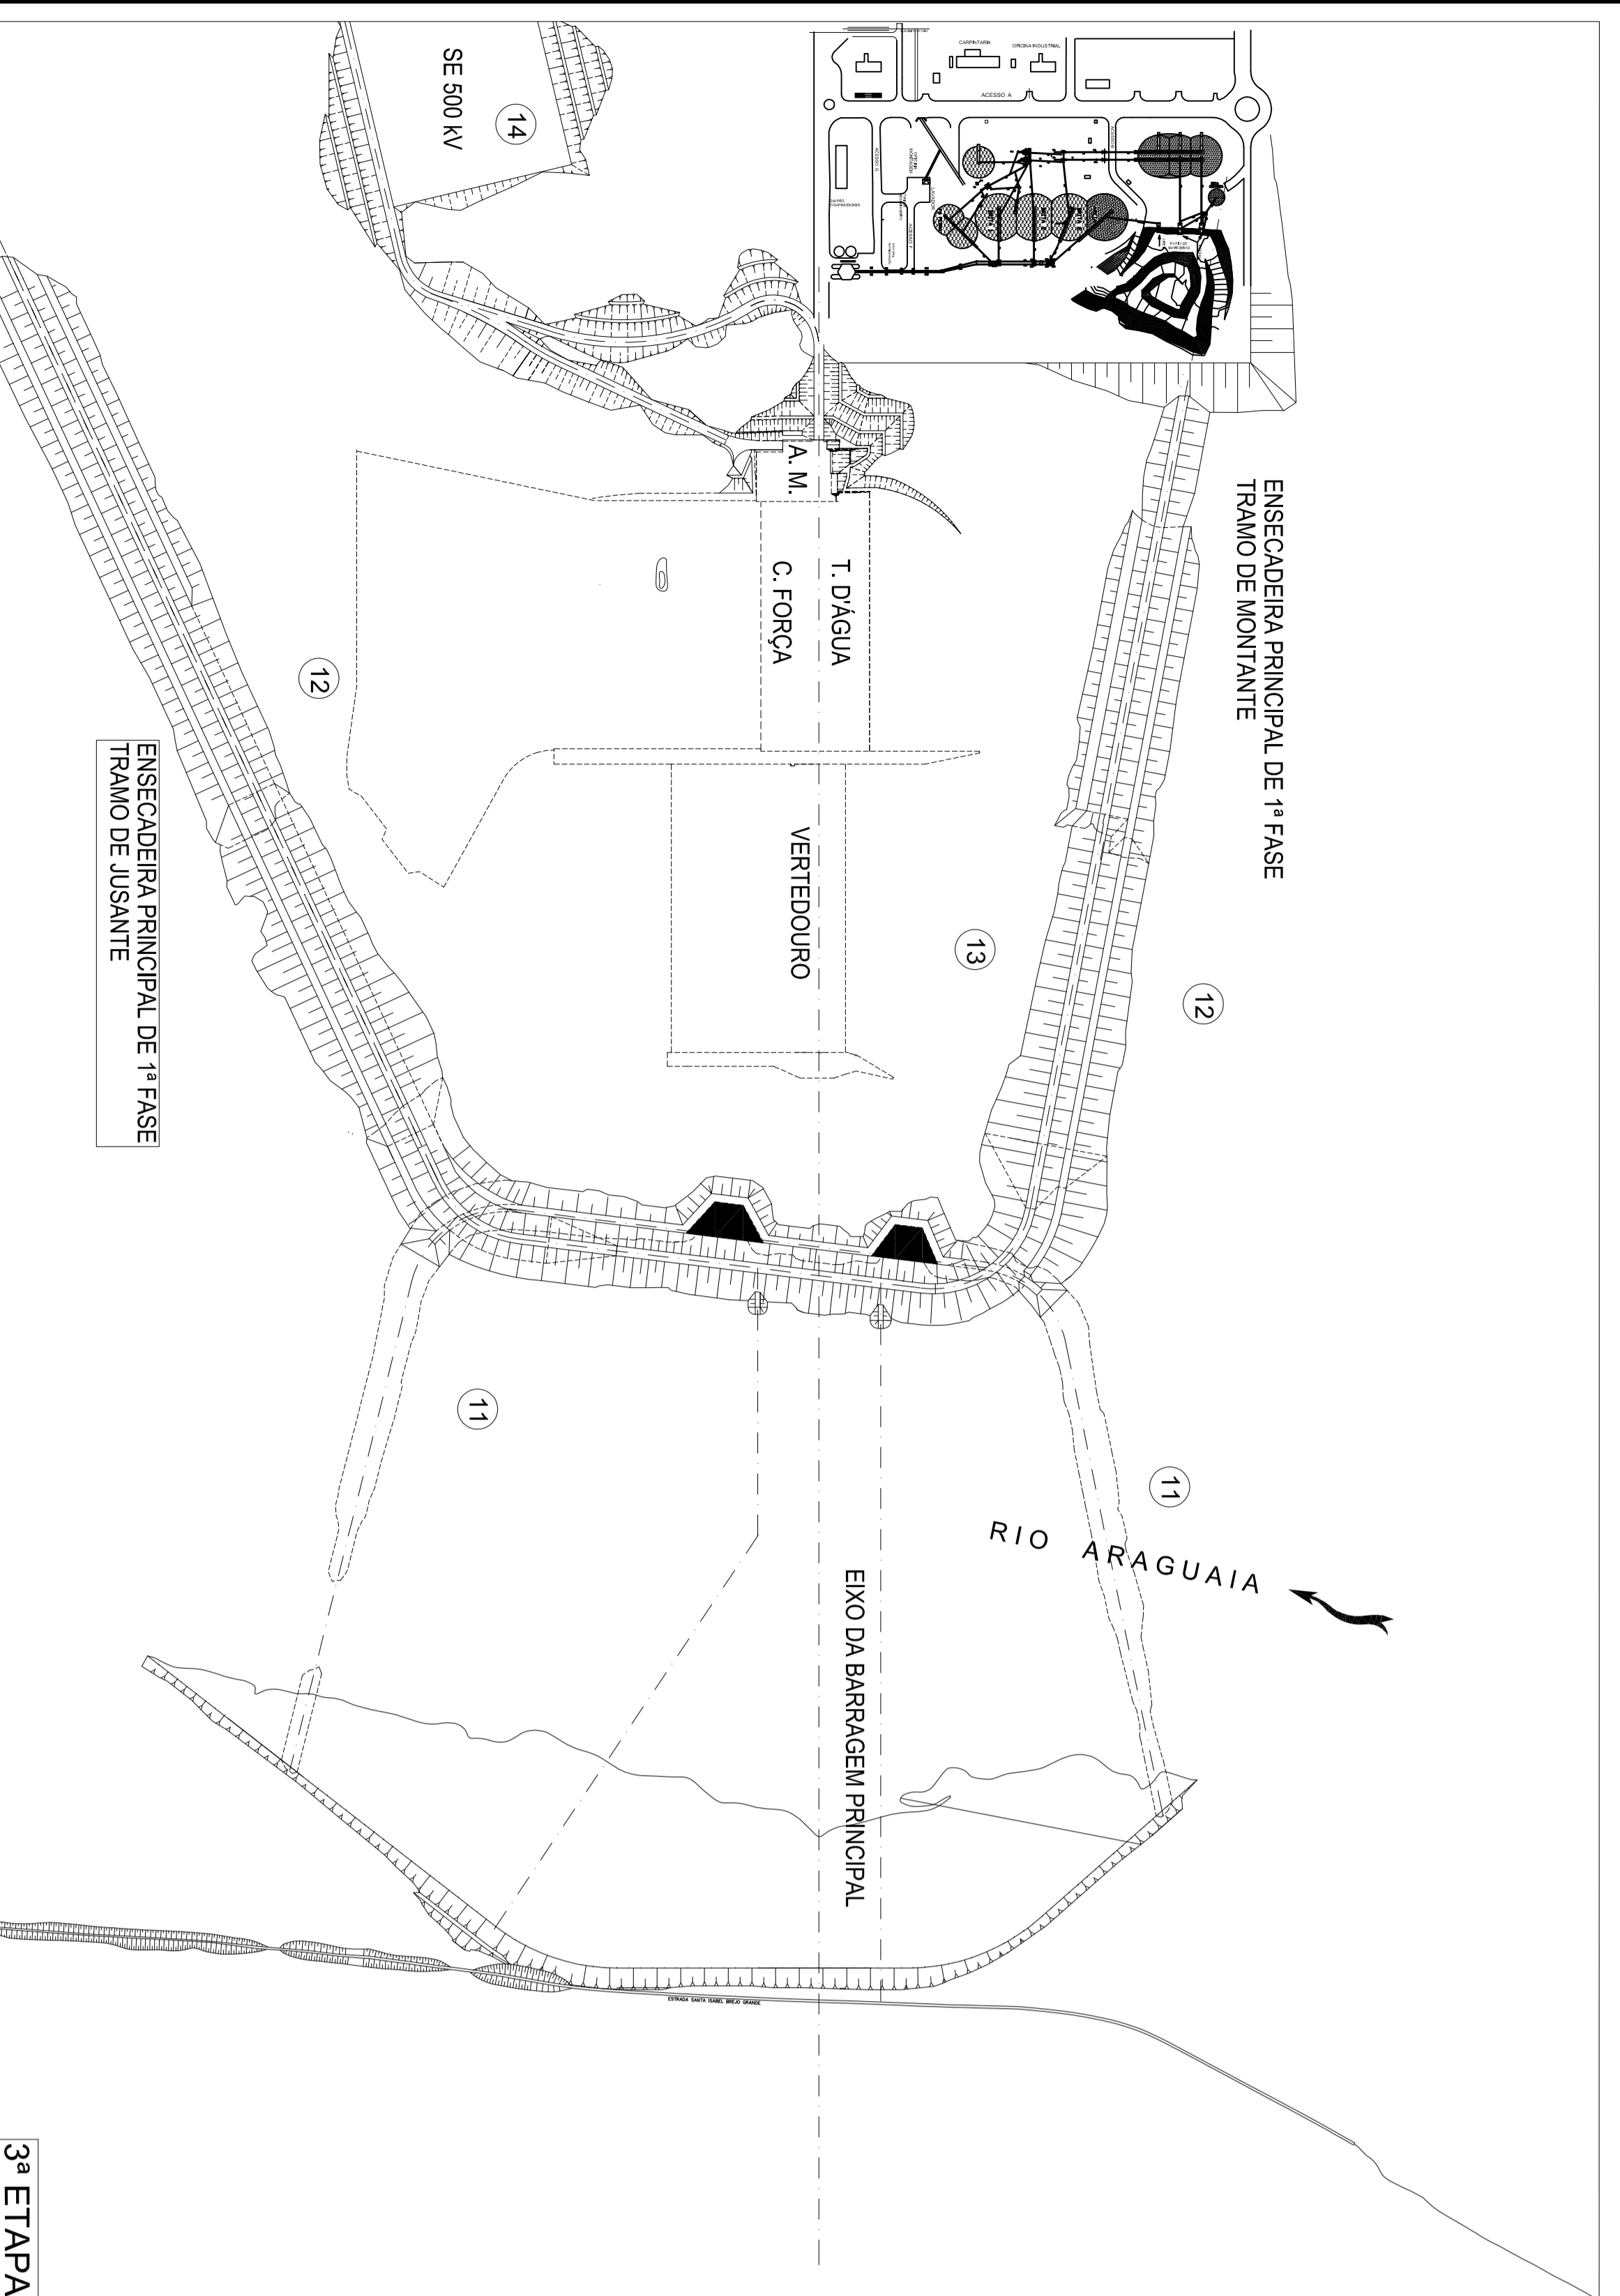


3ª ETAPA

- 11 - REMOÇÃO DA ENSECADIEIRA AUXILIAR DA 1ª FASE DE DESVIO.
- 12 - EXECUÇÃO DOS TRAMOS TRANSVERSALS DE MONTANTE E JUSANTE DA ENSECADIEIRA PRINCIPAL DA 1ª FASE DE DESVIO ATÉ A COTA FINAL DE PROJETO.
- 13 - ESGOTAMENTO DA ÁREA INTERNA DA ENSECADIEIRA PRINCIPAL DA 1ª FASE DE DESVIO - MARGEM DIREITA.
- 14 - IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO 500 KV.

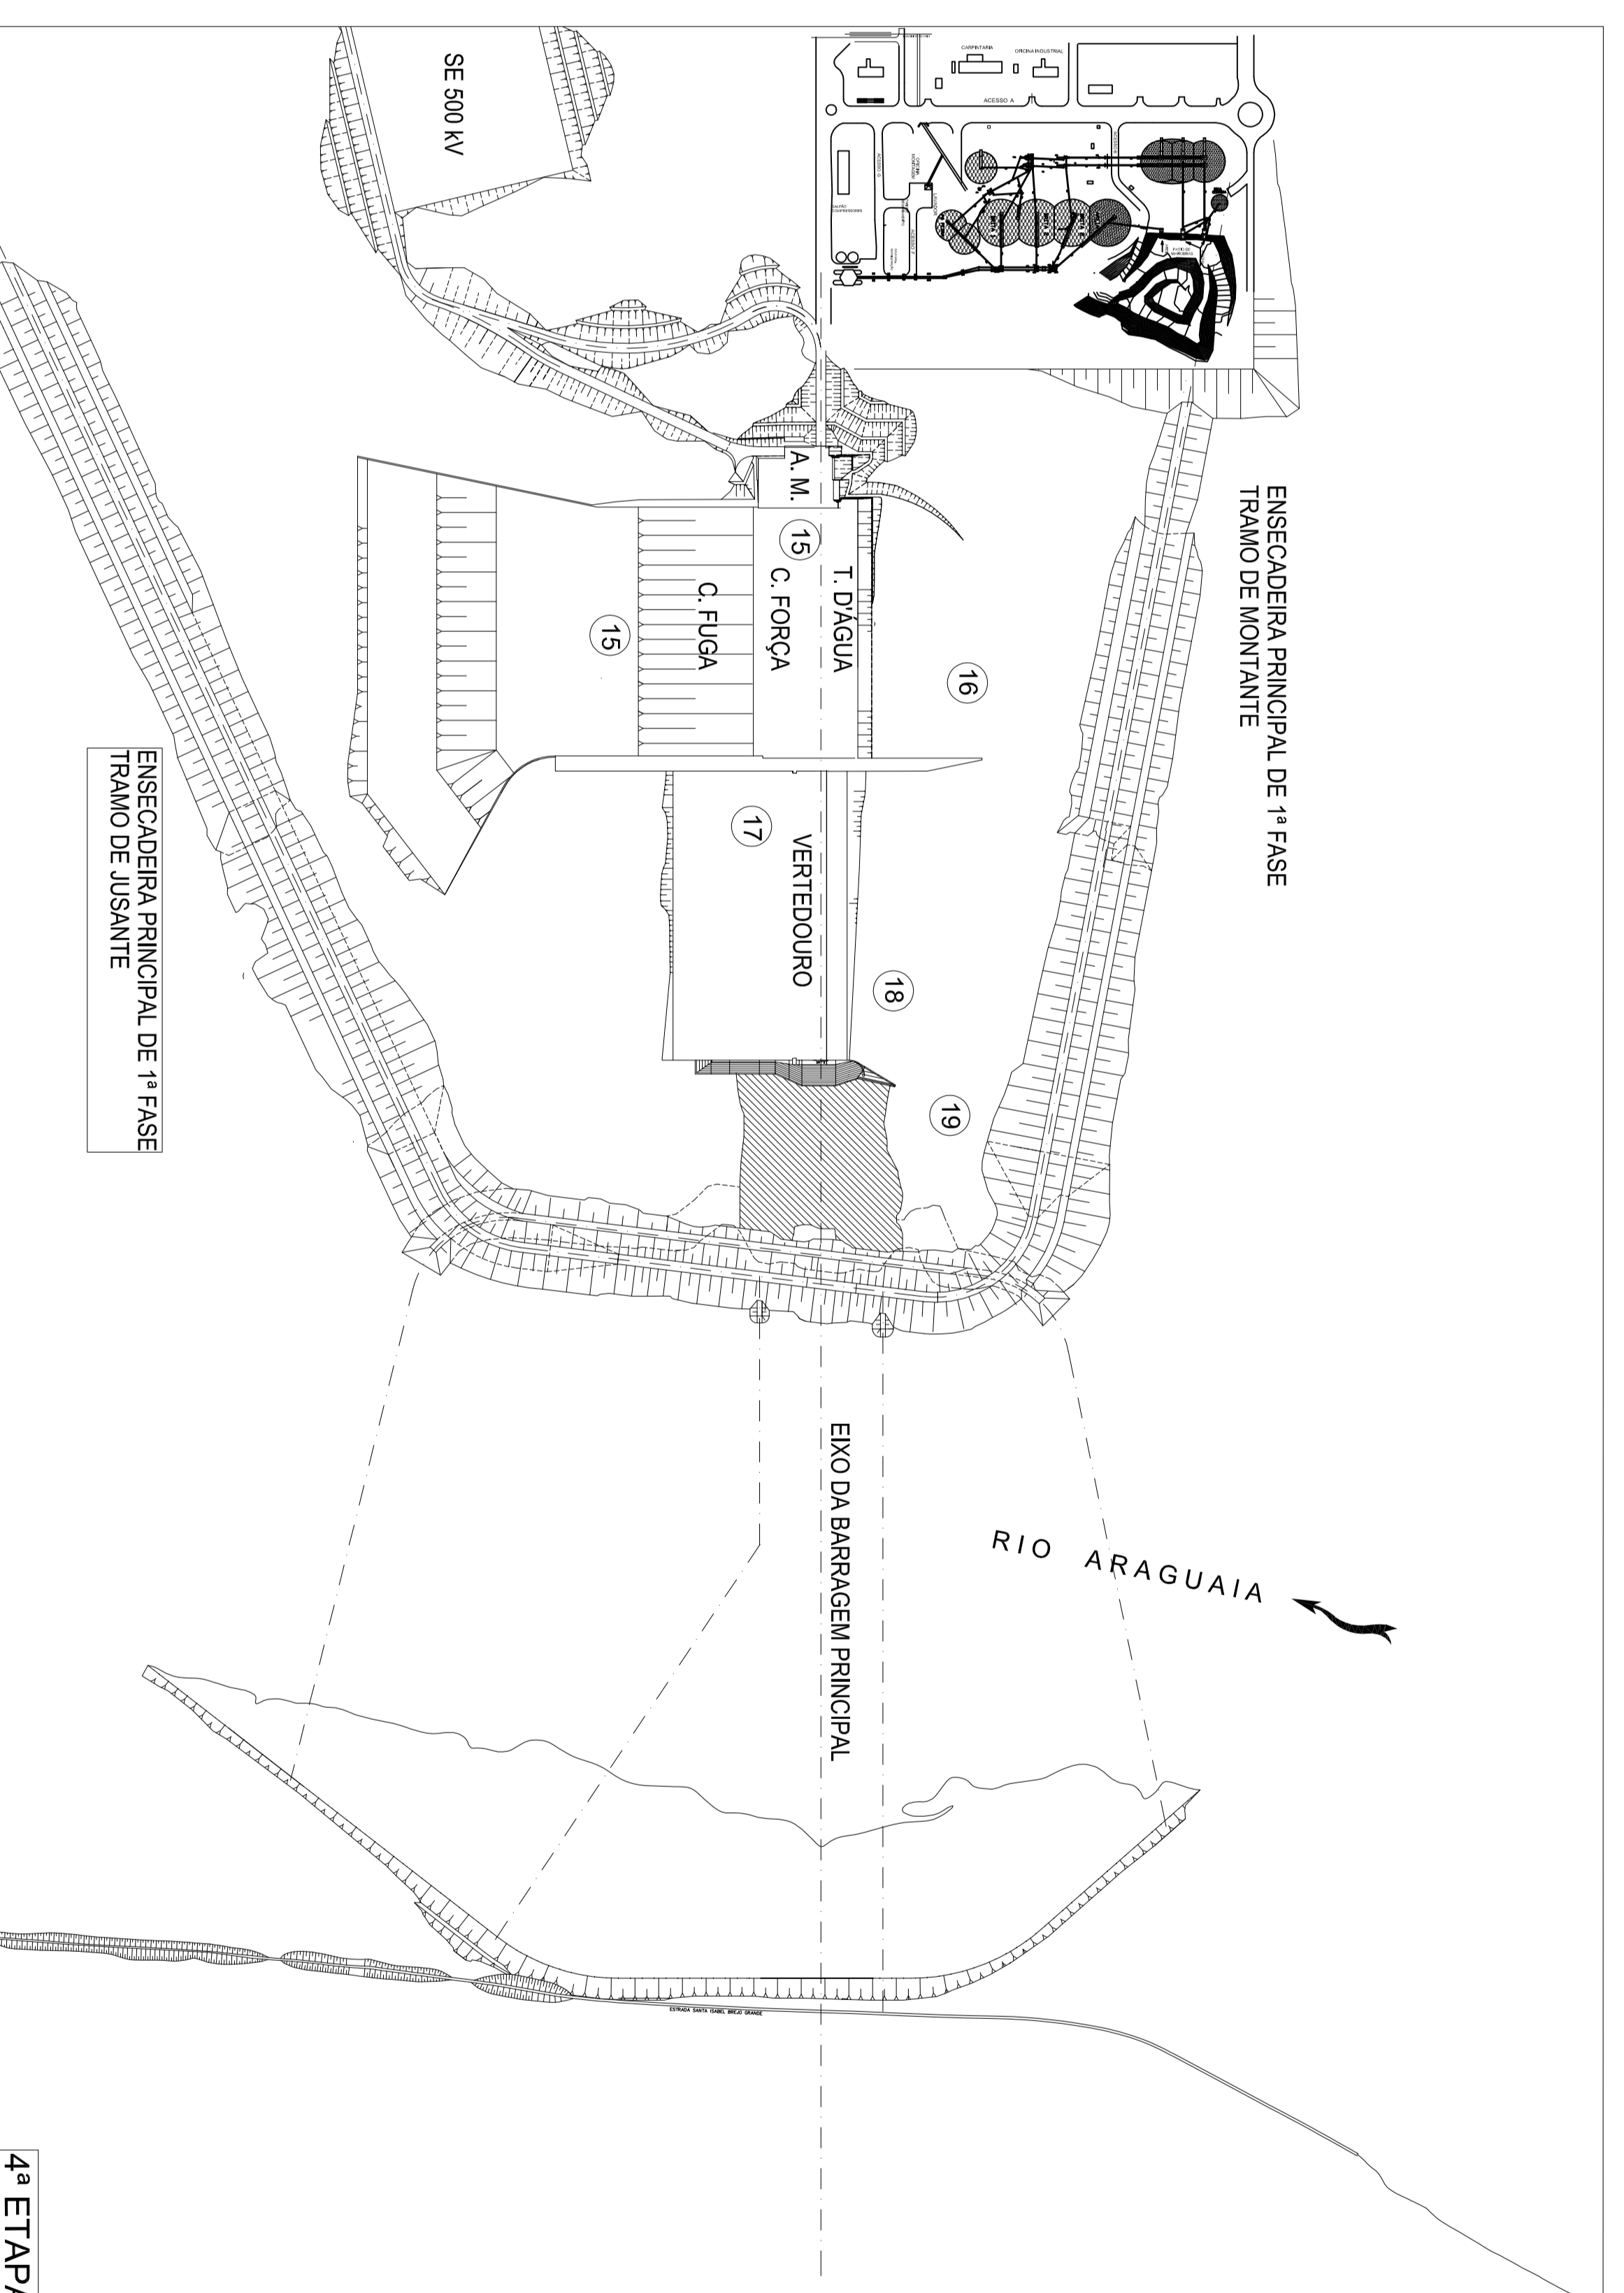

4ª ETAPA

- 15 - INÍCIO DAS ESCAVACOES EM ROCHA NA TOMADA D'ÁGUA, CASA DE FORÇA, CANAL DE FUGA E ÁREA DE MONTAGEM.
- 16 - ESCAVACÃO EM ROCHA, LIMPEZA E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO E INÍCIO DA CONCRETAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO DA ENSECADIEIRA AUXILIAR DA TOMADA D'ÁGUA.
- 17 - ESCAVACÃO EM ROCHA, LIMPEZA E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO DO VERTEDOURO.
- 18 - ESCAVACÃO EM ROCHA, LIMPEZA E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO E INÍCIO DA CONCRETAGEM DO MURO DE CONTENÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL MARGEM ESQUERDA.
- 19 - LIMPEZA E TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL MARGEM ESQUERDA ENTRE O MURO DE CONTENÇÃO ESQUERDO E ENSECADIEIRA PRINCIPAL DA 1ª FASE.

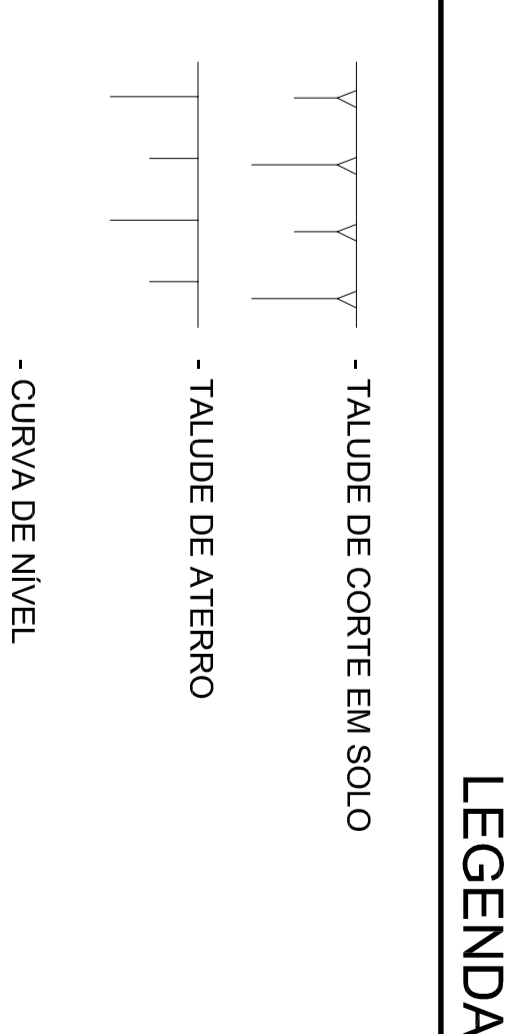

DESENHOS DE REFER

NOTAS

1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

EMPREENHIMENTO		AHE SANTA ISABEL - PROJETO BÁSICO	
ÁREA:	CIVIL		
TÍTULO:	CONSOLIDAÇÃO DO ARRANJO GERAL SEQUENCIA CONSTRUTIVA		
ELAB:	AC	VERS:	JBB
COORDENADORES:	SIFC		
DATA:	01/12/08	ESCALA:	INDICADA
REV. DATA:		FOLHA:	01
NATUREZA DA REVISÃO:		REVISÃO:	
CLIENTE:	ENGEVIX		
EMPRESA:	ENGEVIX		
PROJETO:	SIFC	R. TEC:	J.A.S
GERENTE:	21/2074		
Nº CLIENTE:	1090/US-10-DE-0005		0A

PLANTA

1:7.500
