


# Construção do Laboratório de Reprodução de Peixes

## Início: Maio/2013 - Término: Abril/2014

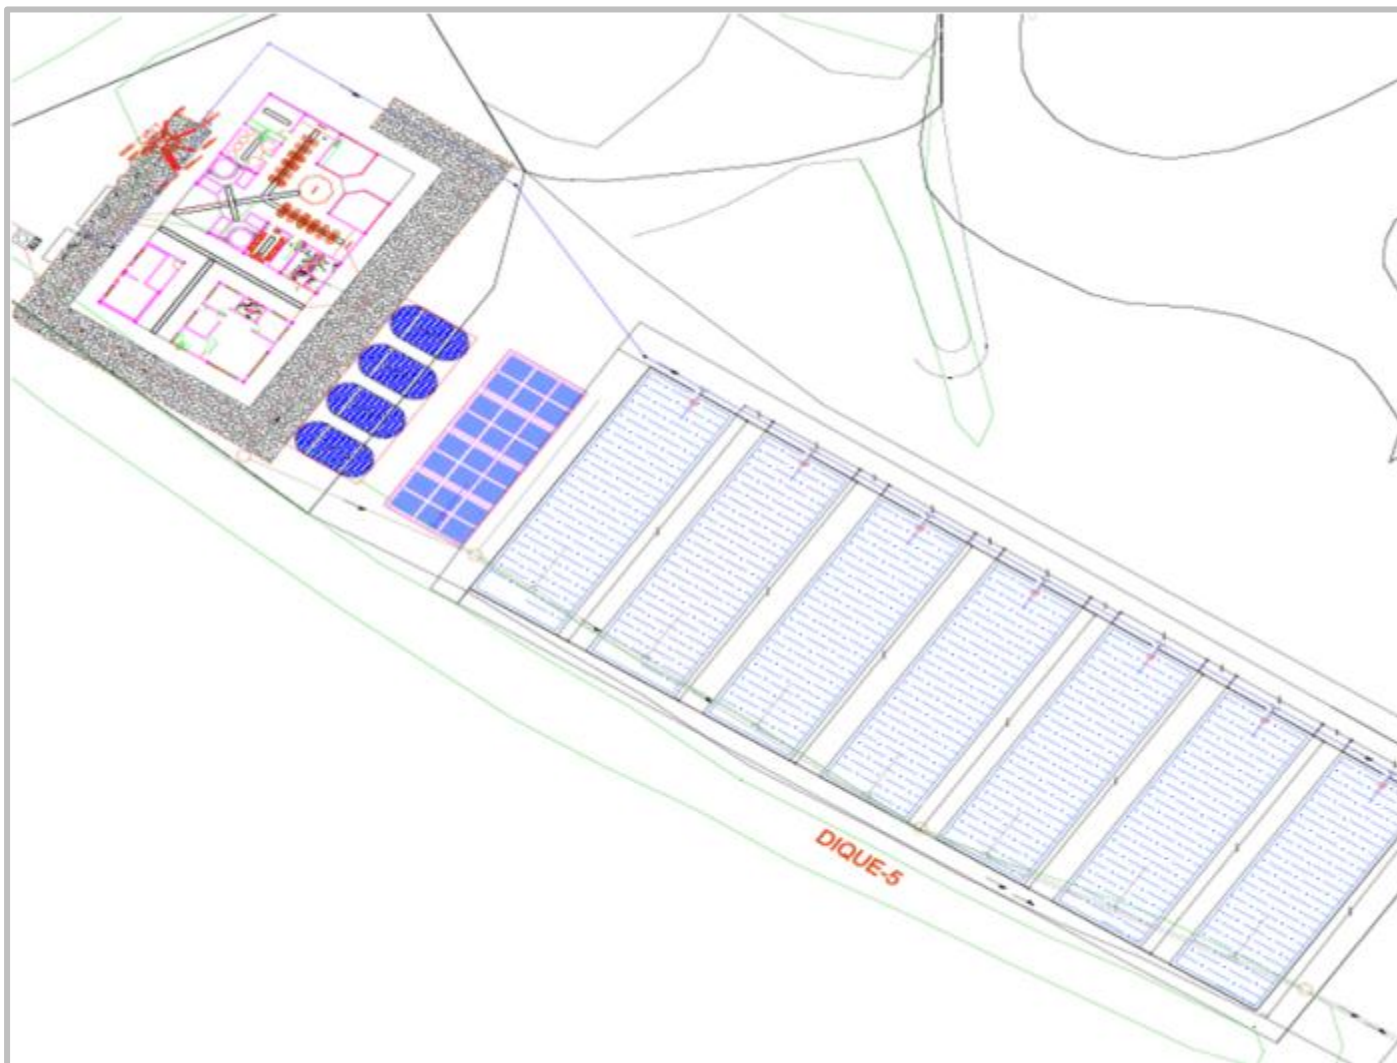

### MEKA ENGENHARIA LTDA.

#### ICTIOFAUNA

CONTRATO Nº	CT.DT.058.2013	
DATA DE INÍCIO	13/05/2013	
DATA DE CONCLUSÃO	17/04/2014	
VALOR (R\$)		
CONTRATADO	REALIZADO	SALDO
3.248.994,65	1.754.750,18	1.494.244,47
-	<b>54%</b>	<b>46%</b>

#### OBSERVAÇÕES

1º T.A.	PRAZO

# Construção do Laboratório de Reprodução de Peixes

Início: Maio/2013 - Término: Abril/2014



# Construção do Laboratório de Reprodução de Peixes

## Início: Maio/2013 - Término: Abril/2014

### Principais Atividades:

- Execução de 75% da cobertura do prédio;
- Regularização do piso para assentamento de revestimento cerâmico;
- Execução de 50% das instalações elétricas;
- Conclusão das alvenarias e revestimento dos raceways ovais e retangulares;
- Execução de 50% das esquadrias de janela;
- Execução de 90% das obras civis da ETA, do abrigo do GMG e Tanque de Ozônio.

### Pendências:

- Construção da adutora de água bruta (Previsão dos materiais: 18/03/2014);
- Execução de dois aquários retangulares e um octogonal.
