

# Relatório Mensal de Atividade de Supervisão Ambiental

## BR-285/RS – Abril/13

### 1. Identificação

**Empreendedor:** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

**Obra:** BR-285/RS, trecho entre São José dos Ausentes e a Divisa RS/SC.

**Empresa Responsável pela Supervisão Ambiental:** Enecon S.A.

**Supervisores Ambientais:** Eng.º Ambiental Gustavo V. Kaufmann e Biólogo Mateus A. Silveira

**Mês:** Abril/2013

### 2. Atividades Desenvolvidas no Período

- 19 de abril de 2013

– Próximo do Km 54+000 foi observado um exemplar de *Chironius bicarinatus* (Caninana-verde) em deslocamento natural, o mesmo foi acompanhado e direcionado para área de campo do entorno da rodovia.



Exemplar de Caninana-verde (*Chironius bicarinatus*). Animal direcionado para áreas naturais.

- 25 de abril de 2013

– Início da concretagem do bueiro no Km 53+760 m. Somente está sendo realizada em metade da pista para que possibilite o tráfego de máquinas pelo outro lado.



– Detonação do lado direito (restante) no Km 53+950 m e do bueiro localizado no Km 54+005 m. Em ambos os casos a explosão lançou o material em direção aos cânions, a uma distância aproximada de 25 metros.



– No trecho do Km 51+590 m a estrada será desviada para que possa ser realizado o bueiro sem interromper o tráfego.



- **26 de abril de 2013**

- Metade esquerda do bueiro do Km 53+540 m concretado.



- Concretagem do bueiro do Km 54+005 m. As placas de sinalização estão devidamente posicionadas, indicando o desvio para o tráfego de veículos.




- Detonação de um trecho do Km 53+600.



- **29 de abril de 2013**

- Colocação dos tubos de concreto no bueiro do Km 53+540 m.

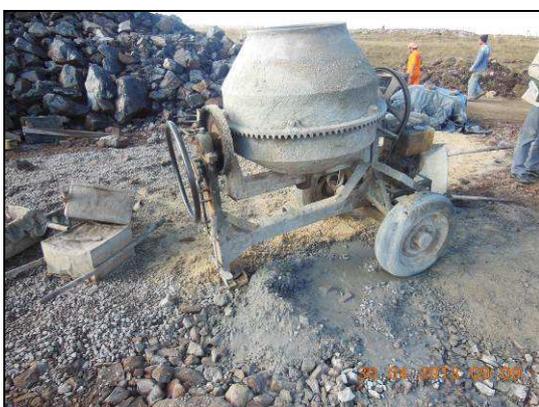

- Colocação dos tubos de concreto no bueiro do Km 54+005 m, com o local devidamente sinalizado para desvio do tráfego.



– Limpeza do trecho do Km 53+600 m, implodido anteriormente.

