



RELATÓRIO TÉCNICO - RT

Superintendência de Assuntos Fundiários e Relocações

Diretoria Socioambiental

Brasília, Distrito Federal

**IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS
REASSENTAMENTOS URBANOS COLETIVOS E
DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DIRETAMENTE
AFETADAS**

UHE BELO MONTE

**EMPRESA
NORTE ENERGIA SA**

NÚMERO/CÓDIGO DO DOCUMENTO

RT_SAF_Nº02-Implantação-Consolidação-RUC-Desocupação-230915

SETEMBRO/2015

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA URBANA E MUDANÇAS PARA OS REASSENTAMENTOS URBANOS COLETIVOS	4
2.1. NEGOCIAÇÕES REALIZADAS	4
2.2. NOVAS OCUPAÇÕES NA ÁREA DE FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO	5
2.3. MUDANÇAS REALIZADAS	5
2.4. VERIFICAÇÃO DA OPÇÃO PELO RUC PEDRAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS JÁ REASSENTADAS	6
4. CONSOLIDAÇÃO DOS REASSENTAMENTOS URBANOS COLETIVOS	11

1. INTRODUÇÃO

Apresenta-se, neste relatório, o *status* das negociações realizadas na Área Diretamente Afetada (ADA) urbana da UHE Belo Monte, bem como as mudanças já realizadas para os cinco reassentamentos urbanos coletivos (RUCs).

As informações apresentadas permitem ainda observar que os referidos RUCs encontram-se consolidados em termos dos serviços sociais prestados à população que neles reside, ainda que alguns equipamentos sociais encontrem-se ainda em implantação.

Com as informações aqui consolidadas, a Norte Energia considera ter comprovado, junto ao Ibama, o cumprimento do seguinte ponto destacado no Despacho 02001.025408/2015-02 DILIC/IBAMA, datado de 18/09/15 e encaminhado à Norte Energia em 22/09/15, como necessários, segundo esse Instituto, para a concessão da Licença de Operação (LO) para a UHE Belo Monte: *“Remanejar a população atingida pela relocação compulsória na ADA, especialmente no que se relaciona à área urbana de Altamira (reassentamento nos 6 RUCs), e os ribeirinhos moradores de ilhas e beiradões do rio Xingu”*, cabendo observar que considerações a respeito dos ribeirinhos também são feitas no âmbito do Relatório “Desocupação de Áreas, Reassentamentos e Acessibilidade no Meio Rural”.

Adicionalmente, este documento apresenta informações atualizadas relativas à desocupação das áreas urbanas, na cidade de Altamira, a serem diretamente afetadas pela formação do reservatório Xingu. Assim, com essas informações, a Norte Energia considera ter comprovado, junto ao Ibama, o cumprimento de outro ponto destacado em seu Despacho 02001.025408/2015-02 DILIC/IBAMA supracitado, no que se refere à área urbana: *“Concluir a execução do projeto de Demolição e Desinfecção de estruturas e edificações”*.

2. NEGOCIAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA URBANA E MUDANÇAS PARA OS REASSENTAMENTOS URBANOS COLETIVOS

2.1. NEGOCIAÇÕES REALIZADAS

Inicialmente apresenta-se, no **Quadro 2-1**, a seguir, o quantitativo de negociações realizadas na Área Diretamente Afetada (ADA) urbana, tendo como referência a data de 22/09/15.

Quadro 2-1 – Número de negociações realizadas. Norte Energia, 22/09/15

Opção	Nº
Reassentamento	3.348
• RUC Jatobá	1.012
• RUC São Joaquim	825
• RUC Laranjeiras	361
• RUC Casa Nova	449
• RUC Água Azul	701
• RUC Pedral (*)	46
Indenização	3.664
Aluguel	337
Recusas	278
RUC Institucional (Igrejas)	12
Comércio	976
Não elegível morador	1.352
TOTAL DE NEGOCIAÇÕES	9.967

Nota: (*) Não está contabilizado no total dos optantes por reassentamento nos RUCs, pois já estão distribuídos, em caráter provisório, nos demais RUCs

2.2. NOVAS OCUPAÇÕES NA ÁREA DE FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Entre os meses de dezembro/2014 a janeiro/2015 foram levantadas 405 novas ocupações em toda a ADA urbana. Destas, 147 ocupações localizavam-se nas cotas 97m e 98m, área de formação do reservatório. Registre-se que todas as áreas já foram negociadas e liberadas.

Após esse primeiro levantamento, constatou-se a existência de 95 (noventa e cinco) ocupações irregulares, construídas após fevereiro/2015, as quais se localizam nos bairros Colinas, Boa Esperança e São Domingos. Deste quantitativo, 38 (trinta e oito) estão em fase de formalização dos contratos e 50 (cinquenta) já tiveram as indenizações pagas e estão em fase de mudança e demolição. Restaram, portanto, apenas sete casos que estão em fase de negociação.

2.3. MUDANÇAS REALIZADAS

Conforme observa-se no **Quadro 2-2**, todos os imóveis devidamente cadastrados que se localizavam na área de formação do reservatório foram liberados. Assim, a área diretamente afetada urbana já se encontra totalmente desocupada até a cota 98,0 m, inclusive.

A diferença numérica entre negociações e mudanças se dá em função de que dentro de um mesmo processo podem ter ocorridos inúmeras negociações que geraram apenas uma mudança. Além disso, tem-se os casos de não elegíveis moradores, que são grupos familiares que não se enquadram no PBA quanto à concessão de benefícios, mas ocupam o imóvel juntamente com a família principal e se mudam juntamente com esta.

Quadro 2-2 – Número de mudanças realizadas. Norte Energia, 22/09/15

Evento	QUANTITATIVO
Reassentamento	3.333
• RUC Jatobá	1.012
• RUC São Joaquim	823
• RUC Laranjeiras	350
• RUC Casa Nova	449
• RUC Água Azul	699
• RUC Pedral (*)	46
Indenização	2.646
Aluguel	288

(*) Famílias relocadas provisoriamente em outro RUC.

2.4. VERIFICAÇÃO DA OPÇÃO PELO RUC PEDRAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS JÁ REASSENTADAS

A Norte Energia iniciou o trabalho de oferta do RUC Pedral para as famílias já reassentadas, sendo o mesmo iniciado pela visita a 209 famílias que indicaram a pesca como atividade, sem especificidade de categoria (profissional, subsistência e lazer). Até o dia 29/09/15 as visitas serão concluídas e os dados consolidados. A partir do dia 28/09/15 terão início as visitas das famílias de índios citadinos reassentados, que atualmente somam 307; entretanto, parte dessas famílias também tem a pesca como atividade e está também contabilizada nas 209 famílias iniciais. Nos **Anexos I e II** apresenta-se os dois modelos de formulários adotados.

3. DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DIRETAMENTE AFETADAS

Desde o início das atividades do Projeto de Demolição e Desinfecção de Estruturas e Edificações, em outubro de 2013, até o dia 22/9/2015 foram executados serviços de demolição e desinfecção em 4.758 propriedades na área urbana da cidade de Altamira a ser diretamente afetada pela formação do reservatório Xingu, fazendo com que a área urbana diretamente afetada já se encontre desocupada, na íntegra, até a cota 98,0 m, inclusive, com conclusão, ali, dos serviços de demolição e desinfecção.

O **Quadro 3-1** apresenta os quantitativos mês a mês das propriedades objeto de serviços de demolição e desinfecção até o dia 22/09/15.

Quadro 3-1 – Quantitativos das Propriedades objeto de Demolição e Desinfecção até 22/09/15

Quantitativos de Propriedades Demolidas Mensalmente	
outubro/13	3
novembro/13	2
dezembro/13	1
janeiro/14	35
fevereiro/14	37
março/14	28
abril/14	42
maio/14	58
junho/14	33
julho/14	65
agosto/14	87
setembro/14	178
outubro/14	180
novembro/14	273
dezembro/14	294
janeiro/15	440
fevereiro/15	273
março/15	386
abril/15	503
maio/15	563
junho/15	386
julho/15	426
agosto/15	330
setembro/15	135
TOTAL	4.758

A **Figura 3-1**, a seguir, mostra a evolução mensal das demolições na zona urbana de Altamira.

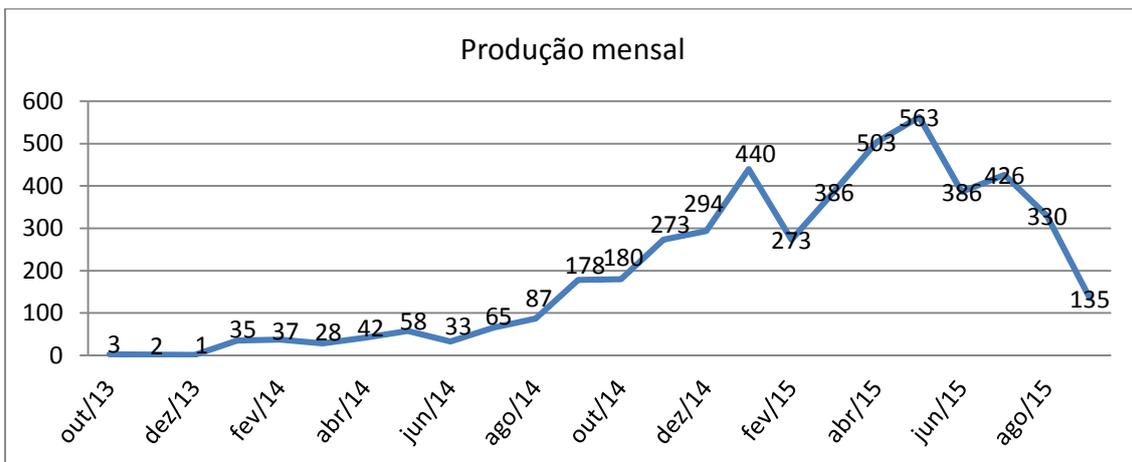


Figura 3-1 – Histograma de desenvolvimento das atividades de demolição na área urbana da cidade de Altamira

O **Quadro 3-2**, por sua vez, apresenta os quantitativos atualizados das propriedades onde se realizou serviços de demolição e desinfecção até 22/09/15 em cada um dos igarapés na zona urbana de Altamira.

Quadro 3-2 – Quantitativos das Propriedades Demolidas até final de Setembro de 2015 nos igarapés

Quantitativos de propriedades demolidas por macro compartimento na área urbana diretamente afetada		
Igarapé Ambé	2.689	56,52%
Igarapé Altamira	1.701	35,75%
Igarapé Panelas	368	7,73%
Total	3.1.1.4.758	3.1.2.100,00%

Já a **Figura 3-2**, abaixo, mostra a porcentagem de propriedades objeto de demolição e desinfecção em cada um dos igarapés na zona urbana de Altamira.

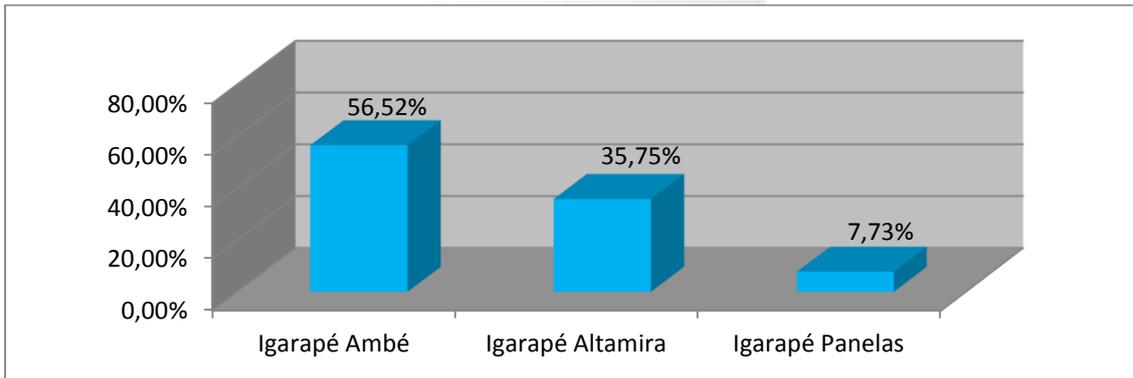


Figura 3-2 – Histograma de desenvolvimento das atividades de demolição nos igarapés

As figuras a seguir mostram as atividades de demolição, transporte e destino final de resíduos realizadas na área urbana durante o mês de setembro de 2015.



Figura 3-3 – Limpeza - Data: 04/8/2015



Figura 3-4 – Demolição - Data: 04/8/2015



Figura 3-5 – Demolição - Data: 06/8/2015



Figura 3-6 – Demolição - Data: 06/8/2015



**Figura 3-7 - Demolição - Data:
06/8/2015**



**Figura 3-8 – Demolição - Data:
18/8/2015**



**Figura 3-9 – Demolição - Data:
18/8/2015**



**Figura 3-10 – Retirada de
pavimentação - Data: 18/8/2015**



**Figura 3-11 – Demolição - Data:
24/8/2015**



**Figura 3-12 – Limpeza - Data:
25/8/2015**



**Figura 3-13 – Limpeza - Data:
25/8/2015**



**Figura 3-14 – Limpeza - Data:
27/8/2015**

4. CONSOLIDAÇÃO DOS REASSENTAMENTOS URBANOS COLETIVOS

As obras dos equipamentos sociais de educação em implantação nos cinco RUCs (uma creche, três berçários e um fraldário; uma EMEF com 12 salas de aula; quatro EMEIF com total de 24 salas de aula de ensino fundamental e 10 salas de aula de ensino infantil; e uma EEEM com seis salas de aulas) têm sua conclusão início do ano letivo de 2016 (vide Figuras 4 - 1 a 4 - 6).

Desde o início do período letivo de 2014, a Norte Energia tem disponibilizado transporte escolar para os estudantes que residem nos novos bairros até que as escolas previstas sejam concluídas, não comprometendo, assim, a frequência dos alunos durante o ano letivo nas escolas onde já estão matriculados. O **Quadro 4- 1** apresenta a quantidade de alunos atendidos de fevereiro de 2014 a agosto de 2015, totalizando 235.377 atendimentos. Ademais, é oportuno lembrar que o cerne desta discussão é a ‘análise de suficiência’, esta, sim, norteadora dos assuntos relativos a equipamentos sociais de educação, cujos resultados vêm sendo rigorosamente acompanhados pelo Ibama, que os tem aprovado. Neste sentido, cabe registrar, por fim, que em reunião realizada em 19 de dezembro de 2014, o Ibama, adotando postura acautelatória, solicitou que o monitoramento da análise de suficiência apresentasse, em caráter excepcional, relatórios trimestrais no 1º semestre de 2015 (a periodicidade de tais relatórios é semestral), o que foi atendido pela Norte Energia, que os protocolou no final dos meses de abril e julho do corrente, não se detectando nenhuma alteração na condição de equilíbrio já indicada.

Quadro 4 – 1 – Quantitativo de alunos atendidos pelo transporte escolar nos RUCs – Fevereiro/14 a Agosto/15

Ordem	Bairro	Período	Total de utilização do transporte de escolar (alunos)
1	Jatobá	Manhã	51.282
2	Jatobá	Tarde	62.366
3	Jatobá	Integral	148
4	Jatobá	Noite	3.313
5	São Joaquim	Manhã	23.602
6	São Joaquim	Tarde	27.252
7	São Joaquim	Integral	530
8	São Joaquim	Noite	1.493

Ordem	Bairro	Período	Total de utilização do transporte de escolar (alunos)
9	Casa Nova	Manhã	14.600
10	Casa Nova	Tarde	18.560
11	Casa Nova	Integral	286
12	Casa Nova	Noite	1.187
13	Água Azul	Manhã	13.637
14	Água Azul	Tarde	13.467
15	Água Azul	Integral	104
16	Água Azul	Noite	1.701
17	Laranjeiras	Manhã	884
18	Laranjeiras	Tarde	883
19	Laranjeiras	Integral	18
20	Laranjeiras	Noite	64
Total geral			235.377 (nota)

Fonte: Norte Energia, 2015.

Nota: Esse quantitativo de alunos transportados corresponde à somatória da utilização do transporte escolar nos três turnos durante todos os semestres.



Figura 4 - 1 - EEEM (6 salas de aula) em construção no RUC Jatobá



Figura 4 - 2 – EMEF (12 salas) em construção no RUC Jatobá



Figura 4 - 3 – EMEIF (10 salas de aula) em construção no RUC Água Azul



Figura 4 - 4 – EMEIF (10 salas de aula) em construção no RUC São Joaquim



Figura 4 - 5 – EMEIF em construção no RUC Casa Nova



Figura 4 - 6 – EMEIF em construção no RUC Laranjeiras

Com relação aos equipamentos de saúde, levantamentos realizados e entendimentos mantidos entre a Norte Energia e Secretaria de Saúde de Altamira definiram a implantação de três Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma para cada um dos bairros Jatobá, São Joaquim e Laranjeiras, todas já concluídas (**vide Figuras 4 - 7 a 4 - 9**). As áreas destinadas às UBS atendem às premissas daquela Secretaria Municipal e da nova portaria do Ministério da Saúde - Portaria nº169/GM/MS – 5 de fevereiro de 2013.



Figura 4 - 7 – UBS implantada no RUC Jatobá



Figura 4 - 8 – UBS implantada no RUC São Joaquim



Figura 4 - 9 – UBS implantada no RUC Laranjeiras

O **Quadro 4 - 2**, a seguir, registra os números de procedimentos de rotina mensal realizados nas UBS dos RUCs nos anos de 2014 e 2015. Registre-se, nesse sentido, que embora a UBS Laranjeira esteja concluída e equipada, ainda não está em funcionamento devido à Secretaria de Saúde de Altamira estar realizando o processo de seleção de profissionais de saúde para a operação da unidade.

Quadro 4 - 2 - Número de Procedimentos de Rotina Mensal Realizados nas UBS dos RUCs nos anos de 2014 e 2015

UBS	2014												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
UBS RUC Jatobá	354	554	630	836	270	618	982	690	1.157	1.902	1.775	984	10.752
UBS RUC São Joaquim					311	520	604	309	732	674	893	612	4.655
UBS Santa Ana (RUC Casa Nova)											180	54	234
UBS RUC Laranjeira													
TOTAL 2014	354	554	630	836	581	1.138	1.586	999	1.889	2.576	2.848	1.650	15.641

UBS	2015												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
UBS RUC Jatobá	1.350	1.266	1.039	1.417	1442	1924	1841	1801					12.080
UBS RUC São Joaquim	554	904	1.477	1.175	1.803	1.584	1.369	717					9.583
UBS Santa Ana (RUC Casa Nova)	13	6	13	234	234	13	165	15					693
UBS RUC Laranjeira													0
TOTAL 2015	1.917	2.176	2.529	2.826	3.479	3.521	3.375	2.533					22.356

TOTAL 2014 e 2015	2.271	2.730	3.159	3.662	4.060	4.659	4.961	3.532	1.889	2.576	2.848	1.650	37.997
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

O Centro Regional de Educação Ambiental da Bacia do Rio Xingu (CREAX) está sendo implantado no RUC São Joaquim, em função de este bairro estar localizado em área mais central da cidade e com grande oferta de acesso. As obras do CREAX seguem conforme cronograma apresentado ao Ibama e estarão concluídas ainda em setembro de 2015. A definição da localização, bem como o programa de necessidades desta edificação, foram desenvolvidos em interface com o Programa de Educação Ambiental de Belo Monte, também integrante do PBA.

Também compõem a malha sociopolítica e operacional do CREAX, as estruturas físicas e atividades desenvolvidas nos três Núcleos de Educação Ambiental do Xingu (NUCLEAX), instalados nos RUCs Jatobá, São Joaquim e Laranjeiras, este último inaugurado em 24/08/2015. Assinala-se que as atividades inerentes ao CREAX e suas estruturas foram iniciadas em 06 de dezembro de 2013, a partir da implantação do NUCLEAX no Jatobá.

Em 02 de junho de 2015, foi criada a associação comunitária CREAX pelos representantes dos coletivos educadores ambientais e das comunidades alcançadas pelo PEA. Já foram realizadas duas assembleias da associação CREAX, que se encontra em fase de capacitação e desenvolvimento de atividades de educomunicação, por meio da implantação e manutenção do blog <https://creaxrede.wordpress.com/>. As atividades relativas ao CREAX totalizaram 1.388 atividades realizadas, com a participação de 5.241 pessoas, até agosto de 2015.

Cumpram também ressaltar que foi feito um acordo entre Norte Energia e prefeitura de Altamira, por meio da Semuts, para reestruturar o sistema assistencial do município. Com isso, ficou decidida a implantação de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atender os novos bairros de Jatobá e Água Azul e bairros próximos; e outro para atender os novos bairros de São Joaquim e Casa Nova e bairros próximos (cada CRAS é planejado para atender a 5 mil famílias). Atualmente, estão em funcionamento duas unidades CRAS; após a reorganização citada, uma unidade será fechada e outra remanejada para as proximidades do RUC Laranjeiras para atender aos moradores do novo bairro e vizinhança.

Além das estruturas físicas dos CRAS (**vide Figuras 4 - 10 a 4 - 12**), a Norte Energia desenvolve em parceria com a Semuts de Altamira, uma série de ações voltadas à assistência social das famílias desde a implantação dos reassentamentos, em janeiro

de 2014. Ao todo, foram realizados 57.592 atendimentos nos RUCs até agosto de 2015, incluindo atendimentos relacionados aos Pontos de Esporte, Cultura e Lazer, cursos de capacitação, Corrida de Rua, Dia das Crianças, cursos SESI Cozinha Brasil, mobilização do Cadastro Único e ações sociais Bairro Cidadão de emissão de documentos, atendimentos de saúde, educação, esportes e lazer.

As ações supramencionadas são complementares às atividades já desenvolvidas pela Norte Energia desde julho de 2012, no âmbito dos convênios para atendimento social e psicológico da população atingida firmados com as Prefeituras de Altamira e Vitória do Xingu, bem como suporte técnico e logístico aos demais municípios da Área de Influência Direta e que receberam famílias remanejadas (Anapu, Brasil Novo, Medicilândia e Senador José Porfírio). Essas atividades contemplam o acompanhamento social do universo de famílias cadastradas e já resultaram em 5.223 atendimentos com visitas domiciliares e 2.278 encaminhamentos à rede socioassistencial em saúde, educação, benefícios eventuais, Cadastro Único, Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família, dentre outros.

Com relação aos espaços de lazer e quadras poliesportivas, foram inauguradas, e estão em pleno uso pela população para atividades desportivas e sociais, as quadras do Jatobá, São Joaquim e Casa Nova. As obras das quadras poliesportivas dos RUCs Água Azul e Laranjeiras serão entregues às comunidades até dezembro de 2015. (**Vide Figuras 4 - 13 a 4- 15).**)



Figura 4 - 10 – CREAX em fase final de implantação no RUC São Joaquim



Figura 4 - 11 – CRAS em implantação no RUC Jatobá



Figura 4 - 12 – CRAS em implantação no RUC São Joaquim



Figura 4 - 13 – Quadra poliesportiva construída no RUC Jatobá



Figura 4 - 14 – Quadra poliesportiva construída no RUC São Joaquim



Figura 4 - 15 – Quadra poliesportiva construída no RUC Casa Nova

Por fim, conforme informado ao Ibama, será implantado um total de 10 (dez) acessos viários, sendo a Norte Energia responsável pela execução dos acessos nos RUCs Jatobá e Laranjeiras, a saber: acesso ao Loteamento São Francisco; acessos à Rua do Sanatório e à Estrada Cama de Vara, respectivamente.

No que diz respeito aos acessos dos RUCs São Joaquim e Casa Nova, estes serão executados no âmbito do Termo de Cooperação Técnico- Financeiro (DS-C 0137/2015), firmado em janeiro de 2015 entre a Prefeitura Municipal de Altamira e a Norte Energia, cujo objetivo é prestar auxílio técnico e financeiro à municipalidade para recuperação das ruas e avenidas dos acessos a esses reassentamentos. O Termo inclui os seguintes acessos: RUC Casa Nova, acesso ao bairro Santa Ana e acesso à Estrada Cachoeirinha; e RUC São Joaquim, Ligação das Ruas 4, 8 e 10 com a Avenida da Transposição.

Para o acesso ao RUC Água Azul será utilizada a ligação com o reassentamento Jatobá e, para este último, será usado o acesso pela Av. Bom Jesus. Ambos encontram-se concluídos, uma vez que optou-se pela consolidação dos acessos já existentes.

Cabe ressaltar que as obras citadas nos itens anteriores serão de melhoria das condições atuais das vias, tais como pavimentação, drenagem, iluminação e sinalização.

Pelo exposto, pode-se resumir a situação dos acessos aos reassentamentos urbanos coletivos da seguinte forma (**vide Figuras 4 - 16 a 4 - 28**):

RUC Jatobá

- Acesso à Avenida Bom Jesus – Concluído
- Acesso ao Loteamento São Francisco – Os serviços de implantação do acesso ao RUC Jatobá – via Bairro São Francisco, encontram-se em execução, atualmente na fase de preparação da sub-base e base, com nivelamento de greide e conformação do passeio lateral, com previsão de conclusão das obras em 30 de setembro de 2015 (**vide Figuras 4 – 16 a 4 - 19**)

RUC Água Azul

- Acesso de interligação RUC Jatobá ao RUC Água Azul - Concluído

RUC Casa Nova - Termo de Cooperação Técnico-Financeiro com a Prefeitura de Altamira

- Acesso ao Bairro Santa Ana
- Acesso à Estrada Cachoeirinha

RUC São Joaquim – Termo de Cooperação Técnico-Financeiro com a Prefeitura de Altamira

- Acesso Rua 04 à Avenida da Transposição
- Acesso Rua 08 à Avenida da Transposição
- Acesso Rua 10 à Avenida da Transposição

RUC Laranjeiras

- Acesso à Rua do Sanatório – Os serviços de implantação do acesso ao RUC Laranjeiras, via Rua do Sanatório, estão em andamento, com previsão de conclusão em 15 novembro de 2015. A supressão vegetal e a demolição das casas interferidas já se encontram em execução. O projeto de relocação da rede de energia elétrica para o novo eixo está concluído (**vide Figuras 4 – 26 a 4- 30**)
- Acesso à Estrada Cama de Vara – Os serviços de implantação do acesso ao RUC Laranjeiras, via Cama de Vara, estão em andamento, já estando em execução os serviços de supressão vegetal, com previsão de conclusão do acesso em 15 novembro de 2015 (**vide Figuras 4- 20 a 4 – 25**)



Figura 4 - 16 – Acesso ao RUC Jatobá via Bairro São Francisco



Figura 4 - 17 – Acesso ao RUC Jatobá via Bairro São Francisco



Figura 4 - 18 – Acesso ao RUC Jatobá via Bairro São Francisco



Figura 4 - 19 – Acesso ao RUC Jatobá via Bairro São Francisco



Figura 4 - 20 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Estrada Cama de Vara



Figura 4 - 21 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Estrada Cama de Vara



Figura 4 - 22 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Estrada Cama de Vara



Figura 4 - 23 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Estrada Cama de Vara



Figura 4 - 24 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Estrada Cama de Vara



Figura 4 - 25 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Estrada Cama de Vara



Figura 4 - 26 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Rua do Sanatório



Figura 4 - 27 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Rua do Sanatório



Figura 4 - 28 – Acesso ao RUC Laranjeiras via Rua do Sanatório



Figura 4 - 29 – Serviços de demolição de casas no acesso ao RUC Laranjeiras via Rua do Sanatório



Figura 4 - 30 – Serviços de demolição de casas no acesso ao RUC Laranjeiras via Rua do Sanatório

**ANEXO I - QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO JUNTO
ÀS FAMÍLIAS JÁ REASSENTADAS QUE TÊM A PESCA
COMO ATIVIDADE PARA VERIFICAÇÃO DE SEU
INTERESSE PELO REASSENTAMENTO DEFINITIVO NO
RUC PEDRAL**

**ANEXO II - QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO JUNTO
ÀS FAMÍLIAS DE ÍNDIOS CIDADINOS JÁ
REASSENTADAS PARA VERIFICAÇÃO DE SEU
INTERESSE PELO REASSENTAMENTO DEFINITIVO NO
RUC PEDRAL**

**ANEXO I - QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO JUNTO
ÀS FAMÍLIAS JÁ REASSENTADAS QUE TÊM A PESCA
COMO ATIVIDADE PARA VERIFICAÇÃO DE SEU
INTERESSE PELO REASSENTAMENTO DEFINITIVO NO
RUC PEDRAL**

RUC PEDRAL – LEVANTAMENTO DE PÚBLICO INTERESSADO

MORADOR RUC

PROCESSO:

NOME DO MORADOR:

PROFISSÃO ATUAL:

LOCAL DE TRABALHO:

CONTATO: () -

ENDEREÇO ATUAL	SETOR	QUADRA	RUA	Nº Casa

ANTES DA NOVA MORADIA NO RUC, QUAL RELAÇÃO O(A) SR(A). MANTINHA COM O RIO XINGU?

ALGUÉM DA CASA É PESCADOR?	<input type="checkbox"/> SIM	QUEM?:
	<input type="checkbox"/> NÃO	

TIPO DE PESCA	<input type="checkbox"/> SUBSISTÊNCIA
	<input type="checkbox"/> COMERCIAL
	<input type="checkbox"/> LAZER

É INSCRITO NO MINISTÉRIO DA PESCA? SIM NÃO

RECEBE AUXILIO-DEFESO? SIM NÃO

REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE (RGP) Nº:

SENDO O RUC PEDRAL UM BAIRRO ÀS MARGENS DO RIO XINGÚ, O(A) SR(A) QUER MUDAR PARA ESTE NOVO BAIRRO QUANDO ESTIVER CONCLUÍDO?	<input type="checkbox"/> SIM
	<input type="checkbox"/> NÃO

Altamira, de setembro de 2015

ASSINATURA

**ANEXO II - QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO JUNTO
ÀS FAMÍLIAS DE ÍNDIOS CIDADINOS JÁ
REASSENTADAS PARA VERIFICAÇÃO DE SEU
INTERESSE PELO REASSENTAMENTO DEFINITIVO NO
RUC PEDRAL**

RUC PEDRAL – LEVANTAMENTO DE PÚBLICO INTERESSADO

MORADOR RUC

PROCESSO:

NOME DO MORADOR:

PROFISSÃO ATUAL:

LOCAL DE TRABALHO:

CONTATO: () -

ENDEREÇO ATUAL	SETOR	QUADRA	RUA	Nº Casa

ANTES DA NOVA MORADIA NO RUC, QUAL RELAÇÃO O(A) SR(A). MANTINHA COM O RIO XINGU?

SENDO O RUC PEDRAL UM BAIRRO ÀS MARGENS DO RIO XINGÚ, O(A) SR(A) QUER MUDAR PARA ESTE NOVO BAIRRO QUANDO ESTIVER CONCLUÍDO?

SIM

NÃO

Altamira, de setembro de 2015

ASSINATURA
