

Fichas do Controle Ambiental

TRANSNORDESTINA
Logística S.A.

ARCADIS TETRAPLAN 

Monitoramento da Notificação

Trecho: SPS Lote: 03 Município / Estado: Custódia/PE

Notificação Nº 01 Mês 11

Data do cadastro: 17/11/2010 Data do monitoramento: 17/12/2010

Monitoramento nº 1

Coordenada GPS:

N.º da Estaca: 30.249

Técnico de campo: Damião Cristovão Ferreira Alves

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área

Em vistoria as atividades de supressão vegetal no lote 03 cumprindo os Programas de Supressão Vegetal e Afugentamento e Salvamento da Fauna descrito no PBA, a equipe da ARCADIS Tetraplan, identificou uma não conformidades nas atividades de supressão vegetal para a construção de cerca de faixa de domínio, foi registrado um trator de esteira em atividade sem equipe de afugentamento, supressão de árvores com mais 0,15 cm de diâmetros e obstrução dos pontos caracterizados como APPs.

Classificação (vegetação)

Situação da Melhoria:

- Não pode haver supressão vegetal sem a equipe de afugentamento da fauna;
- Informar com antecedência a localização das frentes de Supressão Vegetal, para a mobilização das equipes de afugentamento;
- Suprimir com trator de esteira apenas vegetação com diâmetro inferior a 0,15 cm e com Motosserra as acima de 0,15 cm de diâmetros;
- Minimizar os impactos na supressão vegetal das cercas em áreas de APPs, suprimindo apenas o necessário.

Foto



Verificação (1º)

Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

O problema foi solucionado, não esta ocorrendo supressão de arvores com diâmetro superior a 0,15 cm e a equipe da ARCADIS Tetraplan esta sendo informada com antecedência onde será a atividade de supressão vegetal.

Cumprimento do prazo da última verificação: OK Atraso de ___ dias

Prazo para reavaliação: 1 dia uma semana 2 semanas 3 semanas 1 mês

Assinaturas:

Engenheiro Ambiental:



Gestor:



Monitoramento da Oportunidade de Melhoria

Trecho: SPS Lote: 03 Município / Estado: Custódia/PE

Melhoria Nº 01 Mês 11

Data do cadastro: 17/11/2010

Data do monitoramento: 17/12/2010

Monitoramento nº 1

Coordenada GPS: S 0600490 W 9110901

N.º da Estaca: 30.249

Técnico de campo: Damião Cristovão Ferreira Alves

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área

Em vistoria no lote 03 foi identificado a presença de funcionários realizando limpeza de caminhões betoneiras na central de concreto ocasionando o desperdício de água e contaminação do solo com resíduos de cimento.

Classificação (*recurso hídrico; efluente líquido*)

Situação da Melhoria:

- Foi registrado lavagem de caminhões betoneiras, ocasionando desperdício de água e contaminação do solo por efluentes líquido.

Foto



Verificação (1ª)

Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

O problema foi solucionado, água esta sendo coletada e posteriormente reutilizada.

Foto



Cumprimento do prazo da última verificação: (X) OK () Atraso de ___ dias

Prazo para reavaliação: () 1 dia () uma semana () 2 semanas () 3 semanas () 1 mês

Assinaturas:

Engenheiro Ambiental:



Gestor:



Identificação de Melhoria

Trecho: SPS

Lote: 03

Município / Estado: Custódia - PE

Identificação de Melhoria Nº 02

Data: 20 /12/ 2010

Coordenada GPS: S 0647362 W 9099532

Estacas Nº: 32.809, 32.804 e 32.703

Técnico de Campo: Damião Cristovão Ferreira Alves

Responsável (engenheiro): Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:

Em vistoria no lote 03 foi identificado que ao término das construções das Obras de Artes Correntes (OAC's) não estão sendo removidos os materiais utilizados e também os resíduos sólidos existentes (embalagem vazia de cimento, sobra de madeira, etc.).

Classificação: Resíduo sólido.

Descrição da Situação:

Foi registrado que ao término das construções das Obras Artes Correntes (OAC's) que os materiais utilizados e resíduos sólidos existentes não estão sendo recolhidos.

Foto



Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

Recomendações (medidas a serem implantadas):

- Recolher todos os resíduos gerados pelas obras;
- Gerar o mínimo possível de resíduos e recolher o resíduo gerado na construção ao término da obra;

Resposta:

* As identificações de materiais apontadas nessa notificação trata-se de situações pontuais.

* Os resíduos serão recolhidos e acondicionados em local identificado

Prazo para correção: () 1 dia () uma semana () 2 semanas () 3 semanas (X) 1 mês

Assinaturas:

Engenheiro Ambiental:



Gestor:



Notificação

Trecho: SPS

Lote: 03

Município / Estado: Custódia - PE

Notificação Nº 03 Mês 12

Data do cadastro: 20 / 12 / 2010

Data do monitoramento: 20 / 01 / 2010

Monitoramento nº 1

Coordenada GPS: S 063705 W 9105410

N.º da Estaca: Canteiro de Obra Avançado Central de Coleta Seletiva.

Técnico de campo: Damião Cristóvão Ferreira Alves

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:

Em vistoria no canteiro de obra avançado foi identificado na instalação da central de reciclagem, resíduos sólidos e efluentes acondicionados de forma inadequada.

Classificação:

Situação da Melhoria:

Resíduos sólidos e efluentes acondicionado de forma inadequada. Expostos ao tempo e em contato direto com o solo.

Foto



Notificação

Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

Aviso e Recomendações (medidas a serem implantadas):

- Armazenar os resíduos e efluentes em local adequado sem contato com o solo.

Resposta:

Medida adotadas → Ampliação da Central de Estocagem Temporária de Resíduos.

Medida Emergencial → Transferência dos resíduos para área coberta/piso impermeabilizado da oficina mecânica

Cumprimento do prazo da notificação: () 1 dia () uma semana () 2 semanas 5 semanas

Assinaturas:

Engenheiro Ambiental:



Gestor:



Notificação

Trecho: SPS

Lote: 03

Municípios / Estado: Custódia - PE

Notificação Nº 02 Mês 12

Data do cadastro: 20 / 12 / 2010

Data do monitoramento: 20 / 01 / 2010

Monitoramento nº 1

Coordenada GPS: S 0638116 W 9103721

N.º da Estaca: 32.200

Técnico de campo: Damião Cristovão Ferreira Alves

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:

Na instalação de apoio da equipe da terraplanagem que fica localizado próximo a estaca 32.200 da CNO foi identificado acúmulos de pneus acondicionados de forma incorreta ao ar livre com água empoçada..

Classificação: *Higiene/ Saude*

Situação da Melhoria:

Pneus acondicionados de forma incorreta ao ar livre com água empoçada, dando condições a procriação do mosquito transmissor (Aedis Egips).

Foto



Notificação

Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

Aviso e Recomendações (medidas a serem implantadas):

- Retirar a água dos pneus e armazenar-los de forma que não juntem água.

Resposta:

*Os pneus já foram cobertos por lona.
A água foi jogada fora dos pneus.
Data: 20/10/2020*

Cumprimento do prazo da notificação: () 1 dia () uma semana () 2 semanas 3 semanas

Assinaturas: 1

Engenheiro Ambiental:



Gestor:



Notificação

Trecho: SPS

Lote: 03

Município / Estado: Custódia - PE

Notificação Nº 04 Mês 12

Data do cadastro: 20 / 12 / 2010

Data do monitoramento: 20 / 01 / 2010

Monitoramento nº 1

Coordenada GPS: S 0605968 W 9110216

N.º da Estaca: 30.526

Técnico de campo: Damião Cristovão Ferreira Alves

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:


Em vistoria na construção da OAE na ponte do Riacho Bom Jesus, observou-se APP obstruída.

Classificação: *Higiene/ Saude*

Situação da Melhoria:

APP obstruída com aterro e pedras, impedindo a passagem da fauna aquática e a água escoando de forma deficiente, fazendo com que a mesma fique retida.

Foto

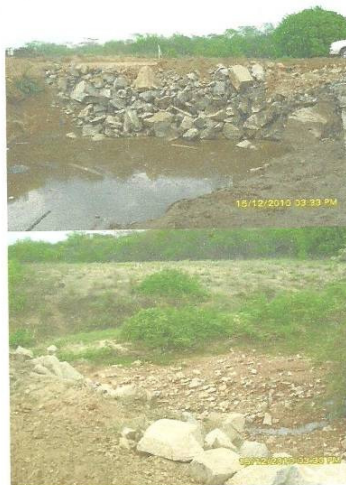

Notificação

Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

Aviso e Recomendações (medidas a serem implantadas):

- Desobstruir APP de forma que não prejudique a passagem da água e da fauna aquática.

Resposta:

→ Em virtude de segurança o trecho da obra de serviço foi alargado obstruindo momentaneamente a APP.
→ Hoje a APP já se encontra tra desobstruída.

Cumprimento do prazo da notificação: () 1 dia () uma semana () 2 semanas ()

Assinaturas:

Engenheiro Ambiental:



Gestor:



Conformidade

Trecho: SPS Lote: 03 Município / Estado: Custódia/PE

Conformidade N° 01

Data: 20 / 12 / 2010

Coordenada GPS: S 0600490 W 9110901

N.º da Estaca: 30.249

Técnico de Campo: Damião Cristovão Ferreira Alves

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:

Foi identificado que na central de concreto a água esta sendo utilizada de forma consciente e não esta havendo desperdício.

Classificação (*recurso hídrico*)

Descrição da Conformidade:

Foto

Caneleta com receptor d'água feita por três manilhas para receber a água e a mesma esta sendo captada e posteriormente reutilizada em umectação.



Assinaturas:

Gestor:

Identificação de Melhoria

Trecho: SPS

Lote: 04

Município / Estado: Sertânia - PE

Identificação de Melhoria Nº xx

Data: 20 / 12 / 2010

Coordenada GPS: S0667206 W9093991

N.º da Estaca: 40.896

Técnico de Campo: José Renilson dos Santos

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:

No canteiro provisório da estaca 40.896 observou-se coletores de óleo em local inadequado.

Classificação (efluente líquido)

Descrição da Situação:

- Coletores de óleo expostos ao tempo e sobre madeirite sem qualquer tipo de contenção.

Foto



Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

Recomendações (medidas a serem implantadas):

- Colocar uma caixa de contenção para evitar o contato do efluente com o solo e providenciar uma cobertura para que o mesmo não fique exposto ao tempo.

Resposta:

Os coletores de óleo expostos ao tempo serão recolhidos. Ficará no local apenas os coletores de óleo sobre caixa de contenção.

Prazo para correção: () 1 dia () uma semana () 2 semanas (X) 3 semanas () 1 mês

Assinaturas:
Engenheiro Ambiental:

Gestor:

Identificação de Melhoria

Trecho: SPS Lote: 04 Municípios / Estado: Sertânia/PE

Identificação de Melhoria N° 01

Data: 20/12/2010

Coordenada GPS: S 0668506 W 9091797

N.º da Estaca: 41.020

Técnico de Campo: José Renilson dos Santos

Responsável: Douglas Henrique Jesué S. Sá

Descrição da Área:

Em vistoria no lote 04, foi identificadas instalações de apoio com refeitório provisório funcionando sem adequação de higiene. Observou-se colocação parcial de telas de proteção contra a presença de insetos e com isso aumento do risco de contaminação.

Classificação: Higiene/Saúde.

Descrição da Situação:

- Foi identificado refeitório com instalação parcial de telas, onde o mesmo deveria ser 100% telado.

Foto



Nome do Responsável: João Paulo Cerqueira
Cargo: Gestor Ambiental

Recomendações (medidas a serem implantadas):

- Os refeitórios devem ser projetados com instalações adequadas de modo a permitir condições satisfatórias de higiene e limpeza, para que os trabalhadores possam fazer suas refeições em ambientes limpos, arejados e protegidos contra insetos. Para isso deve ser utilizado telas ou outro dispositivo de proteção, que não permita a entrada de insetos.

Resposta:

Estaremos colocando
tela em todos
refeitórios dentro
do prazo estabelecido.
João Paulo

Prazo para correção: () 1 dia () uma semana () 2 semanas () 3 semanas 1 mês

Assinaturas:

Engenheiro Ambiental:

Gestor:

