UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação
1	**OBRAS LI PBA da UHE SANTO ANTONIO**	**851 dias**	**02/03/09**	**30/06/11**		**64%**	
2							
3	**OBRAS para LI e PBA**	**851 dias**	**02/03/09**	**30/06/11**		**64%**	
4							
5	**CETAS PROVISÓRIO**	**5 dias**	**13/04/09**	**17/04/09**		**100%**	
7							
8	**CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - UNIR**	**240 dias**	**11/03/09**	**05/11/09**		**100%**	
16							
17	KARITIANA-Escola/Posto Saúde/2Alojamentos/1almoxar/reforma centro conv.	321 dias	30/06/09	16/05/10		75%	
18	**OBRAS ESCOLA/OS/ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO/CENTRO CONVIV.**	**275 dias**	**30/06/09**	**16/05/10**		**71%**	
19	Projeto executivo	82 dias	30/06/09	19/09/09		100%	Acyr
20	Processo de consulta e contratação	37 dias	12/10/09	17/11/09	19	100%	Pascoal
21	Construção das obras	180 dias	18/11/09	16/05/10	20	52%	Pascoal
22	**PONTES DE ACESSO**	**42 dias**	**10/01/10**	**20/02/10**		**100%**	
23	Processo de consulta e contratação	5 dias	10/01/10	15/01/10		100%	Pascoal
24	Execução das 4 pontes	36 dias	16/01/10	20/02/10	23	100%	Pascoal
25							
26	ESTRADA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ (alexandre vai itemizar as atividades)	**515 dias**	**01/02/10**	**30/06/11**		**0%**	
27	Definição e elaboração de projetos	242 dias	01/02/10	30/09/10		0%	Pascoal
28	Elaoração do processo de consulta	92 dias	01/10/10	31/12/10	27	0%	Pascoal
29	Construção das obras	150 dias	01/02/11	30/06/11	28TI+31 dias	0%	Pascoal
30							
31	**4 LINIGRAFOS**	**84 dias**	**01/03/10**	**23/05/10**		**0%**	
32	**1 Canteiro de obras**	**67 dias**	**01/03/10**	**06/05/10**		**0%**	
33	Definição do local e equipamento	27 dias	01/03/10	31/03/10		0%	Delfino
34	Compra regua	20 dias	01/04/10	20/04/10	33	0%	Delfino
35	Instalação	16 dias	21/04/10	06/05/10	34	0%	Pascoal
36	**3 Jusante da Barragem**	**84 dias**	**01/03/10**	**23/05/10**		**0%**	
37	Definição dos locais	31 dias	01/03/10	31/03/10		0%	Delfino
38	Compra regua	20 dias	01/04/10	23/04/10	34II	0%	Delfino
39	Instalações	30 dias	24/04/10	23/05/10	38	0%	Pascoal
40	**ESTAÇÃO METEOROLÓGICA**	**66 dias**	**01/03/10**	**06/05/10**		**0%**	
41	Definição dos locais e equipamento	31 dias	01/03/10	31/03/10		0%	Delfino
42	Compra do Equipamento	30 dias	01/04/10	05/05/10	41	0%	Delfino
43	Instalações	30 dias	01/04/10	30/04/10	37	0%	Pascoal
44							
45	**ABATEDOURO DE JACARÉS**	**142 dias**	**02/03/09**	**21/07/09**		**100%**	
51							
52	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GRPU**	**133 dias**	**20/03/09**	**30/07/09**		**100%**	
54							
55	**GALPÃO GARAGEM PARA O BATALHÃO POLICIAL AMBIENTAL**	**81 dias**	**20/03/09**	**08/06/09**		**100%**	
58							
59	**FLUTUANTES - 2 unidades - Leonel Gastura / Agrovila**	**131 dias**	**28/04/09**	**05/09/09**		**100%**	
63							
64	**REFORMA DO CEMITÉRIO DA VILA SANTO ANTONIO**	**90 dias**	**22/06/09**	**19/09/09**		**100%**	
66							
67	**REVITALIZAÇÃO DA VILA SANTO ANTONIO**	**90 dias**	**22/06/09**	**19/09/09**		**100%**	
69							
70	**CICLOVIA Vila Santo Antonio**	**129 dias**	**20/03/09**	**26/07/09**		**100%**	
73							
74	**SEMEPE = CALÇAMENTO E REFORMA**	**82 dias**	**18/01/10**	**09/04/10**		**27%**	
75	Processo de consulta e contratação	22 dias	18/01/10	08/02/10		100%	Pascoal
76	Execução do calçamento e reforma da SEMEPE	60 dias	09/02/10	09/04/10	75	0%	Pascoal

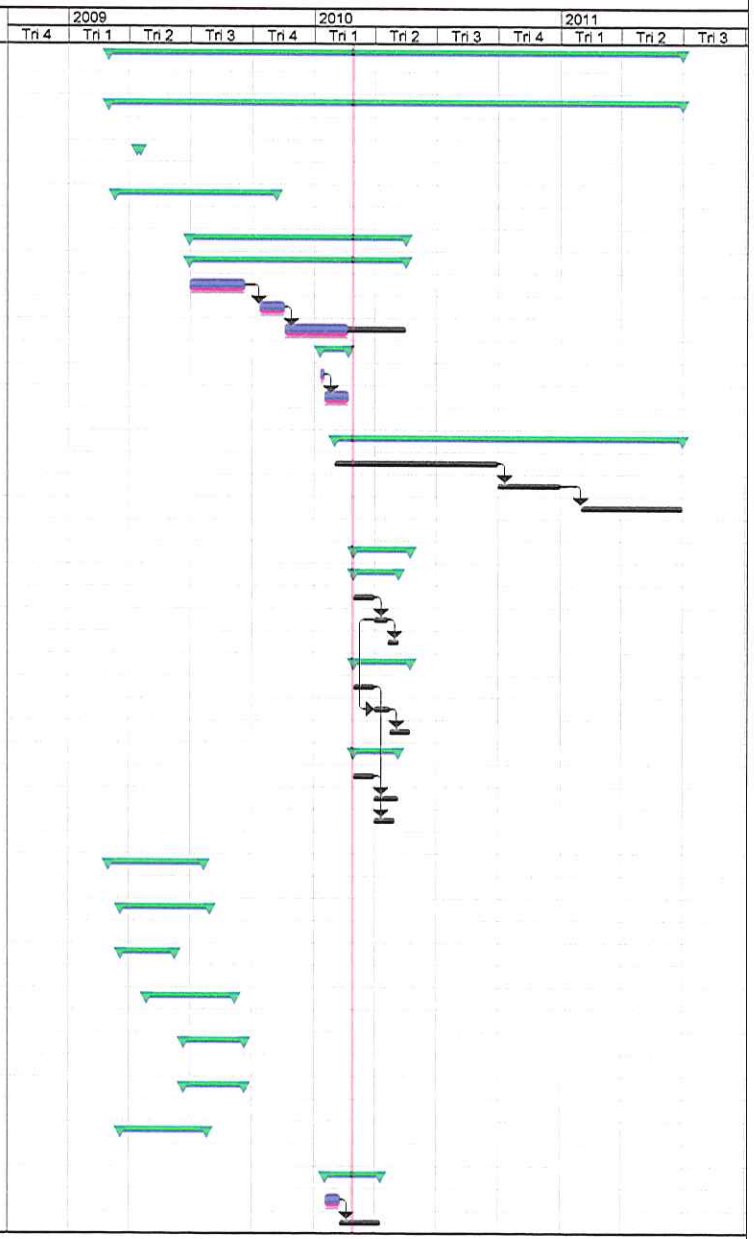

Projeto: Obras Complementares rev0
Data: 26/02/10

Tarefa — Andamento — Resumo — Tarefas externas — Data limite
Divisão — Etapa — Resumo do projeto — Etapa externa
