UHE SANTO ANTONIO ENERGIA - CRONOGRAMA OBRAS COMPLEMENTARES PARA O ESTADO DE RONDÔNIA

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Pred.	%exec.	Observação
1	**OBRAS PARA O ESTADO DE RONDONIA**	**716 dias**	**28/02/09**	**13/06/11**		**24%**	
2							
3	**HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL**	**487,7 dias**	**28/02/09**	**30/06/10**		**82%**	
4	Porcesso de consulta e contratação	85 dias	28/02/09	30/05/09		100%	Pascoal
5	Construção da obra	404 dias	28/04/09	30/06/10	4	78%	Pascoal
6	**FHEMERON**	**141 dias**	**01/02/10**	**21/06/10**		**15%**	
7	Processo de consulta e contratação + OS	21 dias	01/02/10	21/02/10		100%	Pascoal
8	Reforma e ampliação do prédio existente	120 dias	22/02/10	21/06/10	7	0%	Pascoal
9							
10	**HOSPITAL DE BASE DE PORTO VELHO**	**823 dias**	**13/03/09**	**13/06/11**		**15%**	
11	**OBRAS DA 1ª ETAPA**	**705 dias**	**13/03/09**	**13/06/11**		**41%**	
12	Projeto executivo da reforma e ampliação	120 dias	13/03/09	10/07/09		100%	DEOSP
13	Processo de consulta e contratação ETAPA 1	55 dias	01/07/09	21/09/09		100%	Pascoal
14	Reforma e ampliação da obra ETAPA 1	630 dias	22/09/09	13/06/11	13	24%	Pascoal
15	**ETE**	**515 dias**	**30/06/09**	**26/11/10**		**33%**	
16	Projeto executivo da reforma e ampliação - DEOSP	120 dias	30/06/09	30/01/10		90%	DEOSP
17	Compra do equipamento	30 dias	01/05/10	30/05/10		0%	Pascoal
18	Processo de consulta e contratação da civil + OS	60 dias	31/05/10	29/07/10	17	0%	Pascoal
19	Construção da obra	120 dias	30/07/10	26/11/10	18	0%	Pascoal
20	**REDE DE GASES**	**464 dias**	**01/02/10**	**10/05/11**		**0%**	
21	Projeto da rede de gases (FALTA ENFERMARIA)	48 dias	01/02/10	20/03/10		0%	Pascoal
22	Processo de consulta e contratação + OS	41 dias	21/03/10	30/04/10	21	0%	Pascoal
23	Execução da rede de gases	375 dias	01/05/10	10/05/11	22	0%	Pascoal
24	**CLIMATIZAÇÃO**	**455 dias**	**31/01/10**	**30/04/11**		**0%**	
25	Elaboração do projeto executivo (FALTA ENFERMARIA/ONCOLOGIA)	45 dias	31/01/10	16/03/10	16	0%	Pascoal
26	Processo de consulta e contratação	40 dias	17/03/10	25/04/10	25	0%	Pascoal
27	Execução da climatização	370 dias	26/04/10	30/04/11	26	0%	Pascoal
28	**PREDIO DA ENFERMARIA**	**371 dias**	**25/01/10**	**30/01/11**		**5%**	
29	Sondagem	20 dias	25/01/10	13/02/10		100%	Joran
30	Projeto executivos	15 dias	19/02/10	05/03/10	29	0%	Pascoal
31	Processo de consulta contratação + OS	31 dias	06/03/10	05/04/10	30	0%	Pascoal
32	Execução da obra da enfermaria	300 dias	06/04/10	30/01/11	31	0%	Pascoal
33	**HOSPITAL INFANTIL**	**395 dias**	**01/01/10**	**06/04/11**		**15%**	
34	Projeto Executivo	30 dias	01/01/10	04/02/10		100%	DEOSP
35	Processo de consulta e contratação + OS	30 dias	25/01/10	28/02/10		100%	Pascoal
36	Construção do Hospital Infantil	345 dias	01/03/10	06/04/11	35	0%	Pascoal
37	**CLINICA MÉDICA**	**297 dias**	**01/02/10**	**12/01/11**		**0%**	
38	Elaboração do projeto executivo	1 dia	01/02/10	01/02/10		100%	DEOSP
39	Processo de consulta e contratação + OS	45 dias	26/04/10	16/06/10	26	0%	Pascoal
40	Execução da climatização	180 dias	17/06/10	12/01/11	39	0%	Pascoal
41	**ONCOLOGIA**	**331 dias**	**27/01/10**	**16/02/11**		**0%**	
42	Elaboração do projeto executivo	28 dias	27/01/10	28/02/10		0%	DEOSP
43	Processo de consulta e contratação + OS	45 dias	26/04/10	16/06/10	26	0%	Pascoal
44	Execução da climatização	210 dias	17/06/10	16/02/11	43	0%	Pascoal

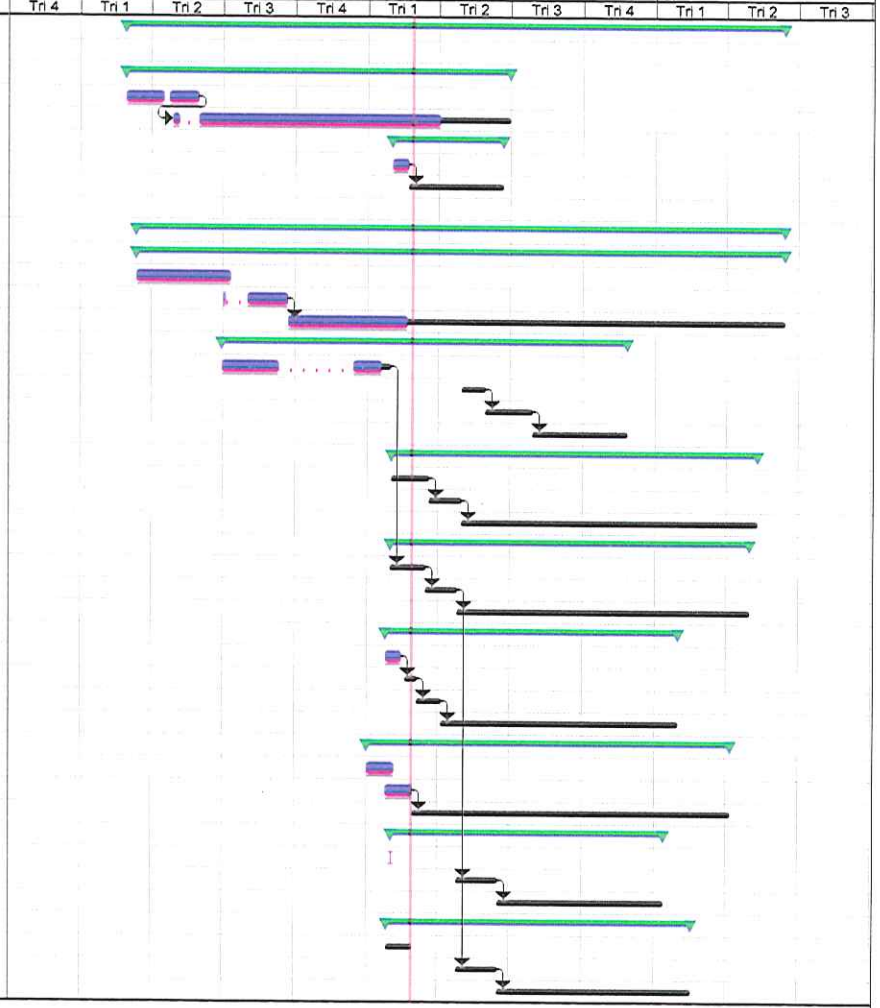

Projeto: Obras Complementares rev0
Data: 26/02/10

Tarefa — Andamento — Resumo — Tarefas externas — Data limite
Divisão — Etapa — Resumo do projeto — Etapa externa
