consórcio
ARCADIS LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(Prazos Contratuais)

Id	Nome da tarefa	Percentual Executado
1	**PISF**	**61,70%**
2	**GERENCIAMENTO**	**86,10%**
3	**Gerenciamento e Apoio Técnico I**	100%
4	**Gerenciamento e Apoio Técnico II**	72,20%
5	**PROJETOS**	**89,74%**
6	**EIXO NORTE**	**85,54%**
7	**Projeto Básico das Estradas de Acesso às EB's**	100,00%
8	**Projetos Executivos - Lote A (1, 2, 3, 4, 8)**	99,40%
9	**Projetos Executivos - Lote B (5, 6, 7, 14)**	98,20%
10	**Projeto Executivo - Lote F (Trecho III e IV)**	13,90%
11	**Projeto Básico - Trecho VI (Entremontes)**	61,30%
12	**EIXO LESTE**	**94,12%**
13	**Projeto Executivo - Lote C (9, 10)**	99,34%
14	**Projeto Executivo - Lote D (11, 12, 13)**	95,32%
15	**Projeto Executivo - Lote E (15, 16, 17, 18)**	90,42%
16	**SUPERVISÃO**	**74,60%**
17	**EIXO NORTE**	**69,30%**
18	**Supervisão - Lote 01**	88,70%
19	**Supervisão - Lote 02**	72,00%
20	**Supervisão - Lote 03**	78,40%
21	**Supervisão - Lote 04**	64,30%
22	**Supervisão - Lote 05**	0,00%
23	**Supervisão - Lote 06**	84,70%
24	**Supervisão - Lote 07**	59,80%
25	**Supervisão - Lote 08**	16,68%
26	**Supervisão - Lote 14**	57,80%
27	**EIXO LESTE**	**92,95%**
28	**Supervisão - Lote 09**	99,40%
29	**Supervisão - Lote 10**	91,50%
30	**Supervisão - Lote 11**	98,10%
31	**Supervisão - Lote 12**	84,10%
32	**Supervisão - Lote 13**	98,70%
33	**Publicação do Edital Supervisão - Trecho I**	0,00%
34	**Publicação do Edital Supervisão - Trecho II**	0,00%
35	**Publicação do Edital Supervisão - Trecho V**	0,00%
36	**OBRAS**	**56,10%**
37	**EIXO NORTE**	**52,80%**
38	**EXÉRCITO**	100%
51	**Obras - Lote 01**	73,80%
81	**Obras - Lote 02**	50,60%
117	**Obras - Lote 03**	48,27%
134	**Obras - Lote 04**	12,90%
158	**Obras - Lote 05 - Publicado resultado julgamento concorrência**	0,00%

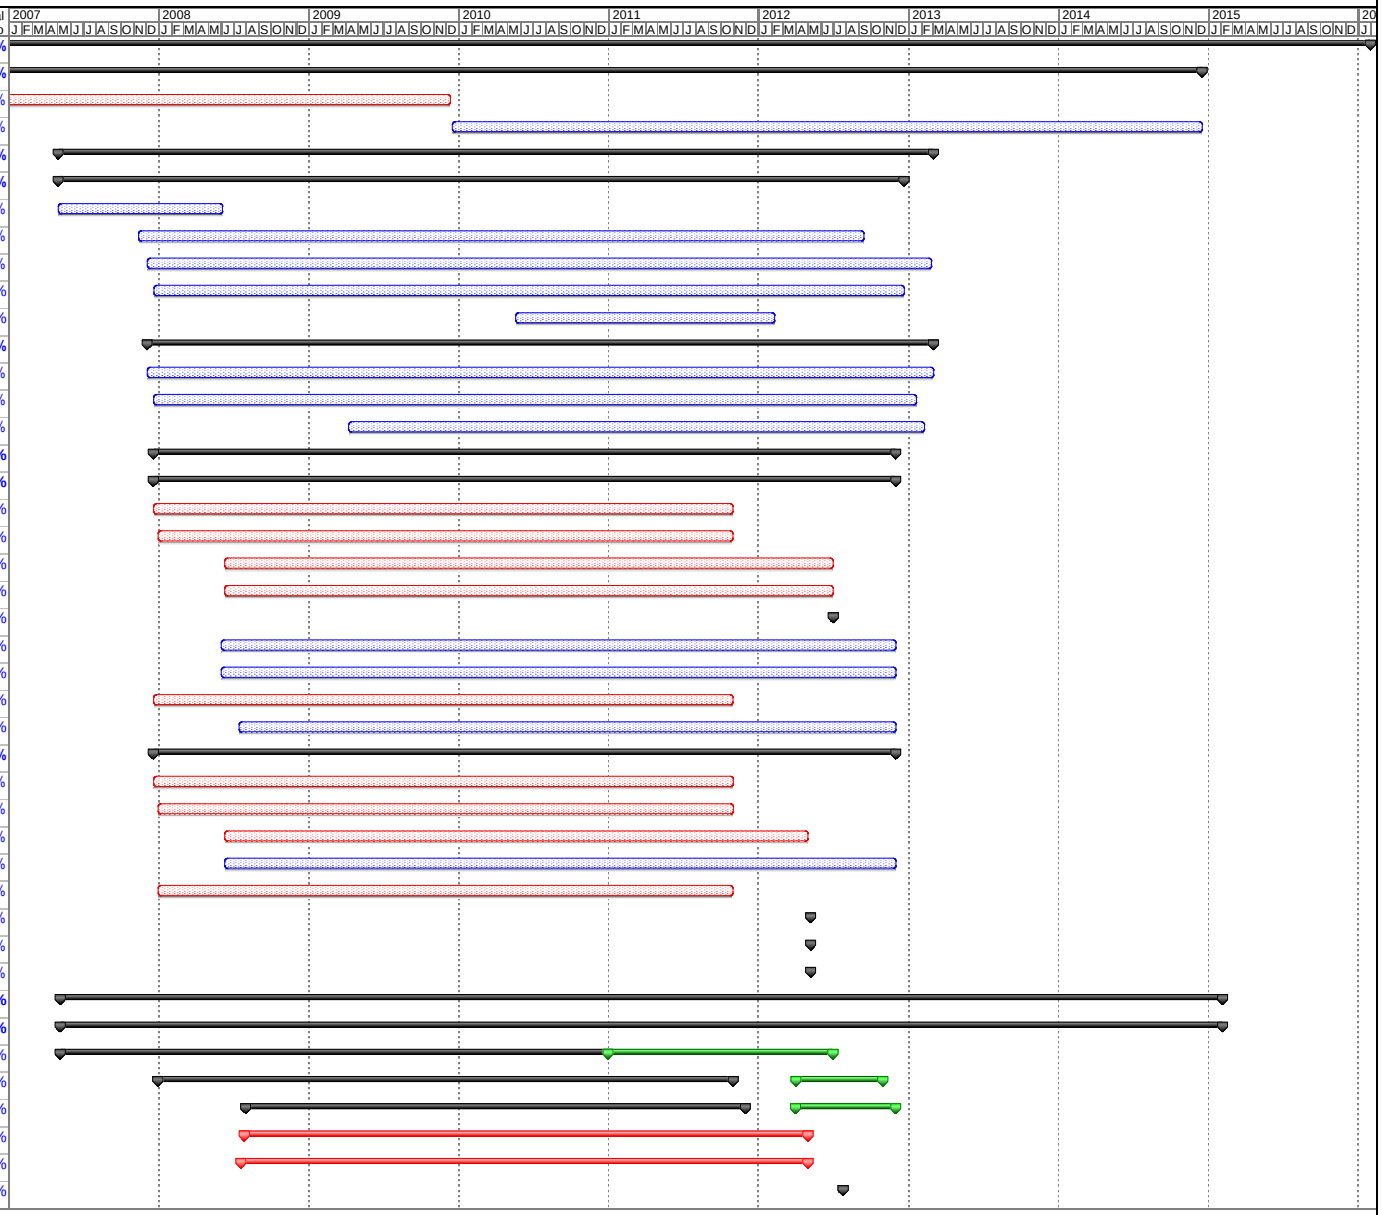

Projeto: PISF

Tarefa — Resumo — Projeção

consórcio
ARCADIS LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(Prazos Contratuais)

Id	Nome da tarefa	Percentual Executado
216	Obras - Lote 06	55,20%
237	Obras - Lote 07	18,00%
280	Obras - Lote 08	25,70%
308	Obras - Lote 14	53,60%
320	EIXO LESTE	75,20%
321	EXÉRCITO	93,60%
333	Obras - Lote 09	51,60%
369	Obras - Lote 10	60,10%
415	Obras - Lote 11	91,30%
439	Obras - Lote 12	73,40%
480	Obras - Lote 13	47,50%
538	RAMAL DO AGRESTE	0
539	Licitação Obra Civil	0,00%
566	FORNECIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS	84,00%
567	Eixo Norte	76,60%
568	Comporta/ Grades	89,70%
569	Pontes e Pórticos Rolantes	92,70%
570	Tubulação	29,70%
571	Válvulas	92,40%
572	Conjunto Motobomba Lote II	96,80%
573	Conjunto Motobomba Lote III	80,20%
574	Eixo Leste	91,72%
575	Comporta/ Grades	98,80%
576	Pontes e Pórticos Rolantes	99,99%
577	Tubulação	60,90%
578	Válvulas	93,90%
579	Conjunto Motobomba Lote I	96,80%
580	Conjunto Motobomba Lote II	96,80%
581	SISTEMAS ELÉTRICOS	62,92%
582	Eixo Norte	63,72%
583	Linha de Distribuição	17,46%
584	Linha de Transmissão	84,80%
585	Subestações	62,40%
586	SDSC	49,60%
587	Softstart	0%
588	Eixo Leste	61,12%
589	Linha de Distribuição	6,80%
590	Linha de Transmissão	72,52%
591	Subestações	66,10%
592	SDSC	56,90%
593	Softstart	84,20%
594	TEMPO DE ENCHIMENTO	
598	OPERAÇÃO	

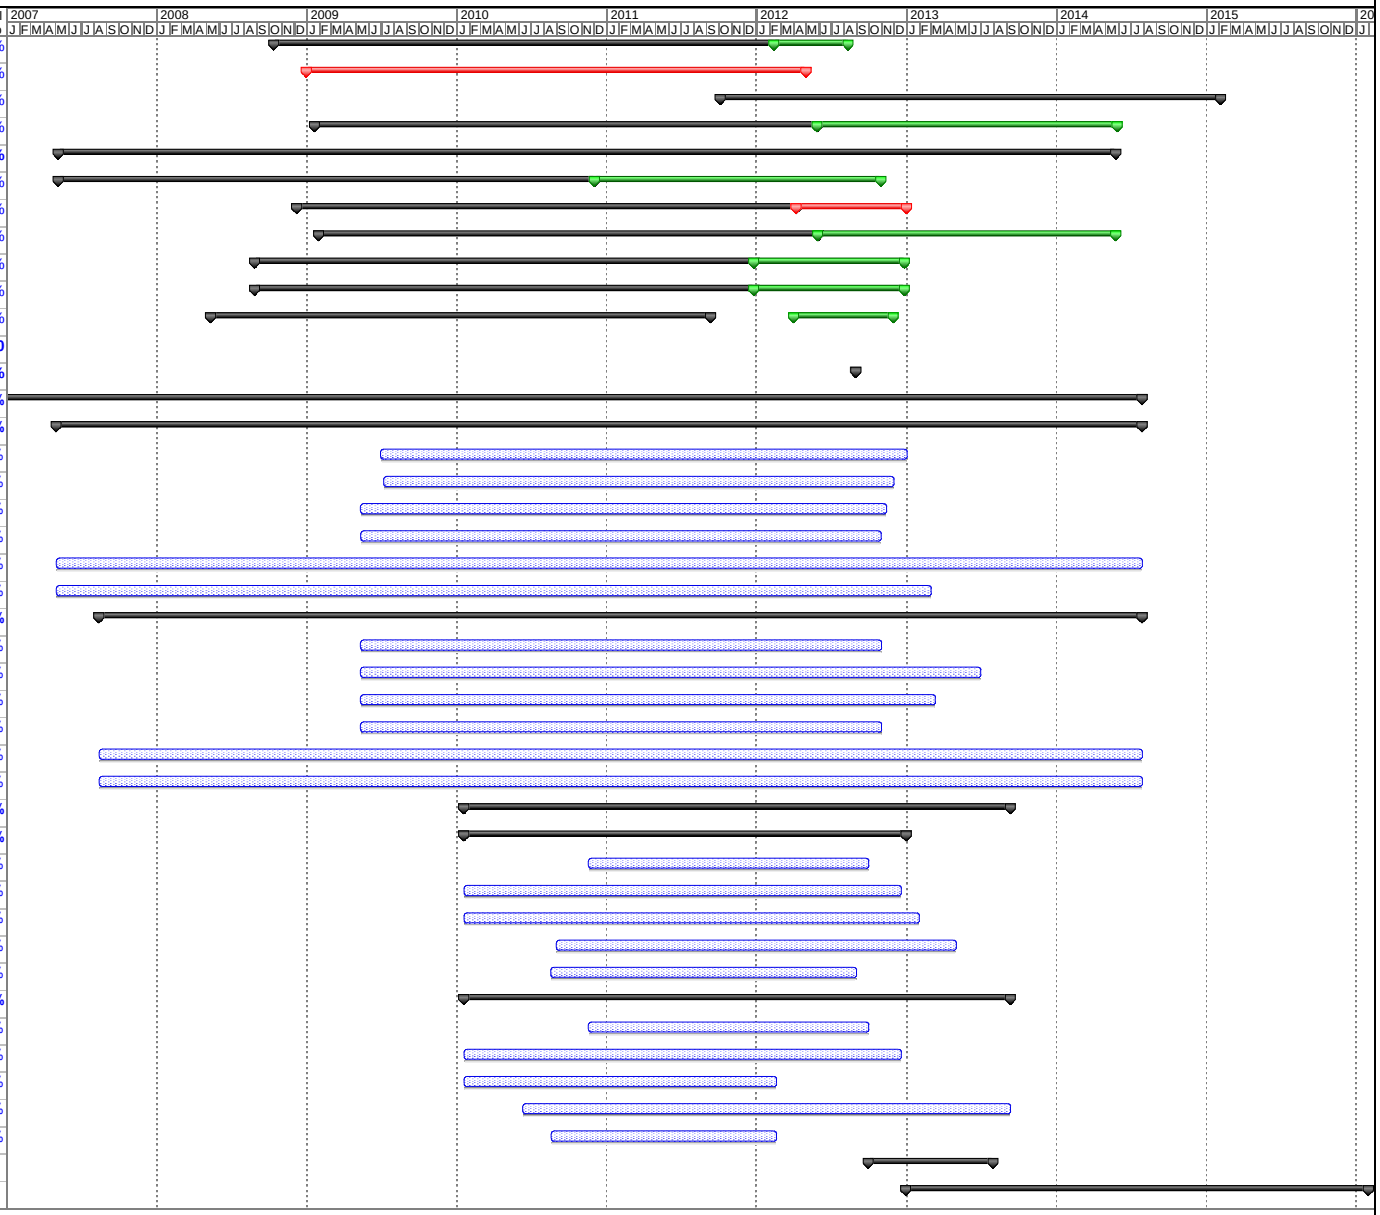

Projeto: PISF

Tarefa Resumo Projeção
