Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
1	**Usina Termelétrica Pampa Sul 340MW**	**1513 dias**	**Seg 10/11/14**	**Ter 01/01/19**
2	**Engenharia e Projetos**	**507 dias**	**Seg 10/11/14**	**Qua 30/03/16**
3	Projeto Básico Ambiental (PBA)	72 dias	Seg 10/11/14	Ter 20/01/15
4	Entrega do PBA no Ibama	4 dias	Ter 20/01/15	Sex 23/01/15
5	Workshop para apresentação do PBA e inspeção do site	5 dias	Seg 02/03/15	Sex 06/03/15
6	Projeto Básico de Engenharia	90 dias	Qui 02/04/15	Ter 30/06/15
7	Projeto Civil das Fundações da Caldeira e Casa de Força	75 dias	Qua 01/07/15	Dom 13/09/15
8	Projeto dos Equipamentos	147 dias	Seg 29/06/15	Dom 22/11/15
9	Desenhos de Montagem e Interligações Elétricas e Mecânicas	246 dias	Qua 29/07/15	Qua 30/03/16
10	**Fornecimento de Equipamentos**	**893 dias**	**Ter 17/03/15**	**Sex 25/08/17**
11	Fabricação da Caldeira	620 dias	Ter 17/03/15	Sex 25/11/16
12	Transporte das Peças da Caldeira	384 dias	Seg 08/02/16	Sáb 25/02/17
13	Fabricação da Turbina e Gerador	801 dias	Ter 17/03/15	Qui 25/05/17
14	Transporte da Turbina e Gerador	210 dias	Sáb 28/01/17	Sex 25/08/17
15	Fabricação dos demais equipamentos e sistemas	453 dias	Ter 04/08/15	Sáb 29/10/16
16	Transporte dos demais equipamentos e sistemas	97 dias	Ter 25/10/16	Dom 29/01/17
17	**Obras Civis**	**779 dias**	**Seg 06/04/15**	**Ter 23/05/17**
18	Mobilização de Equipes de Campo	135 dias	Sáb 16/05/15	Dom 27/09/15
19	Terraplenagem	136 dias	Sáb 16/05/15	Seg 28/09/15
20	Execução de estacas de fundação	175 dias	Sex 07/08/15	Qui 28/01/16
21	Execução das fundações da Caldeira	121 dias	Dom 25/10/15	Seg 22/02/16
22	Execução das fundações da Casa de Força	130 dias	Sáb 30/01/16	Ter 07/06/16
23	Execução das fundações dos demais equipamentos	393 dias	Seg 25/01/16	Seg 20/02/17
24	Construção de Edificações	350 dias	Qua 08/06/16	Ter 23/05/17
25	**Montagem Mecânica e Elétrica**	**913 dias**	**Ter 23/02/16**	**Qui 23/08/18**
26	Montagem das Estruturas Metálicas da Caldeira	199 dias	Ter 23/02/16	Qui 08/09/16
27	Montagem da Caldeira	714 dias	Sex 09/09/16	Qui 23/08/18
28	Montagem dos equipamentos auxiliares da caldeira	596 dias	Sáb 23/04/16	Sáb 09/12/17
29	Montagem da Turbina e do Gerador	367 dias	Dom 12/02/17	Ter 13/02/18
30	Montagem dos equipamentos auxiliares da turbina e do gerador	420 dias	Qui 30/03/17	Qua 23/05/18
31	Montagem dos sistemas elétricos e subestação	373 dias	Seg 24/10/16	Ter 31/10/17
32	Montagem do sistema de carvão	274 dias	Qua 22/03/17	Qua 20/12/17
33	Montagem do sistema de cinzas	365 dias	Qua 25/01/17	Qua 24/01/18
34	Montagem do sistema de tratamento de água	227 dias	Qui 24/11/16	Sáb 08/07/17
35	Montagem das Torres de Resfriamento	151 dias	Seg 19/06/17	Qui 16/11/17
36	Montagem do FGD	214 dias	Sáb 25/03/17	Ter 24/10/17
37	**Melhoria e Abertura de Acessos**	**152 dias**	**Qua 01/04/15**	**Dom 30/08/15**
38	Mobilização de equipe	15 dias	Qua 01/04/15	Qua 15/04/15
39	Construção da Base dos Acessos	75 dias	Qua 15/04/15	Dom 28/06/15
40	Construção dos Acabamentos dos Acessos	77 dias	Seg 15/06/15	Dom 30/08/15
41	**Barragem Rio Jaguarão II**	**626 dias**	**Dom 17/05/15**	**Qua 01/02/17**
42	Mobilização	13 dias	Dom 17/05/15	Sex 29/05/15
43	Preparação do solo e escavação	155 dias	Sáb 30/05/15	Sáb 31/10/15
44	Construção da Barragem à esquerda do vertedouro	178 dias	Sáb 05/09/15	Seg 29/02/16
45	Construção do vertedouro	184 dias	Sáb 01/08/15	Dom 31/01/16
46	Desvio do Rio (Canais de adução e restituição)	113 dias	Seg 26/10/15	Seg 15/02/16

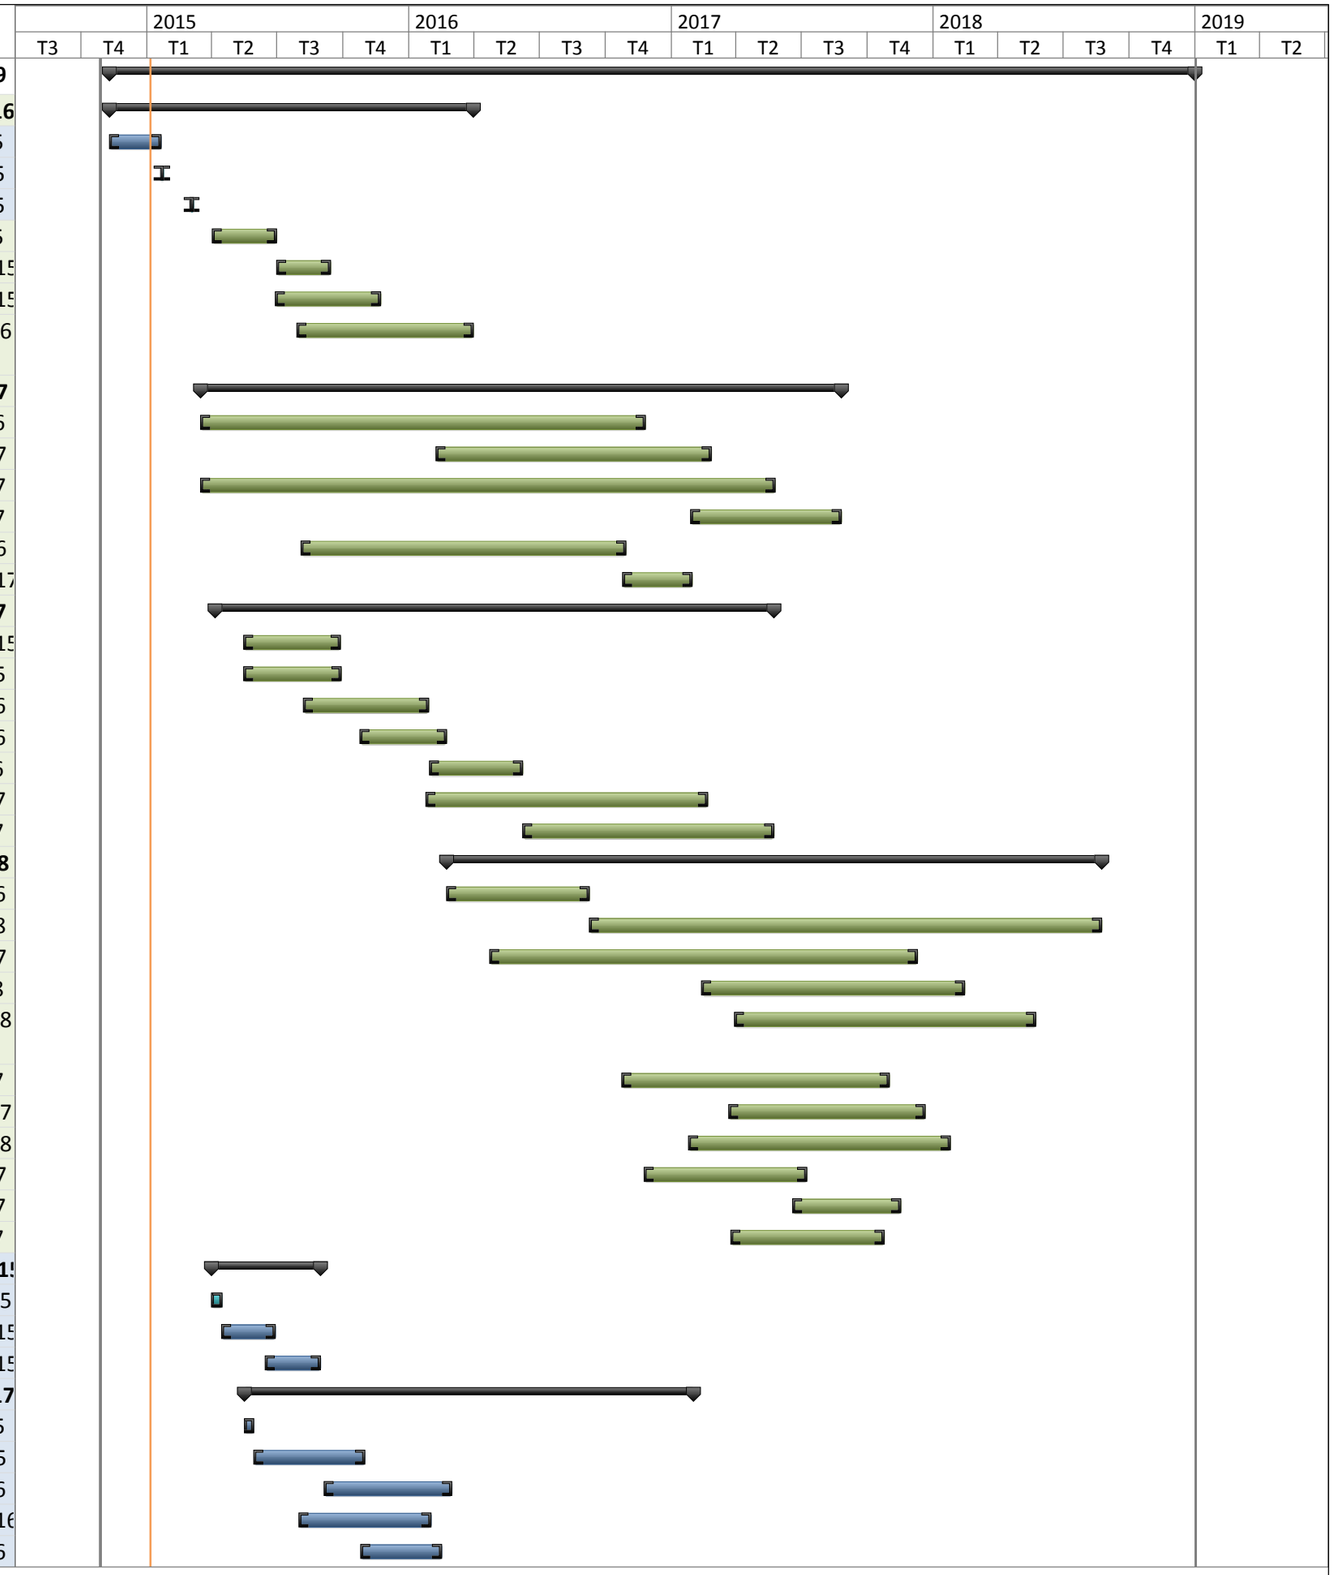

Cronograma UTE Pampa Sul - PBA

Escopo Contrato EPC | Escopo Outros Contratos | Marco | Resumo

Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término
47	Construção da barragem à direita do vertedouro	156 dias	Ter 16/02/16	Qua 20/07/16
48	Término da Construção da Barragem	0 dias	Qua 20/07/16	Qua 20/07/16
49	Enchimento do lago	185 dias	Qui 21/07/16	Sáb 21/01/17
50	Construção da adutora de água bruta	171 dias	Ter 02/02/16	Qui 21/07/16
51	Montagem da estação de captação	142 dias	Ter 01/03/16	Qua 20/07/16
52	Comissionamento da Adutora	48 dias	Qui 15/12/16	Ter 31/01/17
53	Inicio da Operação da Adutora	0 dias	Qua 01/02/17	Qua 01/02/17
54	**Linha de Transmissão**	**484 dias**	**Sex 15/05/15**	**Qua 22/03/17**
55	Entrega do RAS	0 dias	Sex 15/05/15	Sex 15/05/15
56	Emissão da LI da Linha de Transmissão	0 dias	Qua 15/07/15	Qua 15/07/15
57	Fabricação e Fornecimento de Materiais e Equipamentos	323 dias	Qua 15/07/15	Qua 01/06/16
58	Obras Civis	153 dias	Sáb 02/04/16	Qui 01/09/16
59	Montagem de Torres	216 dias	Qua 01/06/16	Seg 02/01/17
60	Lançamento de Cabos	112 dias	Qui 01/12/16	Qua 22/03/17
61	Construção do Bay de Conexão	305 dias	Dom 22/05/16	Qua 22/03/17
62	**Correia Transportadora de Carvão**	**690 dias**	**Sex 01/05/15**	**Seg 20/03/17**
63	Entrega do RAS	0 dias	Sex 15/05/15	Sex 15/05/15
64	Emissão da LI da Correia	0 dias	Qua 15/07/15	Qua 15/07/15
65	Fabricação e Fornecimento de Equipamentos	381 dias	Sex 01/05/15	Dom 15/05/16
66	Fundações da esteira	367 dias	Ter 01/12/15	Qui 01/12/16
67	Montagem Mecânica	367 dias	Sex 15/01/16	Dom 15/01/17
68	Montagem Elétrica	91 dias	Qui 01/12/16	Qua 01/03/17
69	Testes de transporte de carvão	19 dias	Qui 02/03/17	Seg 20/03/17
70	**Comissionamento**	**347 dias**	**Sex 01/09/17**	**Ter 01/01/19**
71	Comissionamento dos Subsistemas	277 dias	Ter 12/09/17	Sex 15/06/18
72	Comissionamento Geral da Planta	188 dias	Sáb 16/06/18	Qui 20/12/18
73	Inicio da Operação Teste	0 dias	Qui 01/11/18	Qui 01/11/18
74	Solicitação ao Ibama para emissão da LO	0 dias	Sáb 10/11/18	Sáb 10/11/18
75	Início da Operação Comercial	0 dias	Ter 01/01/19	Ter 01/01/19

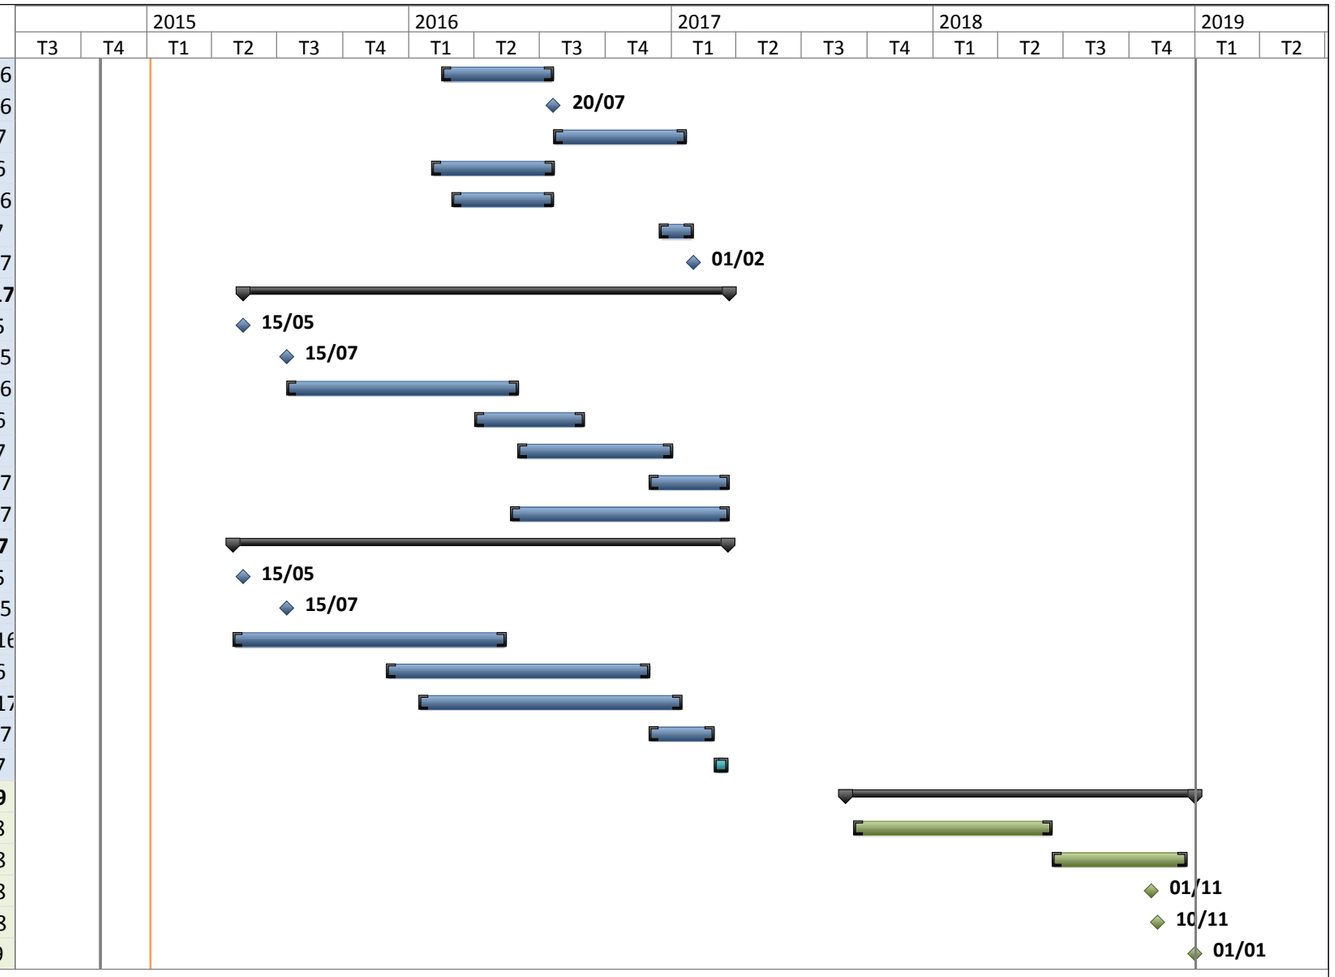

Cronograma UTE Pampa Sul - PBA

Escopo Contrato EPC | Escopo Outros Contratos | Marco | Resumo
