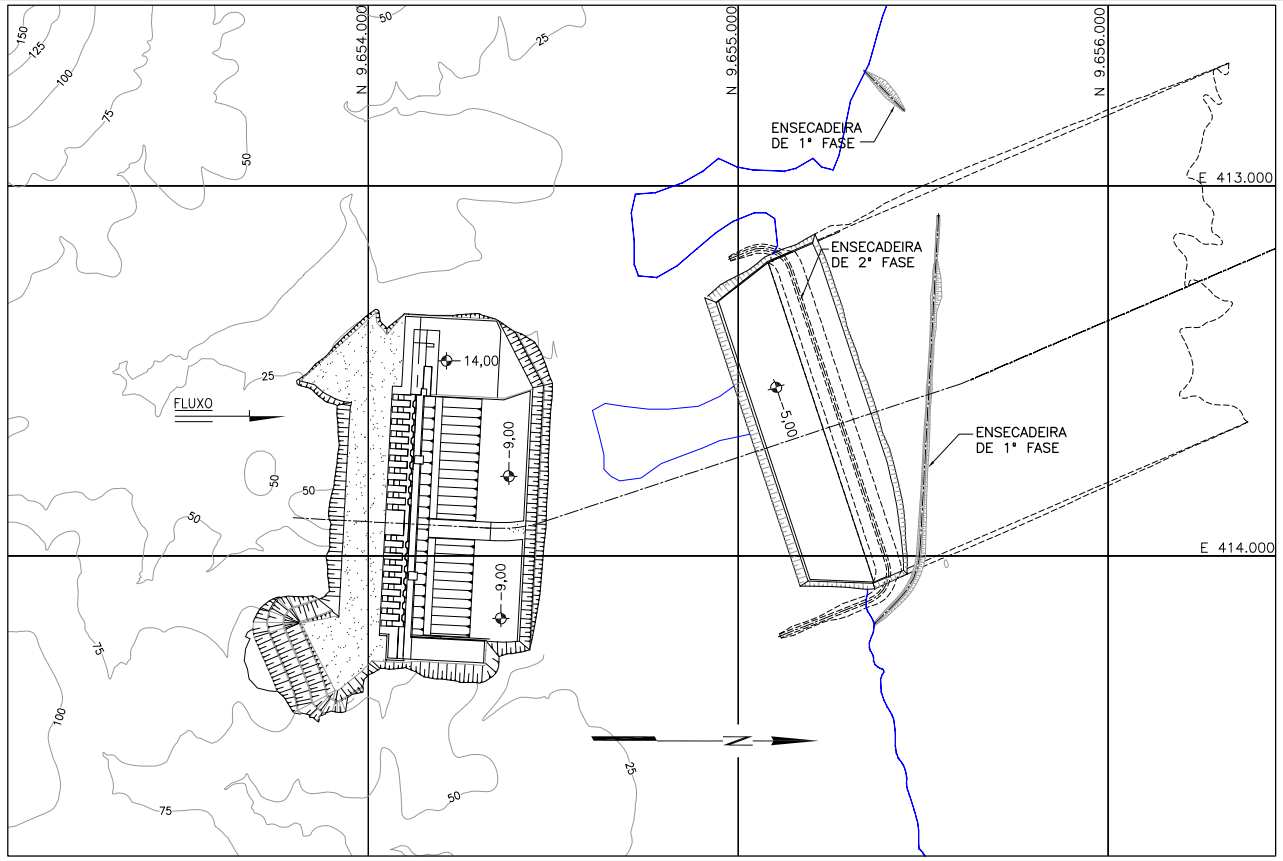

1ª FASE:
- ESCAVAÇÕES NA ÁREA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO.
- CONSTRUÇÃO DA ENSECADEIRA DE 1ª FASE NO CANAL DE FUGA.
- ESCAVAÇÃO PARCIAL DO CANAL DE FUGA PARA CONSTRUÇÃO DA ENSECADEIRA DE 2ª FASE.

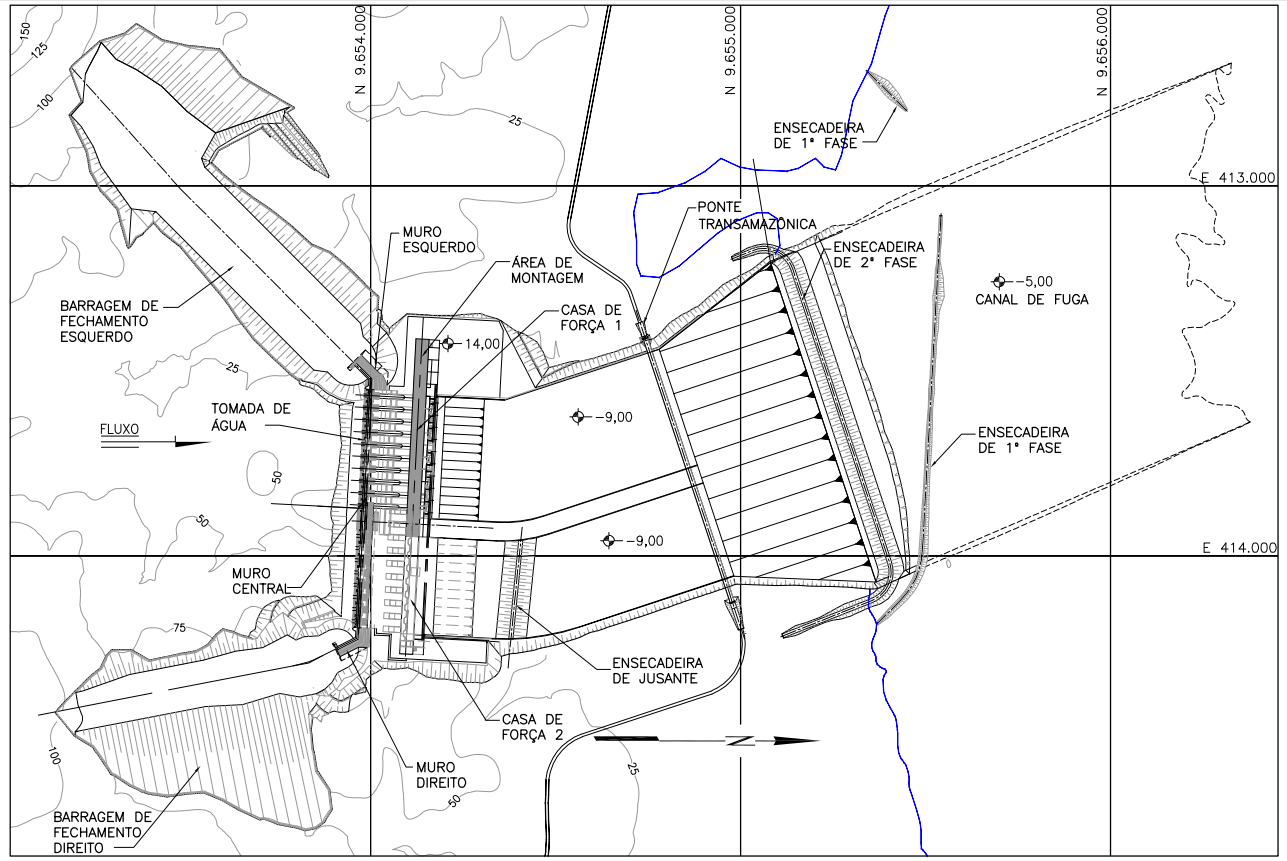

2ª FASE:
- CONSTRUÇÃO DA ENSECADEIRA DE 2ª FASE NO CANAL DE FUGA.
- CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO DE GERAÇÃO 1 E DA ÁREA DE MONTAGEM.
- CONSTRUÇÃO DOS MUROS ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL
- CONSTRUÇÃO DA ENSECADEIRA DE JUSANTE.
- CONSTRUÇÃO PARCIAL DA TOMADA DE ÁGUA.
- CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS ESQUERDA, DIREITA – PARCIAL.
- CONSTRUÇÃO DA PONTE TRANSAMAZÔNICA.

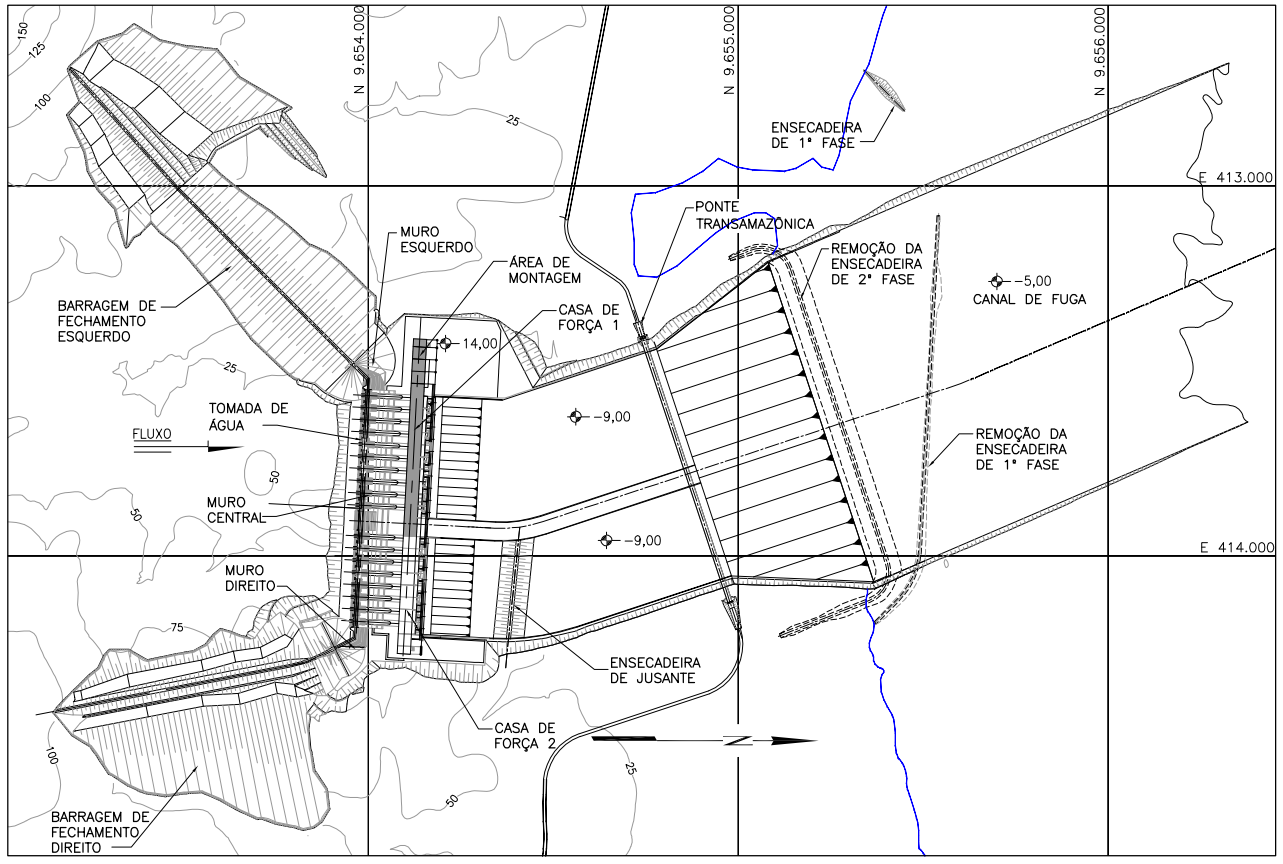

3ª FASE:
- REMOÇÃO DAS ENSECADEIRAS NO CANAL DE FUGA E ESCAVAÇÃO COMPLEMANTAR DO CANAL.
- INÍCIO DA GERAÇÃO DO CIRCUITO DE GERAÇÃO 1.
- CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO DE GERAÇÃO 2 – PARCIAL.
- COMPLEMENTAÇÃO DAS BARRAGENS DE FECHAMENTO ESQUERDO E DIREITO.

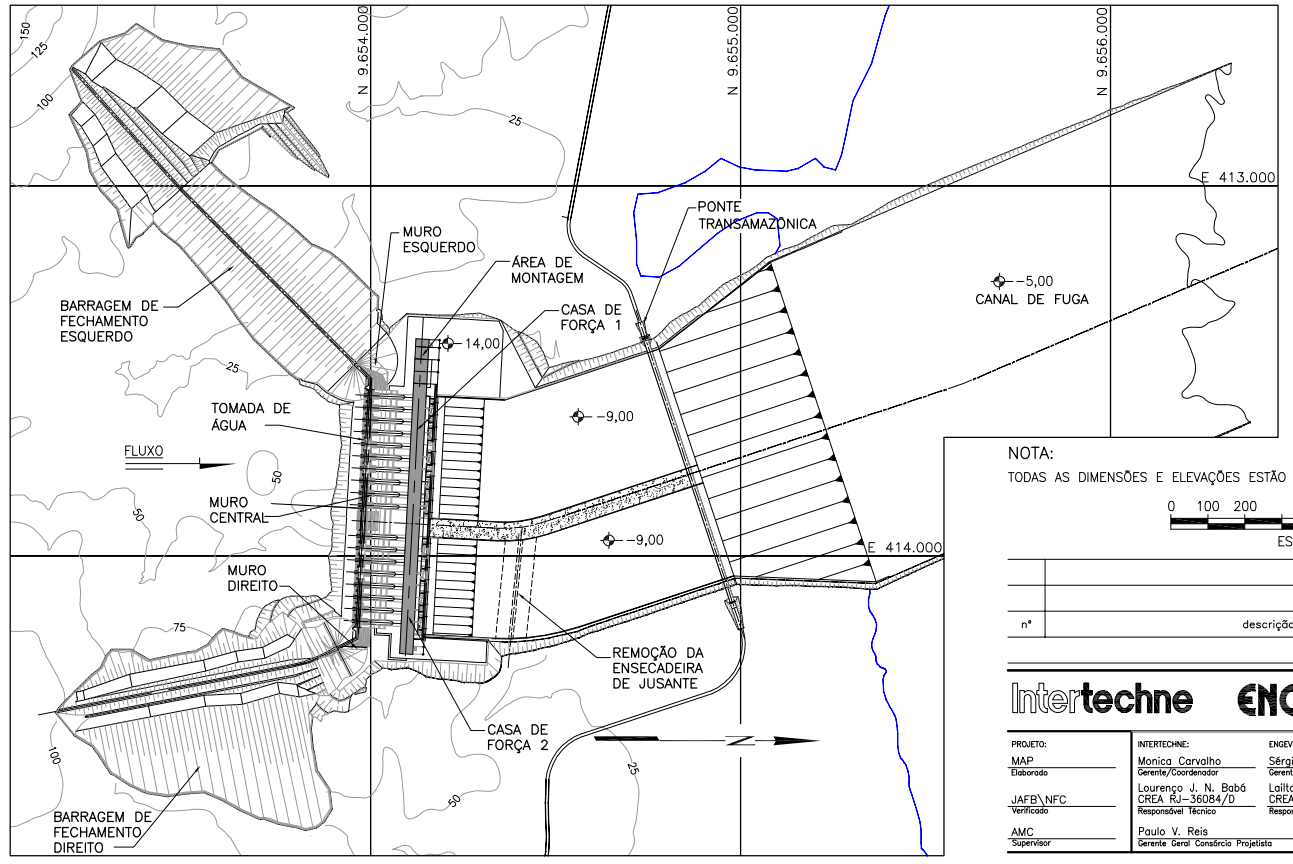

FASE FINAL:
- REMOÇÃO DA ENSECADEIRA DE JUSANTE.
- CONCLUSÃO DOS TRABALHOS E COMPLEMENTAÇÃO DA GERAÇÃO.

NOTA:
TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

0 100 200 400 800m
ESCALA GRAFICA

nº	descrição	prep.	aprov.	data

REVISÕES

Intertechne ENGEVIX PCE Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJETO:	INTERTECHNE:	ENGEVIX:	PCE:	NESA:
MAP Elaborado	Monica Carvalho Gerente/Coordenador	Sérgio L. F. Capellão Gerente/Coordenador	Liberio Alves da Silva Gerente/Coordenador	
JAFB\NFC Verificado	Lourenço J. N. Babó CREA RJ-36084/D Responsável Técnico	Lailton Vieira Xavier CREA PR-18060/D Responsável Técnico	José Eduardo Moreira CREA RJ-21112/D Responsável Técnico	Diretor de Engenharia
AMC Supervisor	Paulo V. Reis Gerente Geral Consórcio Projetista	JUL/10 Data		Data

NORTE ENERGIA - NESA

UHE BELO MONTE

título

SITIO BELO MONTE
SEQUENCIA CONSTRUTIVA
PLANTAS

Código do Documento	revisão
BEL-B-BM-DE-ODR-100-0001	0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – FORMATO ORIGINAL A1
