UHE TELES PIRES
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
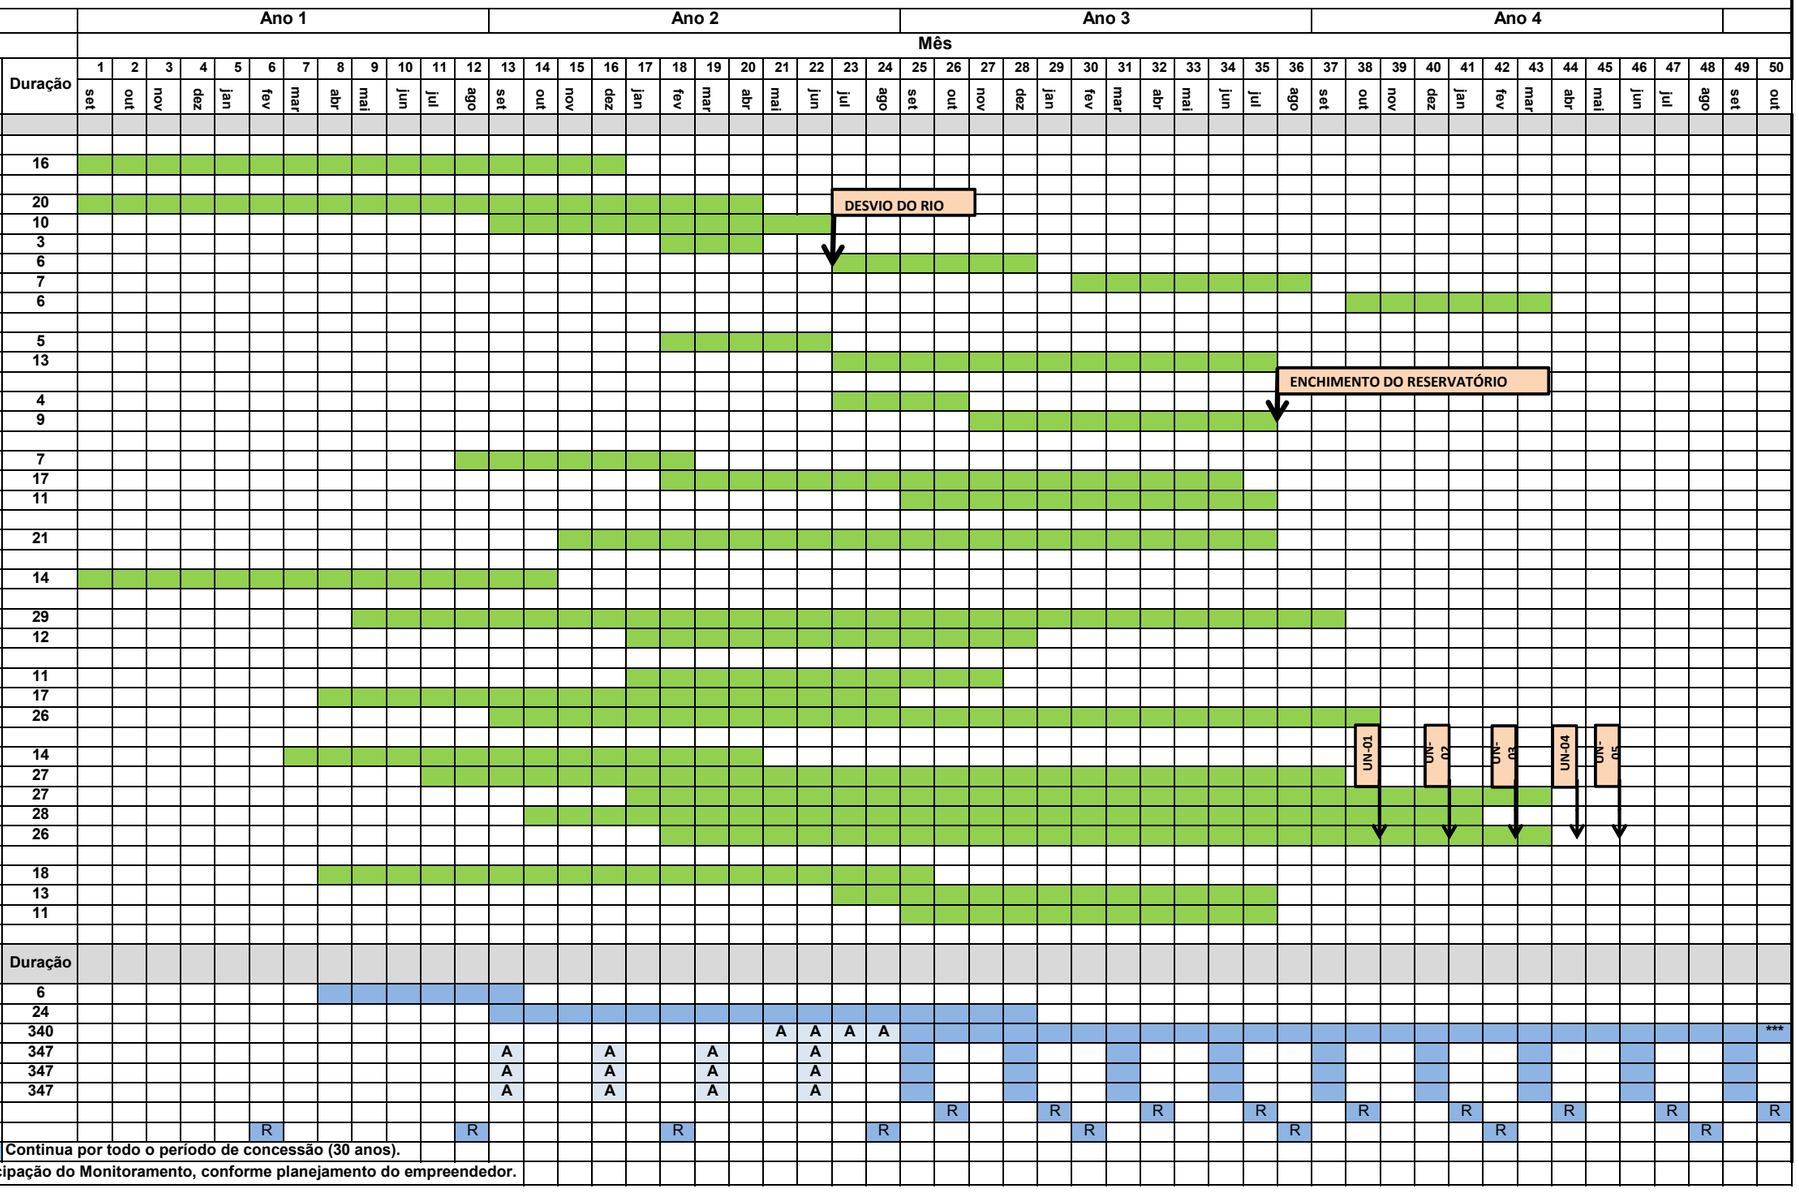
Descrição	Início	Término	Duração
OBRAS			
Serviços Preliminares			
Canteiro e Acessos de Obra	1	16	16
Desvio do Rio			
Desmatamento e Escavações	1	20	20
Estrutura de Controle Túneis	13	22	10
Montagem	18	20	3
Ensecadeiras	23	28	6
Tampão Túnel 1 e 2	30	36	7
Tampão Túnel 3 e 4	38	43	6
Barragem Margem Esquerda e Direita			
Escavações	18	22	5
Tratamentos e Aterro	23	35	13
Barragem Leito do Rio			
Escavações e Tratamentos	23	26	4
Concreto	27	35	9
Vertedouro			
Desmatamento e Escavações	12	18	7
Concreto	18	34	17
Montagem	25	35	11
Muros de Ligação e Abraço			
Concreto	15	35	21
Circuito de Geração			
Desmatamento e Escavações	1	14	14
Tomada D'água			
Concreto	9	37	29
Montagem	17	28	12
Conduto Forçado			
Concreto	17	27	11
Pré-Montagem	8	24	17
Montagem	13	38	26
Casa de Força			
Concreto - Área de Montagem	7	20	14
Concreto - Unidades - Primário	11	37	27
Concreto - Unidades - Secundário	17	43	27
Pré-Montagem	14	41	28
Montagem	18	43	26
Outras Estruturas			
Subestação Elevadora	8	25	18
Linha de Transmissão 500 Kv	23	35	13
BAYs Subestação Coletora	25	35	11
PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO - P.11	**Início**	**Término**	**Duração**
Contratação dos serviços e aquisição dos equipamentos	8	13	6
Instalação das 3 estações	13	28	24
Monitoramento hidrossedimentológico permanente	21	360	340
Levantamentos topobatimétricos	14	360	347
Medições de Descarga Sólida/Liquida	14	360	347
Analises Granulométricas	14	360	347
Relatórios Trimestrais			
Relatórios Semestrais			
		***	Continua por todo o período de concessão (30 anos).
		A = Antecipação do Monitoramento, conforme planejamento do empreendedor.
