

PACOTE DE TRABALHO - 4.4.3 Projeto de Reassentamento Urbano

Atividades | Produtos

Item	Descrição
------	-----------

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

4 PLANO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA

4.4 Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na Área Urbana

4.4.3 Projeto de Reassentamento Urbano

Etapa Preliminar - Entrada na Área


1	Declaração de Utilidade Pública - Publicação do DUP
2	Estabelecimento de acordos e convênios institucionais
3	Definição preliminar dos critérios de elegibilidade e atendimento
4	Elaboração do plano de comunicação social
5	Elaboração do plano de mobilização e participação social
6	Elaboração do plano de trabalho social
7	Reunião na comunidade para apresentação do Programa

Etapa de Levantamento de Dados e Diagnóstico

8	Setorização, selagem e arrolamento dos domicílios
9	Elaboração da planta cadastral
10	Cadastro socioeconômico
11	Cadastro físico-territorial dos imóveis
12	Levantamento dos preços imobiliários
13	Elaboração de planilha de valores imobiliários
14	Plantão social de atendimento nas áreas afetadas
15	Levantamento de documentação pessoal
16	Formação de grupos de participação e comitê de acompanhamento
17	Entrega de notificação/congelamento das ocupações
18	Controle e fiscalização das áreas afetadas

Cadastro Igarapés Altamira
 Reservat. Intermediário
 Desvio do rio pelo vertedouro (sítio Pimental)
 Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força Início geração comercial da 1ª UG CF Complementar
 Enchimento Reserv. Inerm - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada Operação última UG da CF Complementar
 Início geração comercial CF Principal

2011				2012				2013				2014				2015				2016			
T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

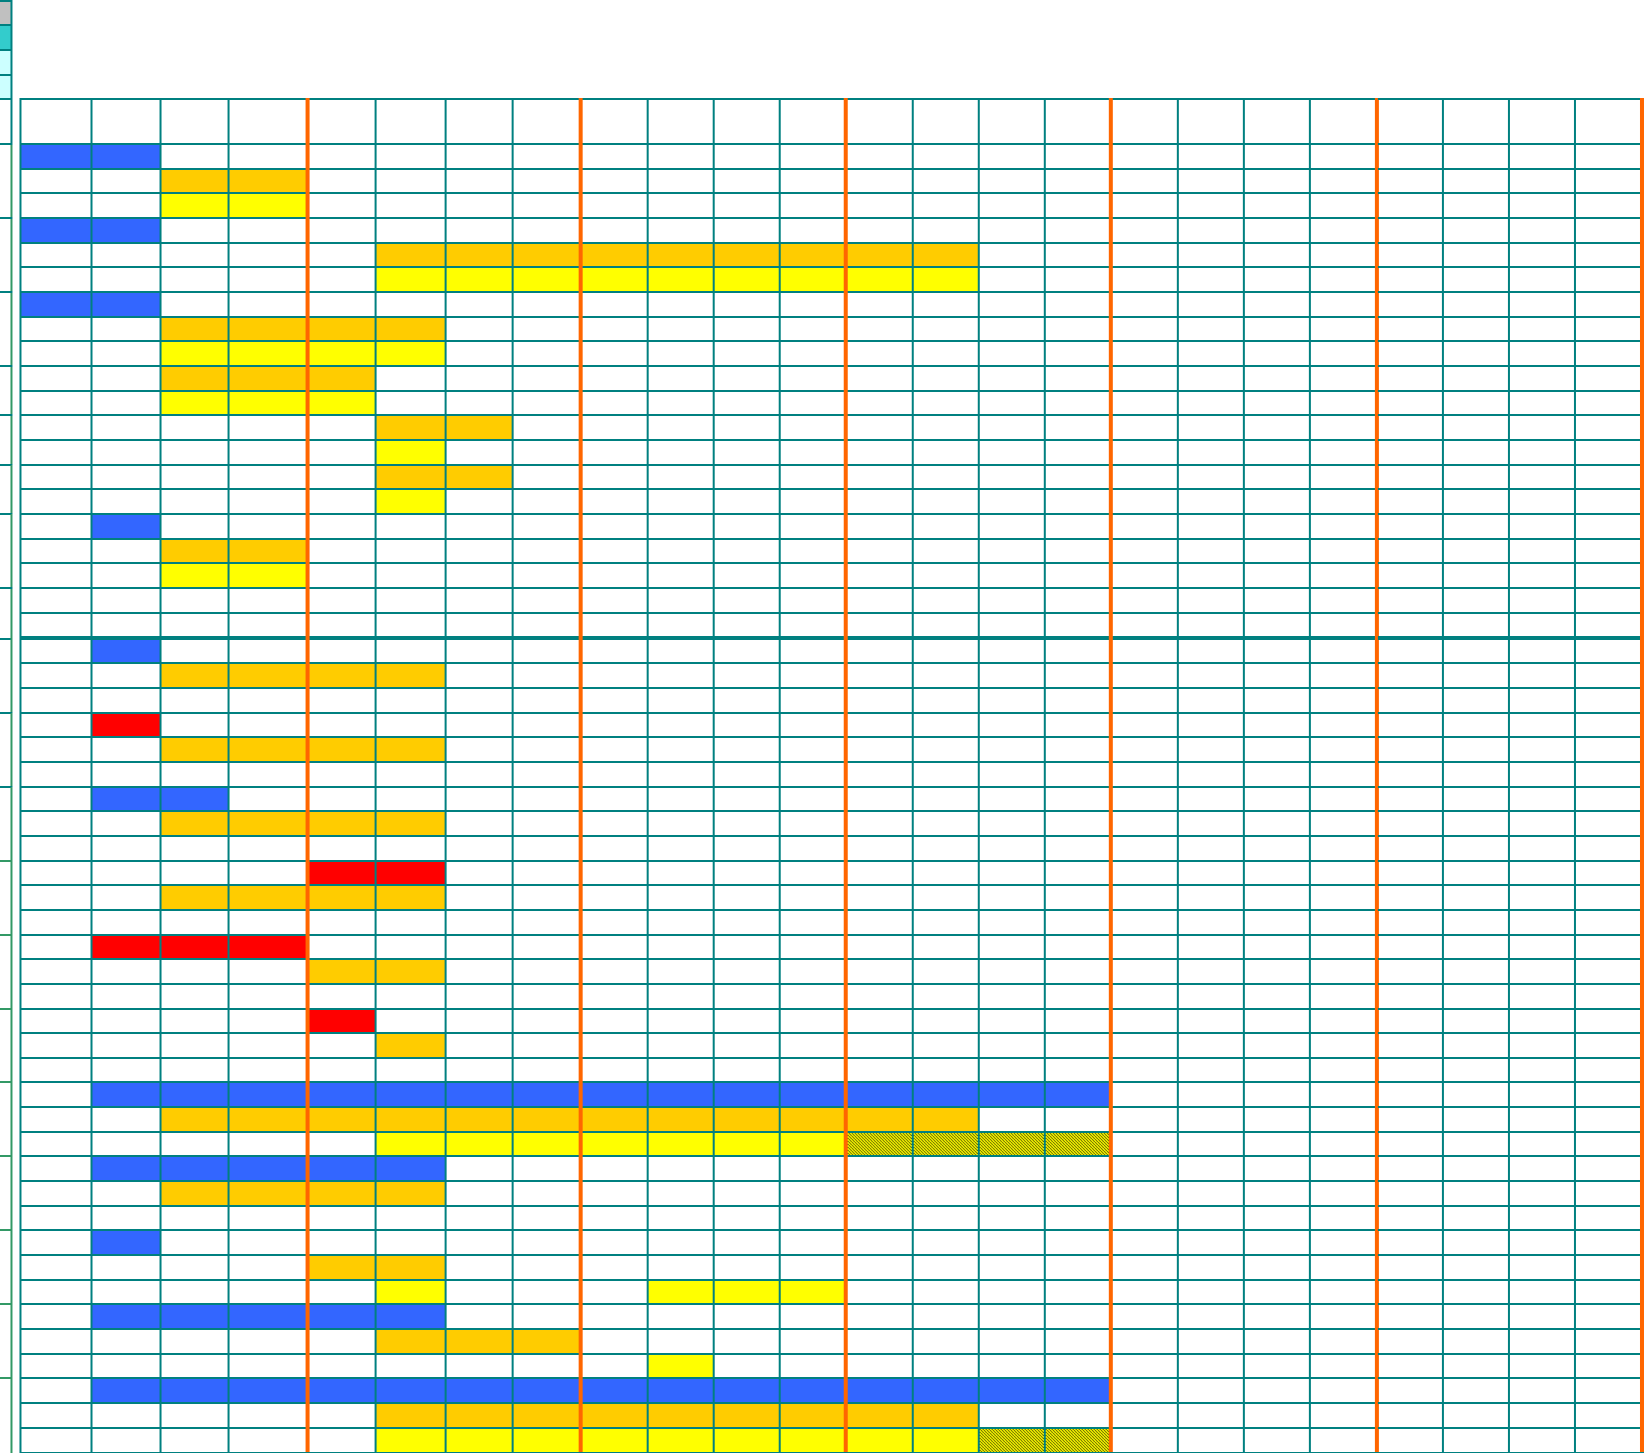

PACOTE DE TRABALHO - 4.4.3 Projeto de Reassentamento Urbano

Atividades / Produtos		<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> ▼ Cadastro Igarapés Altamira ▼ Reservat. Intermediário ▼ Desvio do rio pelo vertedouro (sitio Pimental) ▼ Início enchimento Reserv. Xingu - Emissão prevista da LO da casa de força Início geração complementar ▼ Enchimento Reserv. Interm. - LO Casa de Principal (Belo Monte) Entrada Operação última UG da CF Complementar ▼ Início geração comercial CF Principal </div>																							
		2011				2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
41	Reuniões para entrega de cartilha sobre uso da unidade habitacional																								
42	Acompanhamento da demolição dos domicílios liberados																								
43	Acompanhamento de casos especiais																								
Etapa de Consolidação do Assentamento																									
44	Reuniões para estabelecimento de normas de convivência																								
45	Atividades relativas ao desenvolvimento comunitário e organização social																								
46	Atendimento a famílias em casos de vulnerabilidade																								
47	Solução de problemas construtivos nas unidades habitacionais																								
48	Atividades de integração dos moradores																								
Etapa de Acompanhamento Pós-Ocupação - Período de 2 anos																									
49	Sensibilização dos moradores para questões ambientais																								
50	Implantação de projetos sociais, educativos e culturais (A SER DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM OUTROS PROJETOS)																								
51	Acompanhamento de casos de vulnerabilidade																								
52	Atividades de desenvolvimento econômico (A SER DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM OUTROS PROJETOS)																								
Avaliação e Monitoramento																									
53	Elaboração do Plano de Monitoramento e Avaliação																								
54	Avaliação e Monitoramento de todas as Etapas																								
55	Avaliação Final																								

LEGENDA

- Linha de Base - Alteração do PBA
- Atividades relativas ao Projeto de Indenização e Aquisição de Terras e Benfeitorias
- Interfaces com outros programas/projetos (4.4.1 e 4.4.2)
- Realizado/Andamento
- Previsto até o fim do produto
