

Plano de Transferência

004/2010

VILA PRODUTIVA RURAL
NEGREIROS



Projeto
São Francisco
Água a quem tem sede

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO
DE POPULAÇÕES - 08

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE
SETENTRIONAL**

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES - 08

PLANO DE TRANSFERÊNCIA 004/2010
VILA PRODUTIVA RURAL NEGREIROS

Agosto/2010



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVO.....	5
3. PÚBLICO-ALVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	6
5. AÇÕES PROPOSTAS	7
6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS.....	8
7. PLANELAMENTO LOGÍSTICO	9
8. CRONOGRAMA	12
9. ENCAMINHAMENTOS	16
10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL	16



RELAÇÃO DE QUADROS

Quadro 1. Reassentados da VPR Negreiros.	5
Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.	8
Quadro 3. Número de animais por comunidade.	8
Quadro 4. Equipamentos Agrícolas cadastrados.	9
Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.	9
Quadro 6. Cronograma de Mudança.	9
Quadro 7. Quadro 2. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.	10
Quadro 8. Quantificação e distribuição de refeições por grupos de pessoas.	10
Quadro 9. Quantificação e estimativa de valores de refeições e descartáveis.	11
Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Negreiros.	12



1. INTRODUÇÃO

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias que serão reassentadas na Vila Produtiva Rural – VPR Negreiros, uma vez que estas se encontram inseridas na faixa de servidão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, Trecho I, município de Salgueiro/PE.

O referido Plano foi elaborado em conformidade com o Programa de Reassentamento de Populações, que prevê em seu item 8.7.2.1, a execução de 9 etapas, sendo que as etapas 4 e 6 abordam, exclusivamente, o processo de transferência, conforme descrito abaixo:

“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência para Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo:

- (i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;*
- (ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser reassentada;*
- (iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote.*
- (v) elaboração do calendário de mudança.*
- (vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento.*

Etapa 6 - Transferências das Famílias

Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo desenvolvidas as seguintes principais atividades:

- (i) deslocamento das famílias;*
- (ii) transferência dos móveis e utensílios;*
- (iii) transporte dos animais domésticos;”*

As atividades previstas nas etapas acima elencadas estão contempladas no Termo de Referência anexo ao Contrato nº 023/2010, celebrado entre o Ministério da Integração



Nacional e a CMT Engenharia Ltda., para a execução e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do PISF, cabendo a CMT executar a preparação e transferência das famílias para as vilas produtivas rurais, com vista à reinserção e organização social e econômica, à consolidação de práticas socioambientais, ao monitoramento e avaliação.

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens, a partir de visita às famílias a serem reassentadas com a aplicação de questionário (ficha cadastral de móveis, utensílios, equipamentos e animais domésticos), com o objetivo de subsidiar o planejamento logístico da transferência.

2. OBJETIVO

O presente Plano objetiva orientar a transferência de 26 (vinte e seis) famílias residentes na comunidade Mulungú para a Vila Produtiva Rural – VPR Negreiros.

3. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na VPR Negreiros, 26 famílias residentes na faixa de obras do Trecho I, que receberão casa e lote agrícola, conforme especificado no Quadro 01.

Quadro 1. Reassentados da VPR Negreiros.

Nº	Código do Imóvel	Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa sorteada	Benefício		Casa a ser adaptada
				Casa	Lote Agrícola	
1	ENTI-MA-003	MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS	02	1	1	
2	ENTI-MA-006	MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS	08	1	1	Mobilidade reduzida
3	ENTI-MA-006	B ERNESTO NETO DE VASCONCELOS	09	1	1	
5	ENTI-MA-010	A ANTÔNIO SOBRINHO DE VASCONCELOS	21	1	1	
6	ENTI-MA-010	B CESÁRIO LOURIVAL DE SOUZA	14	1	1	
7	ENTI-MA-010	C EXPEDITA ANA DE SOUZA PEREIRA	24	1	1	
8	ENTI-MA-010	D MARIA ANA DE SOUZA	11	1	1	
9	ENTI-MA-010	E LOURIVAL JOSÉ DE SOUZA	12	1	1	Cadeira
4	ENTI-MA-010	F RANIÊ LOURIVAL DE SOUZA	03	1	1	
10	ENTI-MA-011	SÍLVIO LOURIVAL DE SOUZA	10	1	1	

Nº	Código do Imóvel	Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa sorteada	Benefício		Casa a ser adaptada	
				Casa	Lote Agrícola		
11	ENTI-MA-012		MANOEL XAVIER DOS SANTOS	15	1	1	
12	ENTI-MA-013	A	PEDRO ANTÔNIO DA SILVA	06	1	1	
13	ENTI-MA-013	B	EDILSON PEDRO DA SILVA	05	1	1	
14	ENTI-MA-013	C	EDMILSON PEDRO DA SILVA	26	1	1	
15	ENTI-MA-013	D	EXPEDITA MARIA DA SILVA	16	1	1	
16	ENTI-MA-015	A	MACIEL DOS SANTOS PEREIRA	07	1	1	
17	ENTI-MA-015	B	JOSÉ NILSON PEREIRA	20	1	1	
18	ENTI-MA-015	C	MARILENE RODRIGUES PEREIRA E SILVA	18	1	1	
19	ENTI-MA-015	D	MOACIR DOS SANTOS PEREIRA	01	1	1	
20	ENTI-MA-015	E	MARCONDES RODRIGUES PEREIRA	17	1	1	
21	ENTI-MA-016	E	EDIVALDO JOSÉ BENÍCIO	23	1	1	
22	ENTI-MA-017	A	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS	22	1	1	
23	ENTI-MA-017	B	PAULO PEDRO DA SILVA	25	1	1	
24	ENTI-MA-019		HERMÍNIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO (Falecida)	19	1	1	
25	ENTI-MA-020		PEDRO JOAQUIM DA SILVA	13	1	1	Mobilidade reduzida
26	ENTI-186=ENTI-V002	A	JOSÉ RONILDO QUEIROZ DA CRUZ	04	1	1	

4. METODOLOGIA

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Programa de Reassentamento de Populações, onde no item 8.7.1 destaca-se a interação comunitária como premissa no processo de transferência das famílias. Este item determina que *“durante a fase de planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas,*



constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor para encaminhar as reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas.”

Assim, durante reunião realizada em 22 de fevereiro de 2010, foi criada a Comissão Organizadora da VPR Negreiros, composta pelos seguintes moradores: Maria Auxiliadora de Vasconcelos, Maria Lietice da Silva, Maria do Socorro Silva Santos, e Leonardo Manoel dos Santos, que acompanhou a equipe da CMT Engenharia durante o levantamento dos móveis, utensílios e animais domésticos.

Para a elaboração deste Plano foram realizadas visitas individuais nas casas das 26 famílias a serem reassentadas para o levantamento de informações sobre bens, utensílios e animais, utilizando, para tanto, questionários estruturados.

As informações levantadas foram tabuladas e sistematizadas, subsidiando a elaboração do planejamento logístico.

5. AÇÕES PROPOSTAS

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações:

- O Ministério da Integração Nacional deverá disponibilizar, uma semana antes da data prevista para a transferência, o acesso prévio das famílias à VPR para limpeza das casas e construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos lotes residenciais.
- A transferência observará o critério de vizinhança, priorizando-se as famílias com idosos, crianças de colo, portadores de necessidades especiais e gestantes;
- Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para a transferência das famílias beneficiadas até a VPR;
- O transporte (carga e descarga) dos bens, utensílios e animais deverá ser acompanhado por pelo menos um representante de cada família beneficiada;
- As famílias deverão:
 - ✓ Preparar e encaixotar seus pertences, identificando os frágeis;
 - ✓ Reunir os animais em local adequado para o embarque nos caminhões, no dia agendado para o transporte;



- ✓ Assinar, através dos seus representantes, o Termo de Recebimento do Imóvel e o Termo de Transferência, bem como o Termo de Negativa de Mudança para aqueles que se negarem a mudar na data estabelecida.
- O Ministério da Integração Nacional deverá:
 - ✓ Instituir uma Comissão de Acompanhamento para apoio às atividades de transferência, que atuará em regime de plantão;
 - ✓ Articular com a Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE e com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco visando garantir atendimento emergencial e segurança para as famílias e os profissionais envolvidos, durante o processo de transferência.

6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS

No levantamento realizado foram cadastrados 111 (cento e onze) pessoas, residentes na comunidade Mulungú, além de animais, equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme quadros abaixo.

Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.

Comunidade	Nº de Família	Nº de Membros da Família			TOTAL DE PESSOAS
		Adultos	Idosos	Crianças	
Mulungu	26	74	10	27	111

Quadro 3. Número de animais por comunidade.

Comunidade	Caprinos	Ovinos	Felinos	Caninos	Aves	Equinos/ Asininos	Bovinos	Suínos	Muare	Total
Mulungu	407	03	10	13	205	15	08	27	2	654



Quadro 4. Equipamentos Agrícolas cadastrados.

Comunidade	Equipamentos Agrícolas		
	Arado Tração Animal	Carrinho de Mão	Bomba
Mulungu	02	03	01

Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.

Comunidade	Geladeira	Fogão	Guarda-Roupas	Sofá	Cama	Mesa	Cômoda	Cadeira	Armário	Bicicleta	TV	Som/DVD	Antena	Caixa D'água	Tambor	Carvão	Rack/Estante
Mulungu	25	29	31	16	66	52	07	186	33	34	24	23	13	11	23	20	12

7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

O planejamento logístico prevê a disponibilização de caminhões com motoristas e ajudantes, veículo de transporte coletivo, lonas, papelão e cordas, de responsabilidade da Comissão Regional de Obras da Sétima Região Militar - CRO-7.

Para a transferência das famílias, moveis, utensílios e animais serão necessários três caminhões tipo baú ou carga seca, um caminhão tipo gaiola e um veículo de transporte coletivo, tipo Van. Serão necessários ainda 12 (doze) ajudantes para realização do carregamento e descarregamento dos utensílios, móveis e animais.

A transferência das 26 famílias será realizada em 03 (três) dias, conforme quadro abaixo:

Quadro 6. Cronograma de Mudança.

	1º Dia	2º Dia	3º Dia
Número de Famílias a serem Transferidas	09	09	08

Para o plantão de apoio às famílias durante o processo de transferência sugere-se a participação de técnicos do MI, CRO/7 e CMT Engenharia, conforme quadro abaixo:



Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.

INSTITUIÇÃO / PERFIS PROFISSIONAIS	Nº DE INTEGRANTES	PRINCIPAIS AÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - Socioeconomia	02	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas, fornecendo ainda, informações institucionais.
CRO/7 – Coordenação de obras, Eletricista e Bombeiro Hidráulico	03	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Realizar manutenção em instalações elétricas e hidráulicas que necessitem de reparos;
CMT Engenharia – Socioeconomia, Comunicação Social e Educação Ambiental	08	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Acompanhar as frentes de mudança desde o carregamento na origem até a recepção na vila produtiva rural; Prestar orientação às famílias sobre boas práticas intradomiciliares à medida que forem se instalando nas residências; Realizar o registro fotográfico do processo de transferência.
TOTAL		13

A Comissão de Acompanhamento da Transferência poderá se instalar no prédio destinado à associação da VPR para execução de suas atividades, necessitando para tal de mesas e cadeiras.

No dia da transferência deverá ser fornecida alimentação para todos os membros das famílias e profissionais envolvidos, conforme quadros abaixo:

Quadro 8. Quantificação e distribuição de refeições por grupos de pessoas.

Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Reassentados	111	01	1	2	111	222
Motorista Caminhão	4	03	1	2	12	24
Motorista do Van	1	03	1	2	03	06
Ajudantes para Caminhão	12	03	1	2	36	72

Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Motorista da CMT	3	03	1	2	09	18
Equipe Técnica CMT, MI E CRO-07	13	03	1	2	39	78
Total					210	420
Margem de Segurança 10%					231	464

Quadro 9. Quantificação e estimativa de valores de refeições e descartáveis.

Refeição/Descartáveis	Quantidade (Und.)	Valor (R\$)	
		Und.	Total
Lanche (manhã e tarde)	464	3,00	1.392,00
Almoço	231	6,00	1.386,00
Água (garrafa de 1,5 L)	300	2,70	810,00
Copos descartáveis	1000 (10 pacotes)	3,50	35,00
Talheres descartáveis (garfos e facas)	500 (5 pacotes)	4,00	20,00
Papel Toalha	15 pacotes	4,00	60,00
Refrigerantes de 02 Litros	60	4,50	270,00
Sacos de lixo de 100 litros	4 pacotes	3,20	12,80
Total			3.985,80
Obs.: Considerada a margem de segurança para os valores de lanche e almoço.			



8. CRONOGRAMA

Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Negreiros.

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
Mulungú	26	9	CA 1	Lourival José de Souza	12	08h00mim	3		08 Bovinos 100 Caprinos 20 Aves	
			CA 2	Manoel Xavier dos Santos	15	08h00mim	7		15 Aves	
			CB1	Maria das Graças Vasconcelos	08	08h00mim	4		03 Felinos	
			CA 1	Moacir dos Santos Pereira	01	09h30mim	7			
			CA 2	Maria do Socorro da Silva Santos	22	09h30mim	5		03 Equinos 04 Caprinos 01 Suíno 02 Canino 04 Aves 02 Felinos	
			CA 3	Ernesto Neto de Vasconcelos	09	09h30mim	4		01 Suíno	

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
			CA 1	Pedro Antônio da Silva	06	14h00mim	2		08 Suínos	
			CA 2	Antônio Sobrinho Vasconcelos	21	14h00mim	6		10 Caprinos 01 Eqüinos 05 Suínos 10 Aves 02 Caninos	
			CA 3	Cesário Lourival de Souza	14	14h00mim	4		04 Caprinos	
		9	CA 1	Expedita Ana de Souza Pereira	34	08h00mim	6		73 Caprinos 02 Eqüinos 03 Caninos 40 Aves	
			CA 2	Maria Ana de Souza	11	08h00mim	5		04 Caprinos 01 Suíno 15 Aves	
			CA 3	Maria Auxiliadora de Vasconcelos	02	08h00mim	1		03 Felinos	
			CA 1	Sílvio Lourival de Souza	10	09h30mim	2		02 Eqüinos 01 Muar	Reside em Salgueiro Rua V. Menezes



Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
									50 Caprinos	Nº1423, BAIRRO
									04 Suínos	
									01 Canino	
									16 Aves	
			CA 2	Edilson Pedro da Silva	05	09h30mim	4		02 Eqüinos	
									01 Muar	
									06 Caprinos	
									01 Canino	
			CA 3	Edmilson Pedro da Silva	26	09h30mim	4		01 Canino	
									15 Aves	
			CA 1	Expedita Maria da Silva	16	14h00mim	4		1 Eqüino	
									150 Caprinos	
									01 Canino	
			CA 2	Maciel dos Santos Pereira	07	14h00mim	1		01 Eqüino	
			CA 3	José Nilson Pereira	20	14h00mim	4			
		8	CA 1	Marilene Rodrigues Pereira e Silva	18	08h00mim	6		02 Eqüinos	
									06 Suínos	



Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
									03 Ovinos	
									40 Aves	
									02 Caninos	
			CA 2	Marcondes Rodrigues Pereira	17	08h00mim	3			
			CA 3	Edivaldo José Benicio	23	08h00mim	4		01 Suíno	
			CA 1	Paulo Pedro da Silva	25	09h30mim	1		02 Equinos	
			CA 2	Hermina Francisca da Conceição	19	09h30mim	3			
			CA 3	Pedro Joaquim da Silva	13	09h30mim	4			
			CA 1	José Ronildo Queiroz da Cruz	04	14h00mim	9		01 Felino	
			CA 2	Renê Lourival de Souza	3	14h00mim	5		06 Caprinos	
									30 Aves	

9. ENCAMINHAMENTOS

Para viabilizar a execução deste Plano de Transferência é necessário que o MI adote as seguintes providências:

- Aprovar este Plano de Transferência e o cronograma de mudança, definindo os responsáveis pela realização das despesas decorrentes de sua execução;
- Apresentar o Plano para as famílias, prestando esclarecimentos sobre as condições para a transferência e pactuando sua execução.
- Solicitar apoio à Prefeitura de Cabrobó - PE para atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel.
- Solicitar apoio à Polícia Militar do Estado de Pernambuco para garantia da segurança das famílias e profissionais envolvidos, durante o processo de transferência;
- Instituir a Comissão de Acompanhamento da Transferência, solicitando à CRO-7 e a CMT Engenharia a indicação de seus representantes, observando os perfis profissionais descritos no quadro 7 deste Plano;
- Verificar a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de entrega da Vila Produtiva Rural à comunidade.

10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL



Fábio Henrique Julião dos Santos
Gestor Ambiental
Analista Ambiental



Olga Lopes
Assistente Social
Analista Ambiental



José Antônio dos Santos
Técnico Agropecuária
Técnico Ambiental




Visto:



Mariana Veríssimo Pacheco
Engenheira Agrônoma - Inspetora
Ambiental

De acordo:



Rômulo Rogério J. Mascarenhas
Eng.º Ambiental – CREA113487D-TO
Coordenador Setorial – Salgueiro/PE




Alexandre Tadeu M. Rodrigues
Geógrafo – CREA 92766/D-TO
Coordenador de Campo



Anexo I - LAYOUT DO NÚCLEO HABITACIONAL



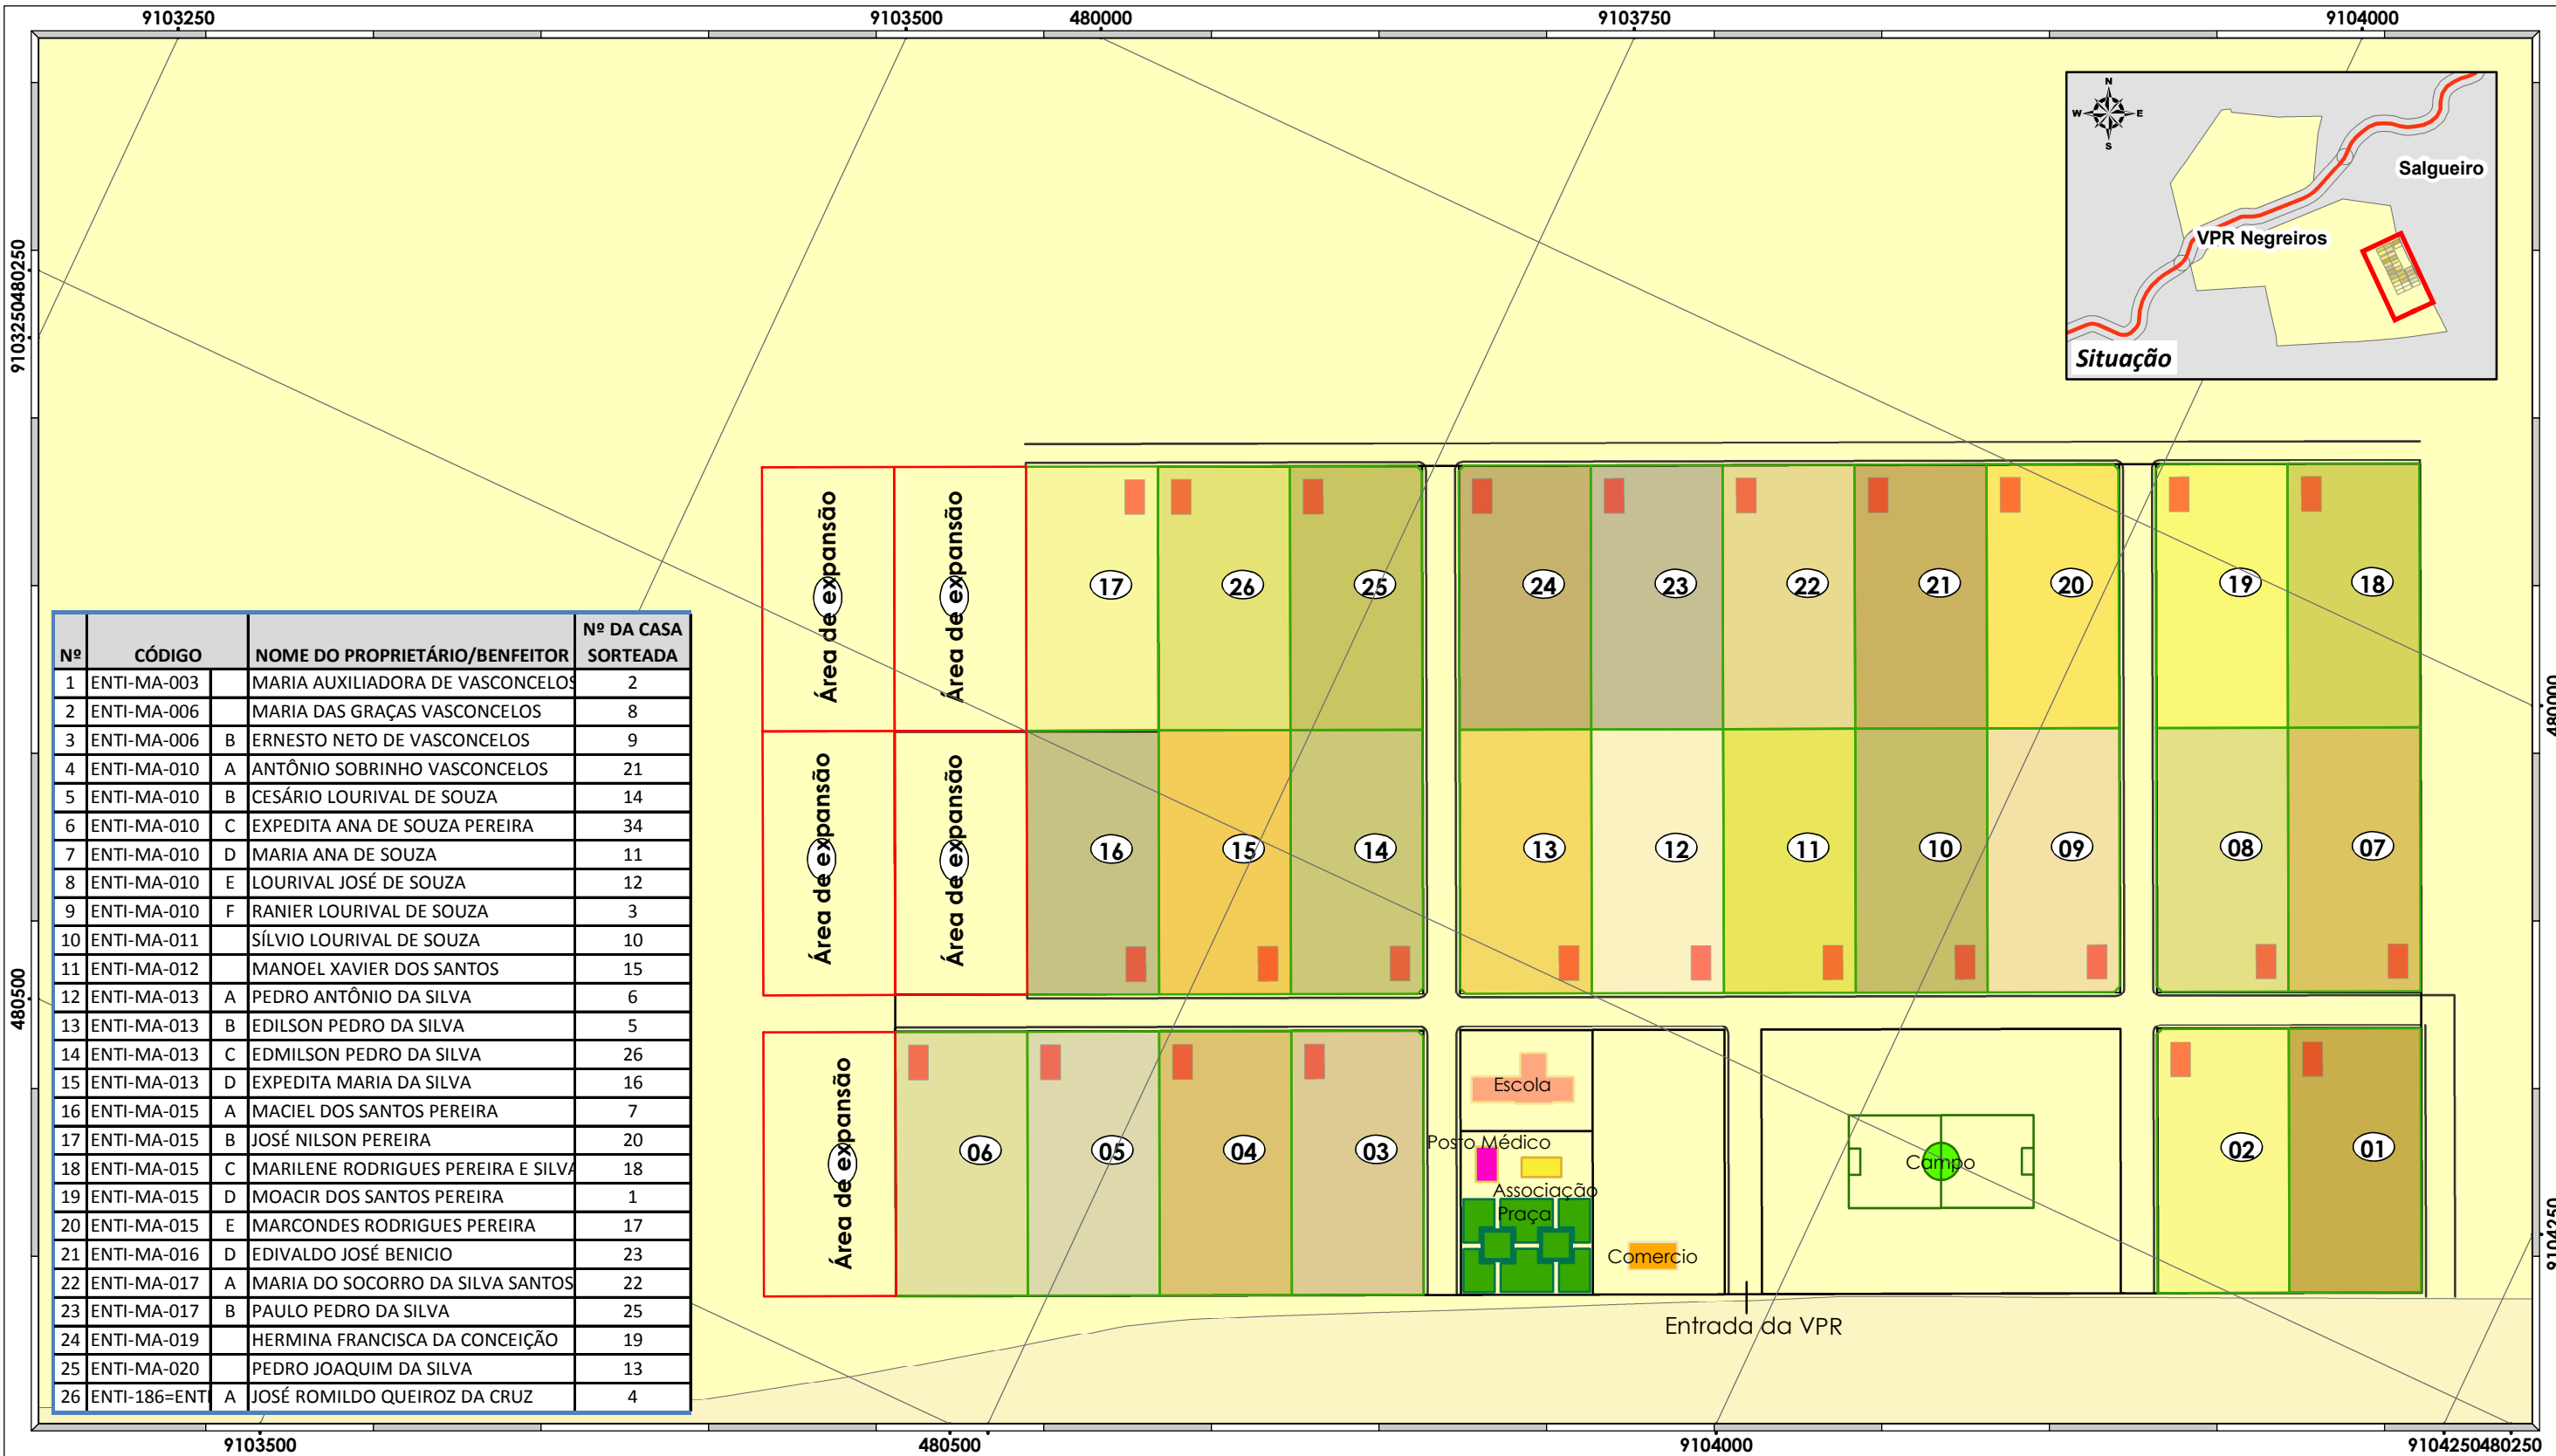

Nº	CÓDIGO	NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR	Nº DA CASA SORTEADA
1	ENTI-MA-003	MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS	2
2	ENTI-MA-006	MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS	8
3	ENTI-MA-006	B ERNESTO NETO DE VASCONCELOS	9
4	ENTI-MA-010	A ANTÔNIO SOBRINHO VASCONCELOS	21
5	ENTI-MA-010	B CESÁRIO LOURIVAL DE SOUZA	14
6	ENTI-MA-010	C EXPEDITA ANA DE SOUZA PEREIRA	34
7	ENTI-MA-010	D MARIA ANA DE SOUZA	11
8	ENTI-MA-010	E LOURIVAL JOSÉ DE SOUZA	12
9	ENTI-MA-010	F RANIER LOURIVAL DE SOUZA	3
10	ENTI-MA-011	SÍLVIO LOURIVAL DE SOUZA	10
11	ENTI-MA-012	MANOEL XAVIER DOS SANTOS	15
12	ENTI-MA-013	A PEDRO ANTÔNIO DA SILVA	6
13	ENTI-MA-013	B EDILSON PEDRO DA SILVA	5
14	ENTI-MA-013	C EDMILSON PEDRO DA SILVA	26
15	ENTI-MA-013	D EXPEDITA MARIA DA SILVA	16
16	ENTI-MA-015	A MACIEL DOS SANTOS PEREIRA	7
17	ENTI-MA-015	B JOSÉ NILSON PEREIRA	20
18	ENTI-MA-015	C MARILENE RODRIGUES PEREIRA E SILVA	18
19	ENTI-MA-015	D MOACIR DOS SANTOS PEREIRA	1
20	ENTI-MA-015	E MARCONDES RODRIGUES PEREIRA	17
21	ENTI-MA-016	D EDIVALDO JOSÉ BENICIO	23
22	ENTI-MA-017	A MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS	22
23	ENTI-MA-017	B PAULO PEDRO DA SILVA	25
24	ENTI-MA-019	HERMINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	19
25	ENTI-MA-020	PEDRO JOAQUIM DA SILVA	13
26	ENTI-186=ENT	A JOSÉ ROMILDO QUEIROZ DA CRUZ	4

- Legenda**
- Lotes
 - Área de Expansão
 - Casas
 - Associação de Moradores
 - Campo de Futebol
 - Comercio
 - Escola
 - Posto Médico
 - Praça



CMT Ambiental
engenharia

Base de dados:
Mapa elaborado a partir de do projeto executivo dos canais de transposição das águas do rio São Francisco de janeiro/2010, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69 Fuso 24.

Produzido por: **Audrey Oliveira de Lima** Rubrica: *[assinatura]*
Analista Ambiental

Verificado por: **Fábio Henrique Julião** Rubrica: *[assinatura]*
Analista Ambiental

Desenho nº: **1711-MAP-1VB-94-08-171 R1**

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 08 - PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES

VPR NEGREIOS - NÚCLEO HABITACIONAL

Data: **23/08/2010** Localização: **Eixo Norte -Trecho I - Lote 02**

Folha nº: **01** Revisão nº: **02** Escala: **1:2.500**
