

Plano de Transferência

008/2010

VILA PRODUTIVA RURAL
PILÕES



Projeto
São Francisco
Água a quem tem sede

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO
DE POPULAÇÕES - 08

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE
SETENTRIONAL**

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES - 08

**PLANO DE TRANSFERÊNCIA 008/2010
VILA PRODUTIVA RURAL PILÕES**

Setembro/2010



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO	5
3. PÚBLICO-ALVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	6
5. AÇÕES PROPOSTAS.....	7
6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS.....	8
7. PLANELAMENTO LOGÍSTICO.....	11
8. CRONOGRAMA.....	14
9. ENCAMINHAMENTOS.....	18
10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL.....	19



RELAÇÃO DE QUADROS

Quadro 1. Reassentados da VPR Pilões.	5
Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.	8
Quadro 3. Número de animais por comunidade.	8
Quadro 4. Equipamentos Agrícolas cadastrados.	9
Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.	10
Quadro 6. Cronograma de Mudança.	11
Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.	11
Quadro 8. Quantificação e distribuição de refeições por grupos de pessoas.	12
Quadro 9. Quantificação e estimativa de valores de refeições e descartáveis.	13
Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Pilões.	14



1. INTRODUÇÃO

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias que serão reassentadas na Vila Produtiva Rural – VPR Pilões, uma vez que estas se encontram inseridas na faixa de servidão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, Trecho I, município de Verdejante/PE.

O referido Plano foi elaborado em conformidade com o Programa de Reassentamento de Populações, que prevê em seu item 8.7.2.1, a execução de 09 etapas, sendo que as etapas 4 e 6 abordam, exclusivamente, o processo de transferência, conforme descrito abaixo:

“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência para Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo:

- (i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;*
- (ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser reassentada;*
- (iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote.*
- (v) elaboração do calendário de mudança.*
- (vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento.*

Etapa 6 - Transferências das Famílias

Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo desenvolvidas as seguintes principais atividades:

- (i) deslocamento das famílias;*
- (ii) transferência dos móveis e utensílios;*
- (iii) transporte dos animais domésticos;”*

As atividades previstas nas etapas acima elencadas estão contempladas no Termo de Referência anexo ao Contrato nº 023/2009, celebrado entre o Ministério da Integração



Nacional e a CMT Engenharia Ltda., para a execução e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do PISF, cabendo a CMT executar a preparação e transferência das famílias para as vilas produtivas rurais, com vista à reinserção e organização social e econômica, à consolidação de práticas socioambientais, ao monitoramento e avaliação.

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens, a partir de visita às famílias a serem reassentadas com a aplicação de questionário (ficha cadastral de móveis, utensílios, equipamentos e animais domésticos) com o objetivo de subsidiar o planejamento logístico da transferência.

2. OBJETIVO

O presente Plano objetiva orientar a transferência de 25 (vinte e cinco) famílias residentes nas comunidades Pilões, Sítio São Joaquim, Quixaba, Lagoa do Pajeú, Sítio Gato e Tiririca, localizadas no município de Verdejante - PE, para a Vila Produtiva Rural (VPR) Pilões.

3. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na VPR Pilões, 25 famílias residentes na faixa de obras do Trecho I, que receberão casa e lote agrícola, conforme especificado no Quadro 01.

Quadro 1. Reassentados da VPR Pilões.

Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Benefício	
				Casa	Lote Agrícola
1	ENTI-MI-026	A	FRANCISCO GOMES DA SILVA	1	1
2	ENTI-MI-040	A	LUCILENE PEREIRA LEITE	1	1
3	ENTI-MI-081	B	JUAREZ MATIAS FERREIRA	1	1
4	ENTI-MI-081	E	ANTÔNIO SEVERO DOS SANTOS	1	1
5	ENTI-MI-081	I	JOSÉ FAUSTINO DA SILVA	1	1
6	ENTI-MI-081	L	JOSÉ MATIAS DANTAS NETO	1	1
7	ENTI-MI-082	A	MANOEL TIMÓTEO	1	1
8	ENTI-MI-082	B	ANTÔNIO BEZERRA TIMÓTEO	1	1
9	ENTI-MI-082	D	MARCOS ANTÔNIO PEREIRA BRINGEL	1	1
10	ENTI-MI-082	E	MARIA CEILDE TIMÓTEO	1	1
11	ENTI-MI-085	A	VALDEMIR PEREIRA BRINGEL	1	1

Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Benefício	
				Casa	Lote Agrícola
12	ENTI-MI-087	A	ROSA MARIA DE JESUS (PAULO HENRIQUE)	1	1
13	ENTI-MI-091	B	RONIEDSON ALVES BRINGEL	1	1
14	ENTI-MI-091	C	NEILSON ALVES BRINGEL	1	1
15	ENTI-MI-094		OZANIU IZAIAS DE OLIVEIRA	1	1
16	ENTI-MI-095	B	JUCILENE ALENCAR PEREIRA BRINGEL	1	1
17	ENTI-MI-096	A	MANOEL JOAQUIM PEREIRA	1	1
18	ENTI-MI-100		JOSÉ MATIAS DA SILVA	1	1
19	ENTI-MI-100	A	PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO	1	1
20	ENTI-MI-103	A	MANOEL MARIANO DA SILVA	1	1
21	ENTI-MI-105	B	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO	1	1
22	ENTI-MI-108	B	MARCONDES PACÍFICO DE MELO	1	1
23	ENTI-MI-108	C	MARCELO PACÍFICO DE MELO	1	1
24	ENTI-MI-109	B	JUSSARA ALENCAR PEREIRA	1	1
25	ENTI-MI-127		ANTÔNIA FERREIRA DANTAS	1	1

4. METODOLOGIA

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Programa de Reassentamento de Populações, onde no item 8.7.1 destaca-se a interação comunitária como premissa no processo de transferência das famílias. Este item determina que *“durante a fase de planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas, constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor para encaminhar as reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas.”*

Assim, durante reunião realizada em 03 de dezembro de 2009, foi criada a Comissão de Mudança da VPR Pilões, composta pelos seguintes moradores: Marcondes Pacífico de Melo,

Jucilene Alencar Pereira Bringel, Jussara Alencar Pereira e Manoel Timóteo. Todavia durante o levantamento dos móveis, utensílios e animais domésticos quem acompanhou a equipe da CMT Engenharia foi o Vice-Secretário da Associação, o Sr. Roniedson Alves Bringel.

Para a elaboração deste Plano foram realizadas visitas individuais nas casas das 25 famílias a serem reassentadas para o levantamento de informações sobre bens, utensílios e animais, utilizando, para tanto, questionários estruturados.

As informações levantadas foram tabuladas e sistematizadas, subsidiando a elaboração do planejamento logístico.

5. AÇÕES PROPOSTAS

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações:

- O Ministério da Integração Nacional deverá disponibilizar, uma semana antes da data prevista para a transferência, o acesso prévio das famílias à VPR para limpeza das casas e construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos lotes residenciais.
- A transferência observará o critério de vizinhança, priorizando-se as famílias com idosos, crianças de colo, portadores de necessidades especiais e gestantes;
- Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para a transferência das famílias beneficiadas até a VPR;
- O transporte (carga e descarga) dos bens, utensílios e animais deverá ser acompanhado, de no mínimo, um representante de cada família beneficiada;
- As famílias deverão:
 - ✓ Preparar e encaixotar seus pertences, identificando os frágeis;
 - ✓ Reunir os animais em local adequado para o embarque nos caminhões, no dia agendado para o transporte;
 - ✓ Assinar, através dos seus representantes, o Termo de Recebimento do Imóvel e o Termo de Transferência, bem como o Termo de Negativa de Mudança para aqueles que se negarem a mudar na data estabelecida.
- O Ministério da Integração Nacional deverá:
 - ✓ Instituir uma Comissão de Acompanhamento para apoio às atividades de transferência, que atuará em regime de plantão;



- ✓ Articular com a Prefeitura Municipal de Verdejante - PE e com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco visando garantir atendimento emergencial e segurança para as famílias e os profissionais envolvidos, durante o processo de transferência.

6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS

No levantamento realizado foram cadastrados 88 (oitenta e oito) pessoas, residentes nas comunidades Pilões, Sítio São Joaquim, Quixaba, Lagoa do Pajeú, Sítio Gato e Tiririca, além de animais, equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme quadros a seguir.

Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.

Comunidade	Nº de Família	Nº de Membros da Família			TOTAL DE PESSOAS
		Adultos	Idosos	Crianças	
Zona urbana de Salgueiro	01	04	-	02	06
Zona urbana de Penaforte	02	05	-	01	06
Sítio Pilões	12	23	01	13	37
Sítio São Joaquim	01	01	01	-	02
Sítio Quixaba	01	02	-	04	06
Sítio Pitombeira	01	02	-	01	03
Sítio Gato	06	14	04	08	26
Sítio Tiririca	01	02	-	-	02
TOTAL	25	57	06	33	88

Quadro 3. Número de animais por comunidade.

Comunidade	Caprinos	Ovinos	Felinos	Caninos	Aves	Eqüinos	Bovinos	Suínos	Muare	Total
Salgueiro	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
Pena Forte	-	08	-	-	06	-	01	-	-	15
Sítio Pilões	77	111	09	14	133	03	14	07	02	370
São Joaquim	-	-	-	01	20	-	-	03	-	24
Quixaba	-	08	02	02	20	01	-	03	01	37
Pitombeira	-	-	-	01	15	-	02	01	-	19
Gato	-	32	08	05	83	-	03	01	-	132



Comunidade	Caprinos	Ovinos	Felinos	Caninos	Aves	Equinos	Bovinos	Suínos	Muarees	Total
TOTAL	77	159	19	24	277	04	20	15	03	598

Quadro 4. Equipamentos Agrícolas cadastrados.

Comunidade	Equipamento Agrícola		
	Arado	Pulverizador	TOTAL
Sítio Pilões	1	3	4
Quixaba	1	-	1
Gato	-	1	1
Tiririca	-	-	-
TOTAL	2	4	6



Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.

Comunidade	Geladeira	Freezer / Tanquinho	Fogão	Guarda- Roupas / Sapateira	Sofá	Cama / Berço	Mesa / Centro	Cômoda	Cadeira	Armário	Bicicleta	TV	Som / DVD	Antena	Rack / Estante	Total
Zona urbana de Salgueiro	01	-	01	01	01	03	02	-	06	01	01	01	01	-	-	19
Zona urbana de Penaforte	02	-	02	03	02	04	03	-	14	03	03	02	01	01	01	41
Sítio Pilões	07	01	08	10	15	20	12	03	85	10	14	11	05	07	05	213
Sítio São Joaquim	01	-	01	01	01	04	01	-	10	01	-	01	01	01	-	23
Sítio Quixabá	01	-	01	01	-	02	02	-	12	01	02	01	01	-	-	24
Sítio Pitombeira	01	-	01	01	02	02	02	-	10	01	01	01	-	01	01	24
Sítio Gato	06	-	06	06	01	16	10	05	69	06	02	06	06	02	-	141
Sítio Tiririca	-	-	-	01	-	01	01	-	-	-	-	-	01	-	-	04
TOTAL	19	01	20	24	22	52	33	08	206	23	23	23	16	12	07	489

7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

O planejamento logístico prevê a disponibilização de caminhões com motoristas e ajudantes, veículo de transporte coletivo, lonas, papelão e cordas, de responsabilidade da Comissão Regional de Obras da Sétima Região Militar - CRO-7.

Para a transferência das famílias, móveis, utensílios e animais serão necessários 03 (três) caminhões tipo baú ou carga seca, 01 (um) caminhão tipo gaiola e 01 (um) veículo de transporte coletivo, tipo Van. Serão necessários ainda 12 (doze) ajudantes para realização do carregamento e descarregamento dos utensílios, móveis e animais.

A transferência das 25 famílias será realizada em 03 (três) dias, conforme Quadro 6 a seguir.

Quadro 6. Cronograma de Mudança.

COMUNIDADE	1º Dia	2º Dia	3º Dia
Sítio São Joaquim	1 família		
Sítio Gato	6 famílias		
Zona urbana de Salgueiro	1 família		
Sítio Quixaba	1 família		
Sítio Pilões		9 famílias	3 famílias
Zona urbana de Penaforte			2 famílias
Sítio Pitombeira			1 família
Sítio Tiririca			1 família
TOTAL DE FAMÍLIAS POR DIA	09	09	07

Para o plantão de apoio às famílias durante o processo de transferência sugere-se a participação de técnicos do MI, CRO/7 e CMT Engenharia, conforme Quadro 7 a seguir.

Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.

INSTITUIÇÃO / PERFIS PROFISSIONAIS	Nº DE INTEGRANTES	PRINCIPAIS AÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - Socioeconomia	02	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e

INSTITUIÇÃO / PERFIS PROFISSIONAIS	Nº DE INTEGRANTES	PRINCIPAIS AÇÕES
		solucionar os possíveis problemas, fornecendo ainda, informações institucionais.
CRO/7 – Coordenação de obras, Equipe de Apoio, Eletricista e Bombeiro Hidráulico	16	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Organizar e acompanhar as frentes de mudança desde o carregamento na origem até a recepção na vila produtiva rural; Fornecer alimentação e organizar a distribuição para as famílias; Realizar manutenção em instalações elétricas e hidráulicas que necessitem de reparos;
CMT Engenharia – Socioeconomia, Comunicação Social e Educação Ambiental	08	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Acompanhar as frentes de mudança desde o carregamento na origem até a recepção na vila produtiva rural; Prestar orientação às famílias sobre boas práticas intradomiciliares à medida que forem se instalando nas residências; Realizar o registro fotográfico do processo de transferência.
TOTAL		26

A Comissão de Acompanhamento da Transferência poderá se instalar no prédio destinado à associação da VPR para execução de suas atividades, necessitando para tal de mesas e cadeiras.

No dia da transferência deverá ser fornecida alimentação para todos os membros das famílias e profissionais envolvidos, conforme quadros a seguir.

Quadro 8. Quantificação e distribuição de refeições por grupos de pessoas.

Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Reassentados	88	01	01	02	88	176
Motorista Caminhão	04	03	01	02	12	24
Motorista do Van	01	03	01	02	03	06



Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Ajudantes para Caminhão	12	03	01	02	36	72
Motorista da CMT	03	03	01	02	09	18
Equipe Técnica CMT, MI E CRO-07	26	03	01	02	78	156
Total					226	452
Margem de Segurança 10%					249	497

Quadro 9. Quantificação e estimativa de refeições e descartáveis.

Refeição/Descartáveis	Quantidade (Und.)
Lanche (manhã e tarde)	497
Almoço	249
Água (garrafa de 1,5 L)	300
Copos descartáveis	2000 (20 pacotes)
Talheres descartáveis (garfos e facas)	500 (5 pacotes)
Papel Toalha	15 pacotes
Refrigerantes de 02 Litros	75
Sacos de lixo de 100 litros	05 pacotes



8. CRONOGRAMA

Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Pilões.

Comunidade	Dia e Quantidade de Família a ser transferida	Caminhão	Nome das Famílias	Horário	Membros	Animais	Observação
Sítio São Joaquim	1º Dia: 9 famílias	CA 1	Antonia Ferreira Dantas	08h00mim	02	01 Canino	
						20 Aves	
03 Suíno							
Sítio Gato		CA2	José Faustino da Silva	08h00mim	03	07 Felinos	
						20 Aves	
						-	
		CA1 CG	Antônio Severo	10h00mim	03	01 Canino	
						21 Ovinos	
		CA2	Manoel Timóteo	10h00mim	05	01 Felino	
	02 Caninos						
23 Aves							
CA3 CG	Antônio Bezerra Timóteo	10h00mim	06	01 Canino			
				10 Ovinos			
10 Aves							
CA1 CG	Marcos Antônio Pereira Bringel	13h00mim	03	03 Bovinos			
				01 Canino			
				01 Ovino			

Comunidade	Dia e Quantidade de Família a ser transferida	Caminhão	Nome das Famílias	Horário	Membros	Animais	Observação
Zona Urbana de Salgueiro		CA2	Juarez Matias Ferreira	13h00mim	06	01 Canino	Rua Valdemar Menezes 1252.
Sítio Quixaba		CA3 CG	Francisco Gomes da Silva	13h00mim	06	02 Felinos 02 Caninos 01 Eqüino 08 Ovinos 20 Aves 01 Muare 03 Suíno	
Sítio Pilões	2º Dia: 9 famílias	CA1 CG	Jussara Alencar Pereira	08h00mim	08	03 Caprinos 02 Caninos 01 Eqüino 20 Ovinos 15 Aves 01 Muare 03 Suíno	
		CA2 CG	José Matias da Silva	08h00mim	01	01 Canino 06 Ovinos 05 Aves 01 Muare	
		CA3	Marcelo Pacífico de Melo	08h00mim	03	04 Felinos 02 Caninos	

Comunidade	Dia e Quantidade de Família a ser transferida	Caminhão	Nome das Famílias	Horário	Membros	Animais	Observação
		CA1	Valdemir Pereira Bringel	10h00mim	04		
		CA2 CG	Roniedson Alves Bringel	10h00mim	01	05 Bovinos	
						07 Caprinos	
						01 Felino	
						01 Canino	
						01 Eqüino	
		30 Ovinos					
CA2	Neilson Alves Bringel	10h00mim	01				
CA3 CG	Ozaniu Izaías de Oliveira (Maria Aparecida Oliveira)	10h00mim	03	02 Caninos			
				10 Ovinos			
	40 Aves						
CA1 CG	Jucilene Alencar Pereira Bringel	13h00mim	03	06 Bovinos			
				60 Caprinos			
				01 Felino			
				01 Canino			
10 Aves							
CA2	Maria do Socorro da Conceição	13h00mim	03	01 Felino			
				01 Canino			
				03 Aves			
Sítio Pilões	3º Dia 7 famílias	CA3 CG	Paulo José Matias Barreto	08h00mim	06	03 Caprinos	
						02 Felinos	
						15 Ovinos	



Comunidade	Dia e Quantidade de Família a ser transferida	Caminhão	Nome das Famílias	Horário	Membros	Animais	Observação
						10 Aves	
		CA1	Manoel Joaquim Pereira	08h00mim	01		
		CA2	Marcondes Pacífico de Melo	08h00mim	03	03 Bovinos 04 Caprinos 04 Caninos 01 Equino 30 Ovinos 50 Aves 04 Suínos	
Zona Urbana de PENAFORTE		CA3	Manoel Mariano da Silva	10h00mim	03	06 Aves	Rua Professora Francisca Ferreira Rocha.
		CA1 CG	Rosa Maria de Jesus	10h00mim	03	01 Bovinos 08 Ovinos	Rua Manoel Ângelo Nº 89.
Sítio Pitombeira		CA2 CG	Lucilene Pereira Leite	10h00mim	03	02 Bovinos 01 Canino 15 Aves 01 Suíno	
Sítio Tiririca		CA3	Maria Ceilda Timóteo	13h00mim	02		

9. ENCAMINHAMENTOS

Para viabilizar a execução deste Plano de Transferência é necessário que o MI adote as seguintes providências:

- Aprovar este Plano de Transferência e o cronograma de mudança, definindo os responsáveis pela realização das despesas decorrentes de sua execução;
- Apresentar o Plano para as famílias, prestando esclarecimentos sobre as condições para a transferência e pactuando sua execução.
- Solicitar apoio à Prefeitura de Verdejante - PE para atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel.
- Solicitar apoio à Polícia Militar do Estado de Pernambuco para garantia da segurança das famílias e profissionais envolvidos, durante o processo de transferência;
- Instituir a Comissão de Acompanhamento da Transferência, solicitando à CRO-7 e a CMT Engenharia a indicação de seus representantes, observando os perfis profissionais descritos no Quadro 7 deste Plano;
- Verificar a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de entrega da Vila Produtiva Rural à comunidade.




10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL



Fábio Henrique Julião dos Santos
Gestor Ambiental
Analista Ambiental



Geraldo Barboza de Oliveira Junior
Antropólogo
Analista Ambiental




Adriana Nascimento de Oliveira
Técnico Agropecuária
Técnico Ambiental

Visto:



Mariana Veríssimo Pacheco
Engenheira Agrônoma - Inspetora
Ambiental

De acordo:



Rômulo Rogério J. Mascarenhas
Eng.º Ambiental – CREA113487D-TO
Coordenador Setorial – Salgueiro/PE




Alexandre Tadeu M. Rodrigues
Geógrafo – CREA 92766/D-TO
Coordenador de Campo



Anexo I - LAYOUT DO NÚCLEO HABITACIONAL




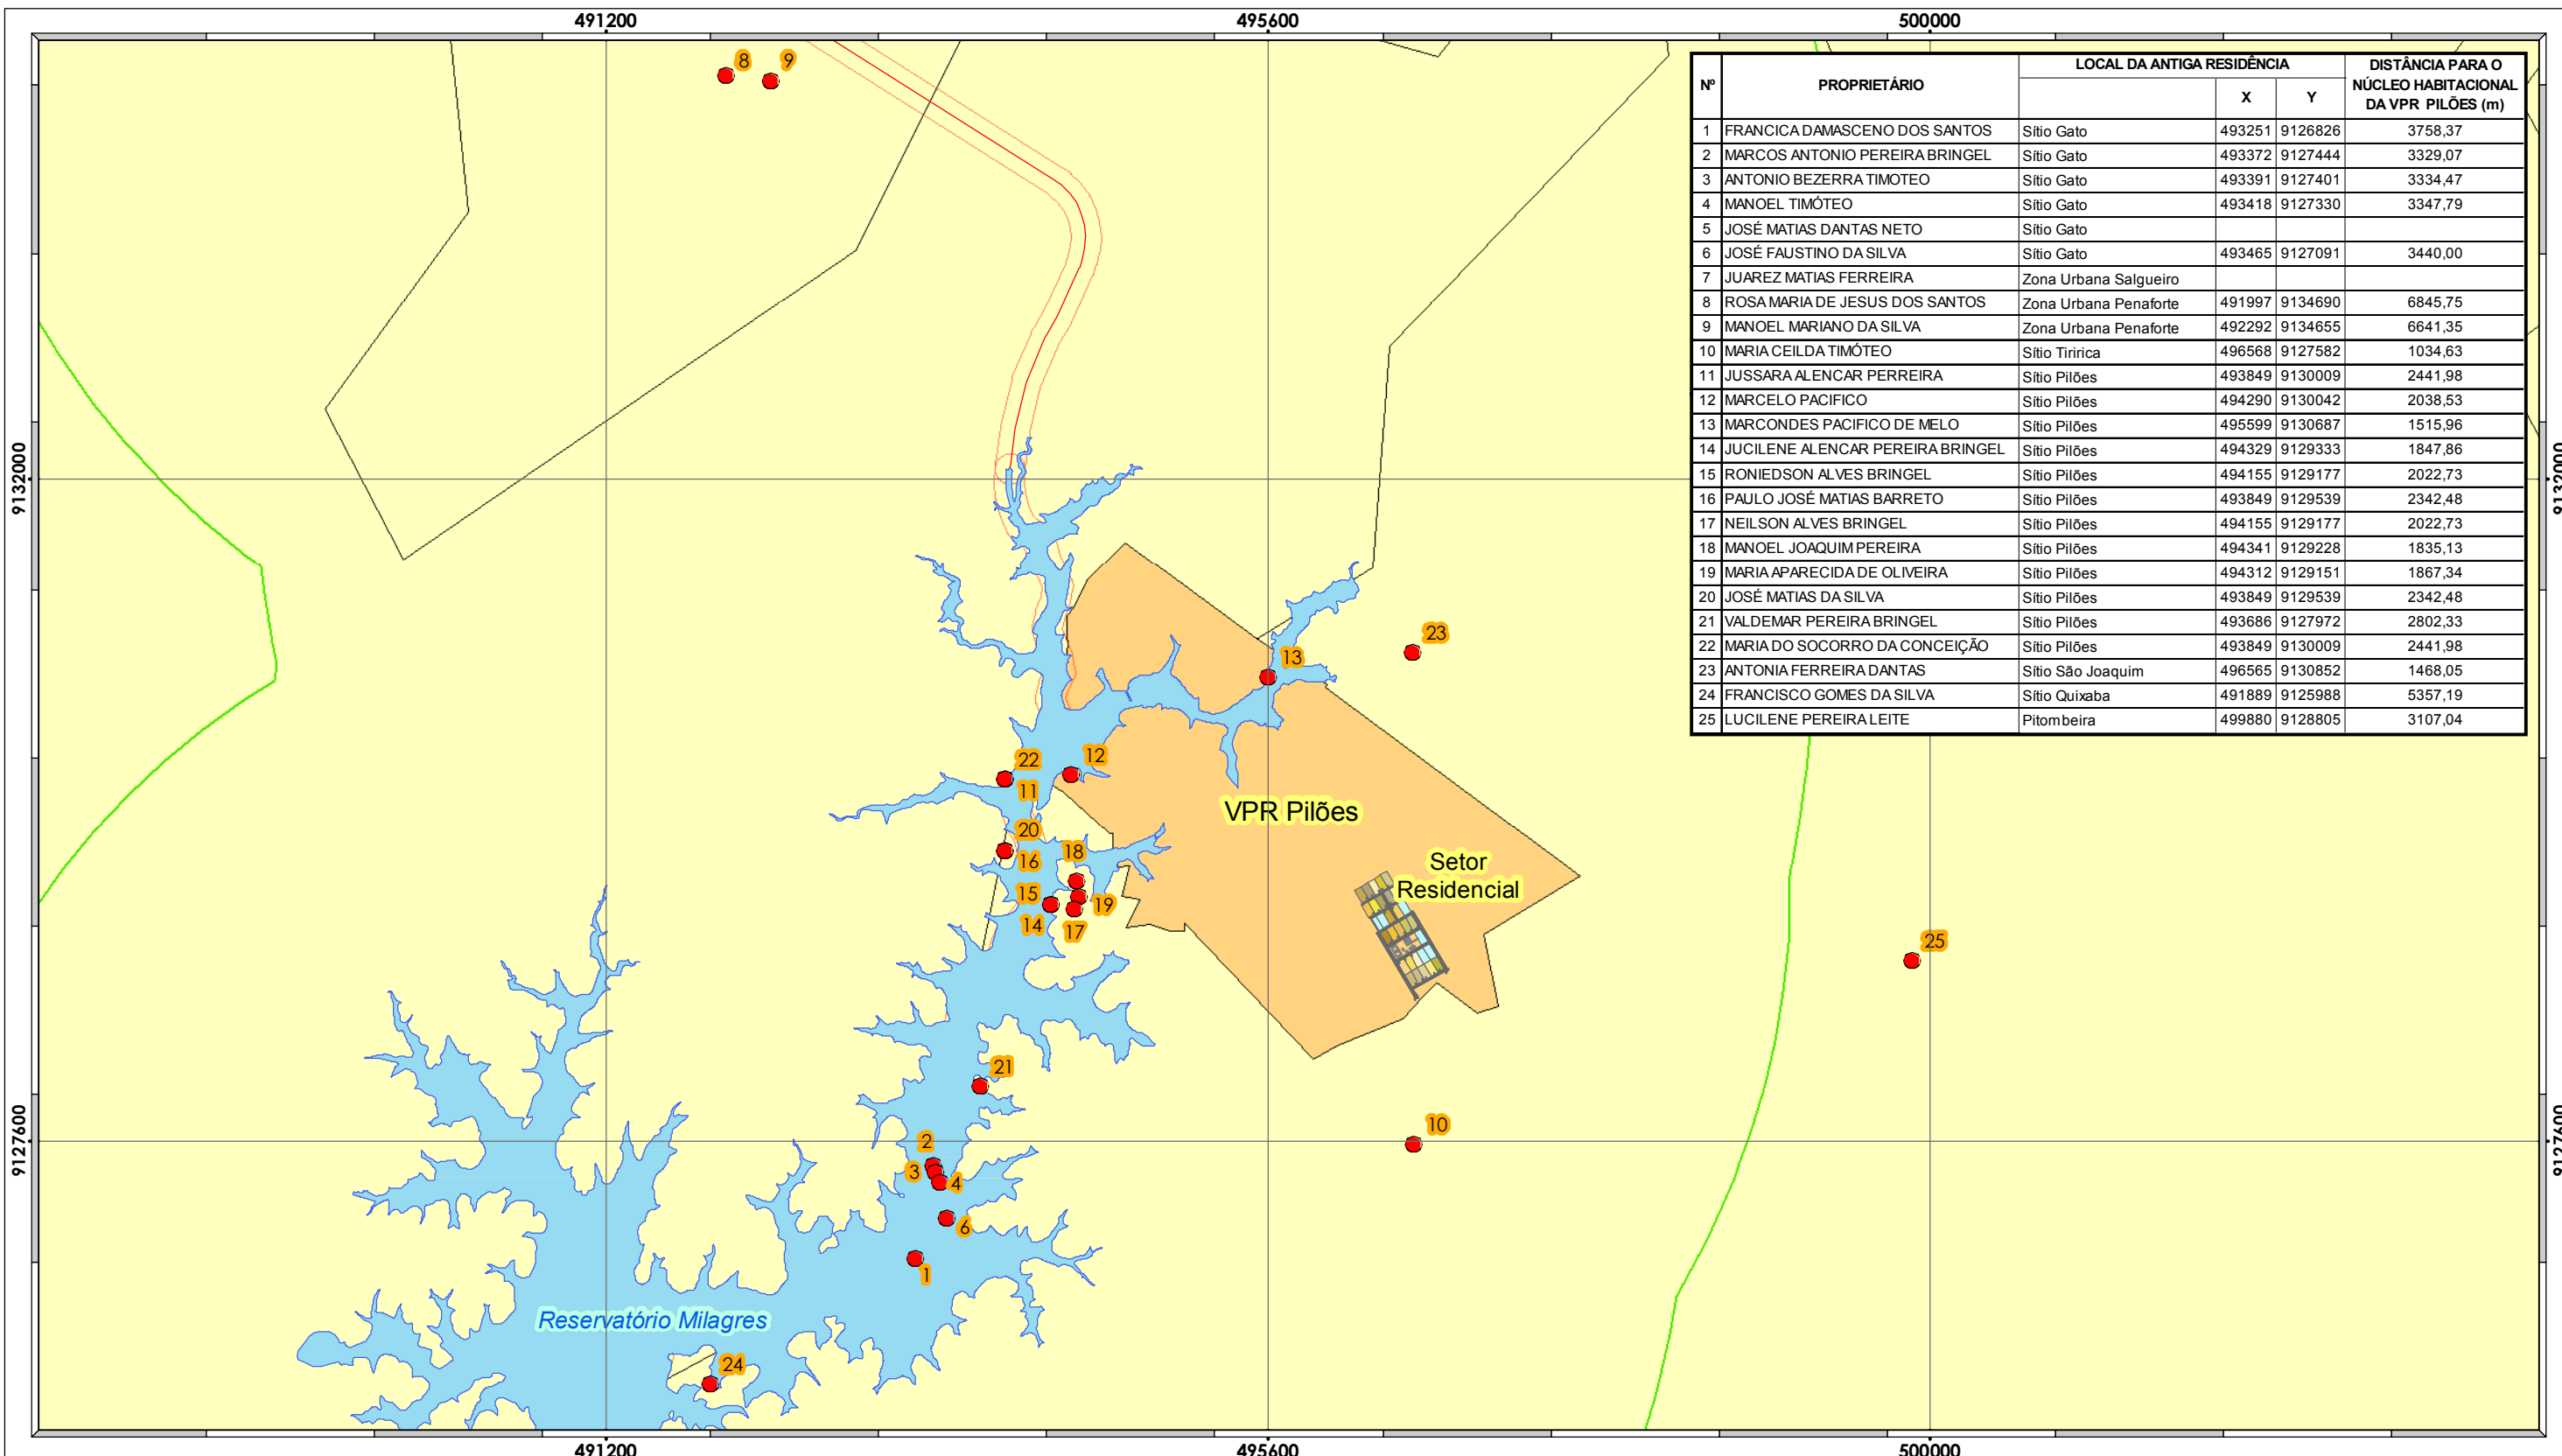


Nº	PROPRIETÁRIO	LOCAL DA ANTIGA RESIDÊNCIA		DISTÂNCIA PARA O NÚCLEO HABITACIONAL DA VPR PILÕES (m)	
			X		Y
1	FRANCICA DAMASCENO DOS SANTOS	Sítio Gato	493251	9126826	3758,37
2	MARCOS ANTONIO PEREIRA BRINGEL	Sítio Gato	493372	9127444	3329,07
3	ANTONIO BEZERRA TIMÓTEO	Sítio Gato	493391	9127401	3334,47
4	MANOEL TIMÓTEO	Sítio Gato	493418	9127330	3347,79
5	JOSÉ MATIAS DANTAS NETO	Sítio Gato			
6	JOSÉ FAUSTINO DA SILVA	Sítio Gato	493465	9127091	3440,00
7	JUAREZ MATIAS FERREIRA	Zona Urbana Salgueiro			
8	ROSA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	Zona Urbana Penaforte	491997	9134690	6845,75
9	MANOEL MARIANO DA SILVA	Zona Urbana Penaforte	492292	9134655	6641,35
10	MARIA CEILDA TIMÓTEO	Sítio Tiririca	496568	9127582	1034,63
11	JUSSARA ALENCAR PERREIRA	Sítio Pilões	493849	9130009	2441,98
12	MARCELO PACIFICO	Sítio Pilões	494290	9130042	2038,53
13	MARCONDES PACIFICO DE MELO	Sítio Pilões	495599	9130687	1515,96
14	JUCILENE ALENCAR PEREIRA BRINGEL	Sítio Pilões	494329	9129333	1847,86
15	RONIEDSON ALVES BRINGEL	Sítio Pilões	494155	9129177	2022,73
16	PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO	Sítio Pilões	493849	9129539	2342,48
17	NEILSON ALVES BRINGEL	Sítio Pilões	494155	9129177	2022,73
18	MANOEL JOAQUIM PEREIRA	Sítio Pilões	494341	9129228	1835,13
19	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Sítio Pilões	494312	9129151	1867,34
20	JOSÉ MATIAS DA SILVA	Sítio Pilões	493849	9129539	2342,48
21	VALDEMAR PEREIRA BRINGEL	Sítio Pilões	493686	9127972	2802,33
22	MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO	Sítio Pilões	493849	9130009	2441,98
23	ANTONIA FERREIRA DANTAS	Sítio São Joaquim	496565	9130852	1468,05
24	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Sítio Quixaba	491889	9125988	5357,19
25	LUCILENE PEREIRA LEITE	Pitombeira	499880	9128805	3107,04

Legenda

- Local da Antiga Residência
- Eixo Norte - Trecho I
- Reservatórios
- ADA
- VPR Pilões



Projeção Universal Transversa de Mercator
Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W. Gr
acrescida das constantes N 10.000km E 500km
Datum horizontal : SAD-69



Base de dados:

Mapa elaborado a partir de do projeto executivo dos canais de transposição das águas do rio São Francisco de janeiro/2010, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69 Fuso 24.

Produzido por: **Audrey Oliveira de Lima**
Analista Ambiental

Rubrica:

Verificado por: **Fábio Henrique Julião**
Analista Ambiental

Rubrica:

Desenho nº: **1711-MAP-1VF-94-08-190 R1**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 08 - PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES

VPR PILÕES - PLANO DE TRANSFÊRENCIA

Data: **20/09/2010**

Localização: **Eixo Norte - Trecho I - Lote 04**

Folha nº: **01**

Revisão nº: **01**

Escala: **1:44.000**
