CNEC WorleyParsons resources & energy

Cronograma Ações Antecipatórias - cond. 2.10 da LP nº 342/2010
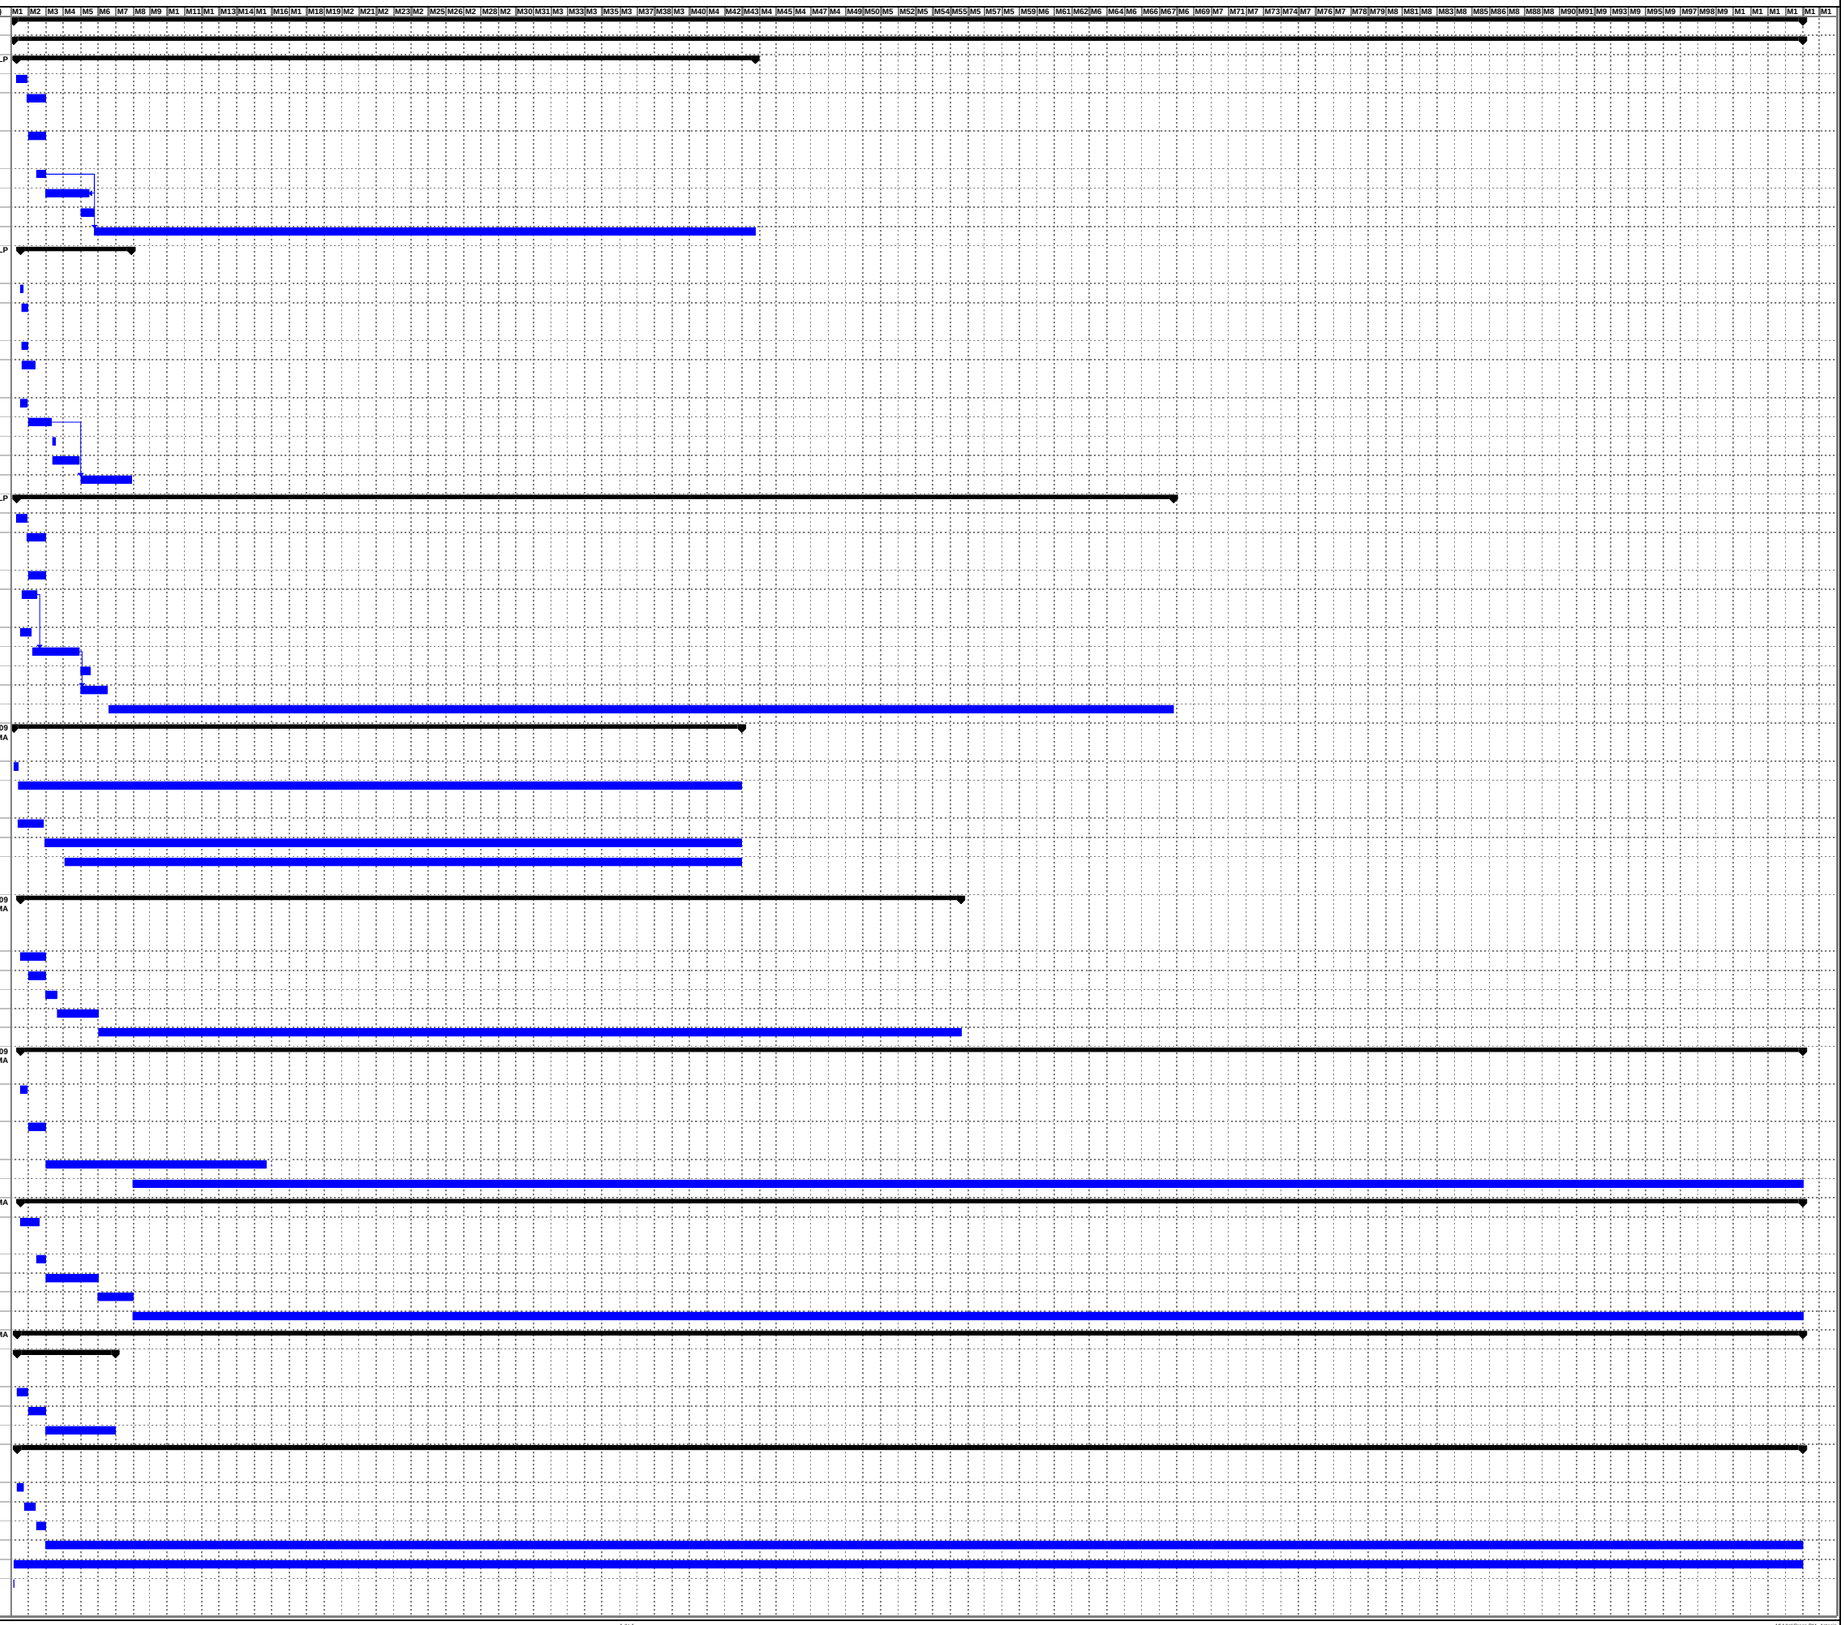
Id	Nome da tarefa	Ref. Doc. (EIA/LP)
1	AHE BELO MONTE	
2	1.1 AÇÕES ANTECIPATÓRIAS	
3	1.1.1 Iniciar a Construção e Reforma de Equipamentos de Educação e Saúde	cond. 2.9 LP
4	Articulação com Prefeituras e Secretaria Estadual de Saúde e de Educação	
5	Trabalhos de planejamento de oferta/demanda com a atualização do diagnóstico das necessidades	
6	Estabelecer diretrizes para elaboração de projetos para novos equipamentos e reformas a serem implementadas	
7	Consolidação de relatório temático com avais pertinentes	
8	Elaboração de projeto arquitetônico/hidráulico/elétrico	
9	Especificar a contratação das obras e contratar empresa executora	
10	Executar obras	
11	1.1.2 Implantação dos Sistemas de Saneamento Básico em Belo Monte e Belo Monte do Pontal	cond. 2.9 LP
12	Articulação com Prefeituras e COSANPA	
13	Trabalhos de planejamento de oferta/demanda com a atualização do diagnóstico das necessidades	
14	Elaboração de diretrizes para levantamentos e projetos dos sistemas de saneamento	
15	Levantamentos topográficos específicos e localizados com o cadastro dos sistemas existentes (restituição 1:2000, curva de metro em metro)	
16	Elaboração dos Planos Diretores de Saneamento	
17	Elaboração dos Projetos Básicos	
18	Aprovação ambiental	
19	Especificar a contratação das obras e contratar empresa executora	
20	Executar obras	
21	1.1.3 Iniciar as Obras de Saneamento Básico em Altamira e Vitória do Xingu	cond. 2.9 LP
22	Articulação com Prefeituras e COSANPA	
23	Trabalhos de planejamento de oferta/demanda com a atualização do diagnóstico das necessidades	
24	Elaboração de diretrizes para levantamentos e projetos dos sistemas de saneamento	
25	Levantamentos topográficos específicos e localizados e cadastro dos sistemas existentes (restituição 1:2000, curva de metro em metro)	
26	Elaboração dos Planos Diretores de Saneamento	
27	Elaboração dos Projetos Básicos	
28	Aprovação ambiental	
29	Especificar a contratação das obras e contratar empresa executora	
30	Executar obras	
31	1.1.4 Capacitação profissional da mão de obra regional, visando sua adequação à demanda de mão de obra do empreendimento	Of. 1251/2009 DILIC/IBAMA
32	Avaliação da demanda x oferta da mão de obra regional	
33	Implantação do balcão de atendimento para informação de oportunidades de contratação e cadastramento de mão de obra	
34	Estabelecer conteúdo dos cursos e formalizar convênios com entidades pertinentes	
35	Início dos cursos de capacitação de mão de obra	
36	Disponibilizar os bancos de dados dos profissionais capacitados para construtoras e para outros sistemas de alocação de mão de obra	
37	1.1.5 Ações articuladas de apoio ao desenvolvimento sustentável, identificando as cadeias produtivas regionais que poderão ser implementadas em função de potencialidades e oportunidades criadas pelo empreendimento	Of. 1251/2009 DILIC/IBAMA
38	Trabalho de campo para identificação das potencialidades locais	
39	Definição de instrumentos de fomento à melhoria ou à criação de novos negócios	
40	Elaboração de minutas das formas de cooperação com as entidades parceiras	
41	Celebração das formas de cooperação com as entidades parceiras	
42	Implementação dos instrumentos de fomento	
43	1.1.6 Ações de apoio e incentivo ao empresariado regional, para fins de atendimento da demanda por produtos e serviços do empreendimento	Of. 1251/2009 DILIC/IBAMA
44	Estabelecer junto à Engenharia de Projeto os produtos e serviços que poderão ser contratados regionalmente	
45	Estabelecer parcerias com Associações Comerciais e Industriais Locais divulgando as oportunidades de fornecimento	
46	Implementar cadastramento/fornecedores junto ao Construtor	
47	Coleta de evidências de contratações de fornecedores locais ou regionais	
48	1.1.7 Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos	51/2009 DILIC/IBAMA
49	Detalhamento dos indicadores, cronograma e metodologia aplicáveis aos diferentes tipos de monitoramento	
50	Identificação de entidades de pesquisa para desenvolvimento do Programa	
51	Celebração das formas de cooperação com as entidades de pesquisa	
52	Definição da arquitetura do banco de dados para suporte ao monitoramento	
53	Alimentação do banco de dados	
54	1.1.8 Outras Ações Antecipatórias	51/2009 DILIC/IBAMA
55	Estudo de avaliação de oportunidades de desenvolvimento de atividades ligadas à cultura regional	
56	Identificação das atividades ligadas à cultural regional	
57	Estabelecimento de diretrizes para o estudo	
58	Elaboração do estudo	
59	Efetivar processo de negociação com os municípios visando à assinatura de compromisso formal para a implantação de PSF para atendimento de 100% da população	
60	Articulação com Prefeituras e Secretarias Municipais e Estadual de Saúde	
61	Elaboração de Plano de Trabalho de acordo com diretrizes do Ministério da Saúde	
62	Celebração de Convênios e Instrumentos Congêneres	
63	Implementação dos convênios	
64	1.1.9 Comunicação e Interação Social	
65	Nota : a responsabilidade administrativa e financeira para a implementação das ações é de responsabilidade da NORTE ENERGIA S/A
