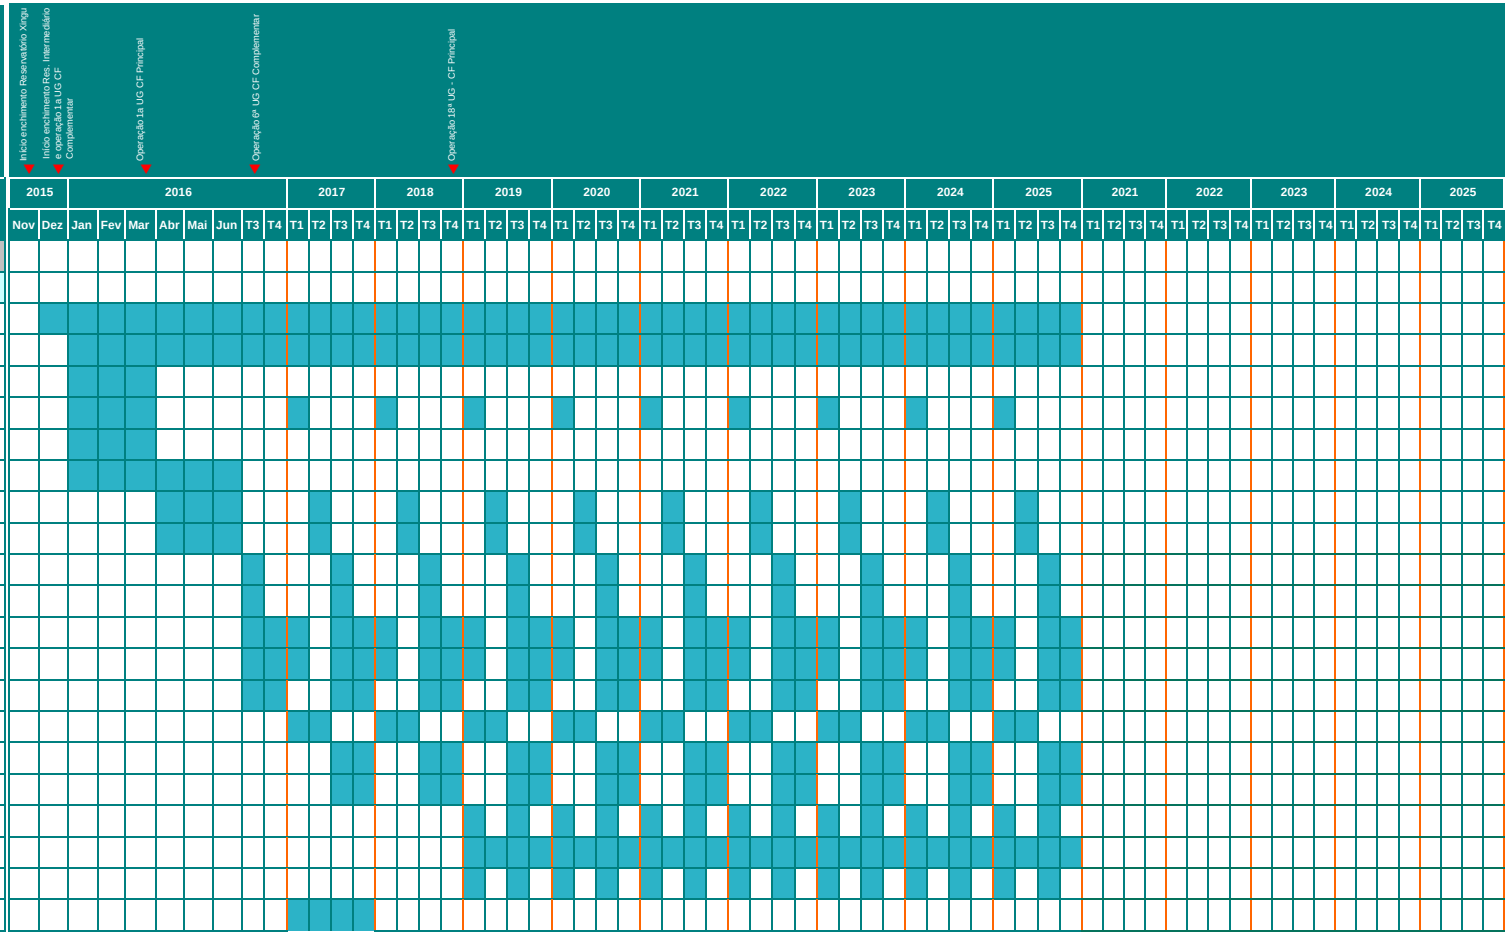Item	Descrição
	CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO
	15 PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DOS RESERVATÓRIOS - PACUERA
1	**Programa de Gestão Ambiental e Sócio Patrimonial**
2	**Programa de Recomposição da Cobertura Vegetal da APP Variável dos Reservatórios da UHE Belo Monte**
2,1	Estruturação da Equipe
2,2	Definição das áreas à recuperar
2,3	Elaboração do Projeto
2,4	Encaminhamento / IBAMA / Aprovação
2,5	Termo de referência para contratação
2,6	Contratação / Mobilização
2,7	Aquisição de insumos
2,8	Montagem do Viveiro
2,9	Produção de mudas
2,1	Demarcação das áreas alvo
2,11	Preparo da área
2,12	Adubação e Plantio
2,13	Aceiramento
2,14	Cercamento das áreas alvo
2,15	Monitoramento
2,16	Manutenção
2,17	Relatórios
3	**Estudos de Viabilidade para a Implantação de Parques Aquícolas nos Reservatórios do Xingu e Intermediário**
