DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FLORESTAIS
Plano de Ação 2011

Inspeção de Encosta no Platô Aramã, para verificar as condições das encostas antes de iniciar as operações de lavra.

ITEM	O QUÊ	QUEM		JULHO					AGOSTO														
				25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	15/8	16/8	17/8	18/9	19/8
1	Definir pessoal e veículos para fazer a inspeção e planejar a logistica.	Saulo/GMF	P	10																			
			R	10																			
2	Levantar mapas do platô com o sistema de drenagem que o contornam.	Saulo/GMF	P	10																			
			R	10																			
3	Levantar pontos para facilitar a localização do andamente da inspeção.	Charles/Jesiel/ Hamad	P	10																			
			R	10																			
4	Executar a inspeção da borda Norte.	Charles/Jesiel/ Hamad	P													10	10	10	10	10			
			R													10	10	10	10	5	5		
5	Executar a inspeção da borda Oeste.	Charles/Jesiel/ Hamad	P							10	10												
			R							10	10												
6	Executar a inspeção da borda Sul.	Charles/Jesiel/ Hamad	P								10	10	10	10									
			R	R	R	R					10	10	10	10									
7	Executar a inspeção da borda Leste.	Charles/Jesiel/ Hamad	P												10								
			R	R	R	R									5	5							
8	Emitir relatório verbal da inspeção e notificar os pontos de erosão encontrados, identificar, georeferência e fotografar.	Charles/Jesiel/ Hamad	P							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			R							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
9	Vistoriar os pontos encontrados.	GMF	P																				
			R																				
10	Comunicar a GM e GSA.	GMF	P																		10		
			R																		10		
11	Emitir relatório das ocorrências encontradas.	GMF	P																			10	10
			R																			10	10
			P																				
			R																				
			P																				
			R																				
			P																				
			R																				
			P																				
			R																				

Recomendações:
1 - Andar sempre em dupla;
2 - Comunicar a Brigada da localização dos serviços;
3 - Utilizar rádio portátil e veículo com rádio fixo.

CHECK

		25/7	26/7	27/7	28/7	29/7	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	15/8	16/8	17/8	18/9	19/8
	P	30	0	0	0	0	0	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	10	10
	R	30	0	0	0	0	0	20	20	10	10	10	10	20	20	20	20	15	25	10	10
Dados do gráfico	P	30	30	30	30	30	30	50	70	80	90	100	110	130	150	170	190	210	230	240	250
	R	30	30	30	30	30	30	50	70	80	90	100	110	130	150	170	190	205	230	240	250
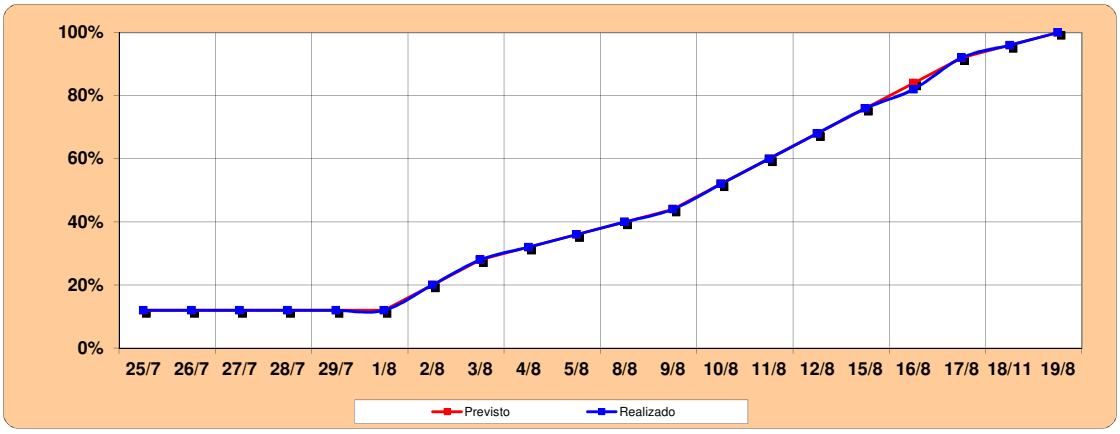
Dia/mês	Previsto		Realizado	
	No mês	% Acum	No mês	% Acum
25/7	30	12	30	12
26/7	30	12	30	12
27/7	30	12	30	12
28/7	30	12	30	12
29/7	30	12	30	12
1/8	30	12	30	12
2/8	50	20	50	20
3/8	70	28	70	28
4/8	80	32	80	32
5/8	90	36	90	36
8/8	100	40	100	40
9/8	110	44	110	44
10/8	130	52	130	52
11/8	150	60	150	60
12/8	170	68	170	68
15/8	190	76	190	76
16/8	210	84	205	82
17/8	230	92	230	92
18/11	240	96	240	96
19/8	250	100	250	100
