Id	Numeração	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
1	**1**	**MPK Macro Planejamento**	**41 meses**	
2	1.1	Obtenção da Licença de Instalação	0 meses	
3	1.2	Mobilização	6 meses	2TI+1 mês
4	1.3	Desmobilização	6 meses	6TI+1 mês;7TI
5	1.4	Comissionamento	6 meses	6TI+1 mês;7TI
6	1.5	Estações de Superfície	29 meses	3TI+1 mês
7	**1.6**	**Mineroduto (linha tronco)**	**29 meses**	
8	**1.6.1**	**Trecho km-00 ao km-099**	**29 meses**	
9	1.6.1.1	Terraplenagem	22 meses	3TI+1 mês
10	1.6.1.2	Montagem Duto	17 meses	9II+6 meses
11	**1.6.1.3**	**Revegetação**	**25 meses**	
12	1.6.1.3.1	Revegetação de Taludes	23 meses	9II+2 meses
13	1.6.1.3.2	Revegetação de ADME's	23 meses	9II+2 meses
14	1.6.1.3.3	Sistema de Drenagem	23 meses	9II+2 meses
15	1.6.1.3.4	Revegetação - Faixa de Trabalho	19 meses	9II+8 meses
16	1.6.1.4	Teste e Condicionamento	6 meses	10II+17 meses
17	**1.6.2**	**Trecho km-100 ao km-199**	**29 meses**	
18	1.6.2.1	Terraplenagem	22 meses	3TI+1 mês
19	1.6.2.2	Montagem Duto	17 meses	18II+6 meses
20	**1.6.2.3**	**Revegetação**	**25 meses**	
21	1.6.2.3.1	Revegetação de Taludes	23 meses	18II+2 meses
22	1.6.2.3.2	Revegetação de ADME's	23 meses	18II+2 meses
23	1.6.2.3.3	Sistema de Drenagem	23 meses	18II+2 meses
24	1.6.2.3.4	Revegetação - Faixa de Trabalho	19 meses	18II+8 meses
25	1.6.2.4	Teste e Condicionamento	6 meses	19II+17 meses
26	**1.6.3**	**Trecho km-200 ao km-299**	**29 meses**	
27	1.6.3.1	Terraplenagem	22 meses	3TI+1 mês
28	1.6.3.2	Montagem Duto	17 meses	27II+6 meses
29	**1.6.3.3**	**Revegetação**	**25 meses**	
30	1.6.3.3.1	Revegetação de Taludes	23 meses	27II+2 meses
31	1.6.3.3.2	Revegetação de ADME's	23 meses	27II+2 meses
32	1.6.3.3.3	Sistema de Drenagem	23 meses	27II+2 meses
33	1.6.3.3.4	Revegetação - Faixa de Trabalho	19 meses	27II+8 meses
34	1.6.3.4	Teste e Condicionamento	6 meses	28II+17 meses
35	**1.6.4**	**Trecho km-300 ao km-395**	**29 meses**	
36	1.6.4.1	Terraplenagem	22 meses	3TI+1 mês
37	1.6.4.2	Montagem Duto	17 meses	36II+6 meses
38	**1.6.4.3**	**Revegetação**	**25 meses**	
39	1.6.4.3.1	Revegetação de Taludes	23 meses	36II+2 meses
40	1.6.4.3.2	Revegetação de ADME's	23 meses	36II+2 meses
41	1.6.4.3.3	Sistema de Drenagem	23 meses	36II+2 meses
42	1.6.4.3.4	Revegetação - Faixa de Trabalho	19 meses	36II+8 meses
43	1.6.4.4	Teste e Condicionamento	6 meses	37II+17 meses

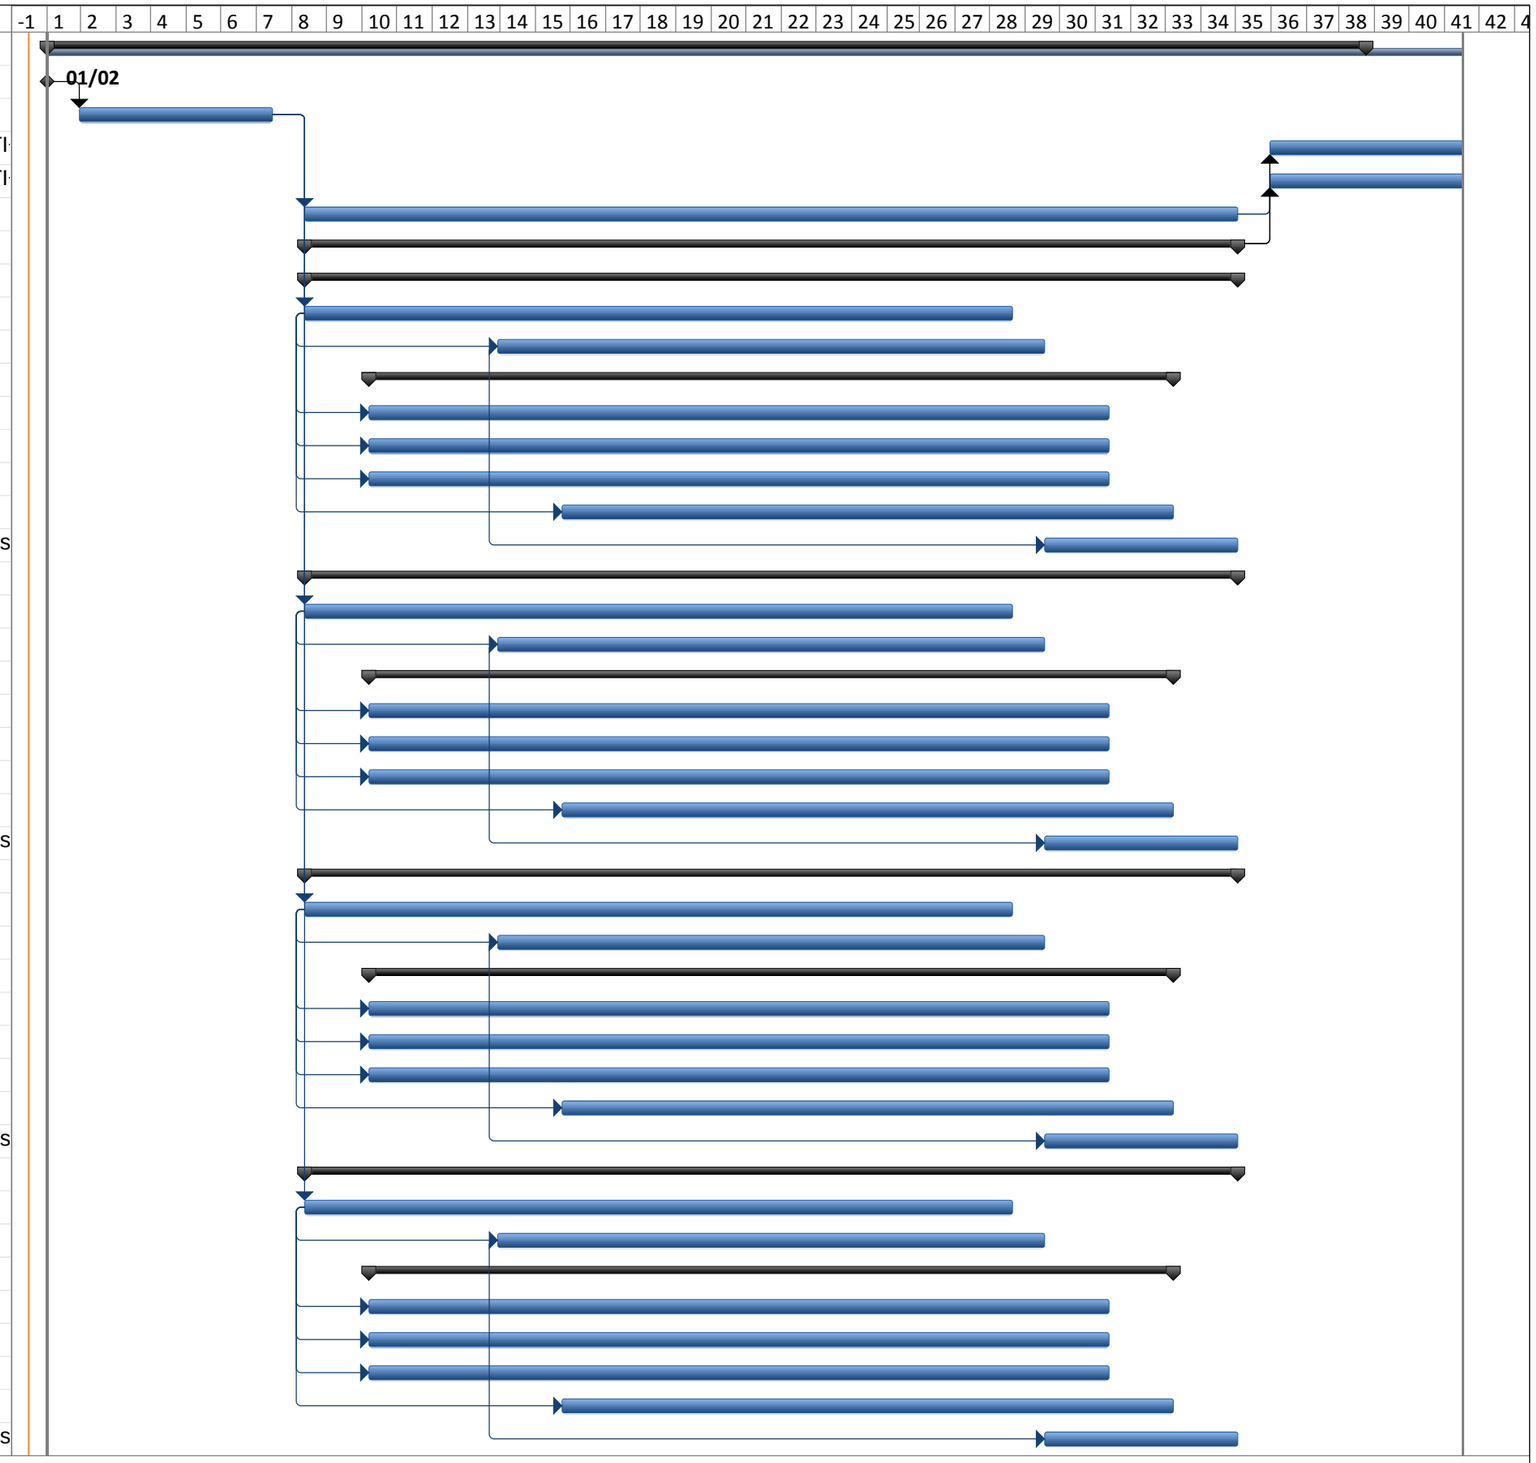

Projeto: MINERODUTO FERROUS
Empreendedor: Ferrous Resources do Brasil S/A
Data: Seg 16/01/12

Tarefa		Tarefas externas		Tarefa Manual		Somente término	
Divisão		Etapa externa		Somente duração		Data limite	
Etapa		Tarefa Inativa		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo		Etapa Inativa		Resumo Manual			
Resumo do projeto		Resumo Inativo		Somente início			
