DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES FLORESTAIS
Plano de Ação 2009

Serviços de intalação de drenos necessários para garantir drenagem das Minas Saracá Oeste.

ITEM	O QUÊ	QUEM		2009											
				jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	Instalação da tubulação SW 04 (borda Norte)	TMF / Hamad	P			10									
			R			10									
2	Instalação da tubulação SW 05 (borda Sul)	TMF / Hamad	P		10										
			R		10										
3	Instalação da tubulação SW 06 (borda Norte)	TMF / Hamad	P										10		
			R										5	5	
4	Instalação da tubulação SW 07 (borda Sul)	TMF / Hamad	P										10		
			R										5	5	
5	Instalação da tubulação SW 08 (borda Norte)	TMF / Hamad	P											10	
			R												
6	Instalação da tubulação SW 09 (borda Sul)	TMF / Hamad	P											10	
			R											10	
			P												
			R												
			P												
			R												
			P												
			R												
			P												
			R												
			P												
			R												
			P												
			R												
			P												
			R												
			P												
			R												

Recursos necessários:
1 - Definir local do dissipador (PDG/PDCT)
2 - Transportar tubulação para o local
3 - Montar e transporta tela de gabião, granulado e bidin.
4 - Disponibilizar escavadeira e trator de esteiras.

CHECK

Dados do gráfico		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	P	0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	R	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	20	0
	P	0	10	20	20	20	20	20	20	20	40	60	60
	R	0	10	20	20	20	20	20	20	20	30	50	50
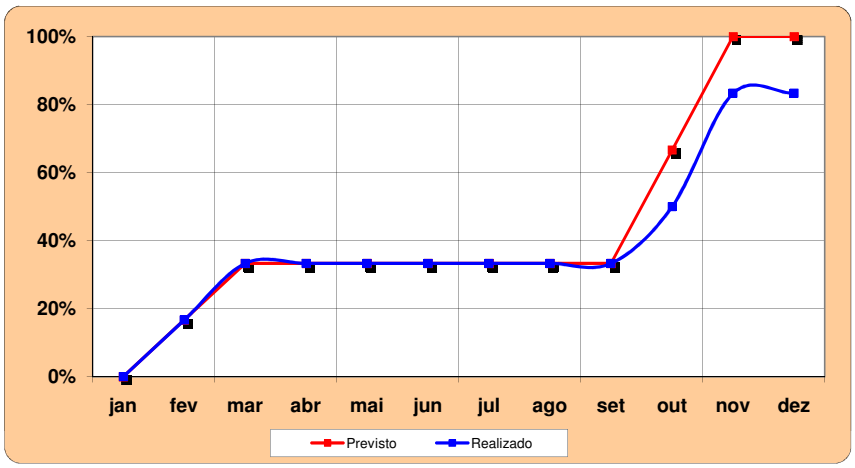
Meses	Previsto		Realizado	
	No mês	% Acum	No mês	% Acum
jan	0	0	0	0
fev	10	17	10	17
mar	20	33	20	33
abr	20	33	20	33
mai	20	33	20	33
jun	20	33	20	33
jul	20	33	20	33
ago	20	33	20	33
set	20	33	20	33
out	40	67	30	50
nov	60	100	50	83
dez	60	100	50	83
