consórcio
LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(prazos contratuais)

Id	Nome da tarefa
1	**PISF**
2	**GERENCIAMENTO**
3	Gerenciamento e Apoio Técnico I
4	Gerenciamento e Apoio Técnico II
5	**PROJETOS**
6	**EIXO NORTE**
7	Projetos Executivos - Lote A (1, 2, 3, 4, 8)
8	Projetos Executivos - Lote B (5, 6, 7, 14)
9	Projeto Executivo - Lote F
10	Projeto Básico - Trecho VI (Entremontes)
11	**EIXO LESTE**
12	Projeto Executivo - Lote C (9, 10)
13	Projeto Executivo - Lote D (11, 12, 13)
14	Projeto Executivo - Lote E (15, 16, 17, 18)
15	**SUPERVISÃO**
16	**EIXO NORTE**
17	Supervisão - Lote 01
18	Supervisão - Lote 02
19	Supervisão - Lote 03
20	Supervisão - Lote 04
21	Supervisão - Lote 05
22	Supervisão - Lote 06
23	Supervisão - Lote 07
24	Supervisão - Lote 08
25	Supervisão - Lote 14
26	**EIXO LESTE**
27	Supervisão - Lote 09
28	Supervisão - Lote 10
29	Supervisão - Lote 11
30	Supervisão - Lote 12
31	Supervisão - Lote 13
32	Supervisão - Lote 15
33	Supervisão - Lote 16
34	Supervisão - Lote 17
35	Supervisão - Lote 18
36	**OBRAS**
37	**EIXO NORTE**
38	**EXÉRCITO**
39	**Serviços Preliminares**
40	**Reservatório Tucutu**
41	Obras Civis
42	**Equipamentos**
47	**Canal de Aproximação da EBI 1**
48	Obras Civis
49	**Medidas Ambientais**
50	**Obras - Lote 01**
51	Mobilização e Canteiro
52	**Canal de Condução**
53	Obras Civis
54	Segmento de Canal entre a EBI-1 e o reservatório Tucutu
55	Segmento de Canal entre Res. Tucutu e o Aqueduto Logradouro
56	Segmento de Canal entre os Aquedutos Logradouro e Saco da Serra
57	Segmento de Canal entre o Aqueduto Saco da Serra e o Túnel Angico
58	Segmento de Canal entre o Túnel Angico e o Aqueduto Mari
59	Segmento de Canal entre os Aquedutos Mari e Terra Nova
60	Segmento de Canal entre o Aqueduto Terra Nova e o Res. Terra Nova
61	**Aquedutos Logradouro**
62	Obras Civis
63	**Aquedutos Saco da Serra**
64	Obras Civis
65	**Estrutura de Controle - Barragem Tucutu**
66	Obras Civis
67	**Equipamentos**
69	**Túnel Angico**
70	Obras Civis
71	**Aqueduto Mari**
72	Obras Civis
73	**Aqueduto Terra Nova**
74	Obras Civis
75	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
76	**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
77	**Montagem de Equipamentos**
78	**Ações Ambientais/Desmobilização**

Projeto: CRONOGRAMA MASTER
Data: 18/1/11

Tarefa | Divisão | Etapa | Resumo | Resumo do projeto | Tarefas externas | Etapa externa | Prazo final

consórcio
LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(prazos contratuais)

Id	Nome da tarefa
79	**Obras - Lote 02**
80	Mobilização e Canteiro
81	**Canal de Condução**
82	Obras Civis
83	Segmento de Canal entre Res. Terra Nova e a EBI-2
84	Segmento de Canal entre a EBI-2 e res. Serra do Livramento
85	Segmento de Canal entre Res. Serra do Livramento e Aqueduto Salgueiro
86	Segmento de Canal entre Aqueduto Salgueiro e Res. Mangueira
87	Segmento de Canal entre Res. Mangueira e EBI-3
88	**Reservatório Terra Nova**
89	Obras Civis
90	**Equipamento**
94	**Reservatório Serra do Livramento**
95	Obras Civis
96	**Equipamento**
100	**Aqueduto Salgueiro**
101	Obras Civis
102	**Reservatório Mangueira**
103	Obras Civis
104	**Equipamento**
108	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
109	**Pistas Laterais, Pontes, Passarelas (Infra estrutura)**
110	**Montagem de Equipamentos**
111	**Ações Ambientais**
112	**Obras - Lote 03**
113	Mobilização e Canteiro
114	**Canal de Condução**
115	Obras Civis
116	Segmento de Canal entre Res. Negreiros/BR-232 e BR-116
117	Segmento de Canal entre BR-116 e Res. Milagres
118	**Reservatório Negreiros - Barragem e Dique**
119	Obras Civis
120	**Equipamento**
124	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
125	**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
126	**Montagem de Equipamentos**
127	**Ações Ambientais**
128	**Obras - Lote 04**
129	Mobilização e Canteiro
130	**Canal de Condução**
131	Obras Civis
132	Segmento de Canal entre Res. Milagres e Túnel Milagres
133	Segmento de Canal entre Túnel Milagres e Galeria Milagres
134	Segmento de Canal entre Galeria Milagres e BR-116 (1)
135	Segmento de Canal entre BR-116 (1) e BR-116 (2)
136	Segmento de Canal entre BR-116 (2) e Res. Jatí
137	**Reservatório e Dique Milagres**
138	Obras Civis
139	**Equipamento**
143	**Túnel Milagres**
144	Obras Civis
145	**Galeria Milagres**
146	Obras Civis
147	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
148	**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
149	**Montagem de Equipamentos**
150	**Ações Ambientais**
151	**Obras - Lote 05**
152	Mobilização de Canteiro
153	**Canal de Condução**
154	Obras Civis
155	Segmento de Canal entre Res. Jatí e Res. Atalho
156	Segmento de Canal entre Res. Porcos e Res. Cana Brava
157	Segmento de Canal entre Res. Cana Brava e Res. Cipó
158	Segmento de Canal entre Res. Cipó e Res. Boi
159	**Reservatório Jati**
160	Obras Civis
161	**Equipamento**
165	**Reservatório Atalho (Reforço e Alteamento)**
166	Obras Civis
167	**Equipamento**
171	**Reservatório e Dique Porcos**
172	Obras Civis

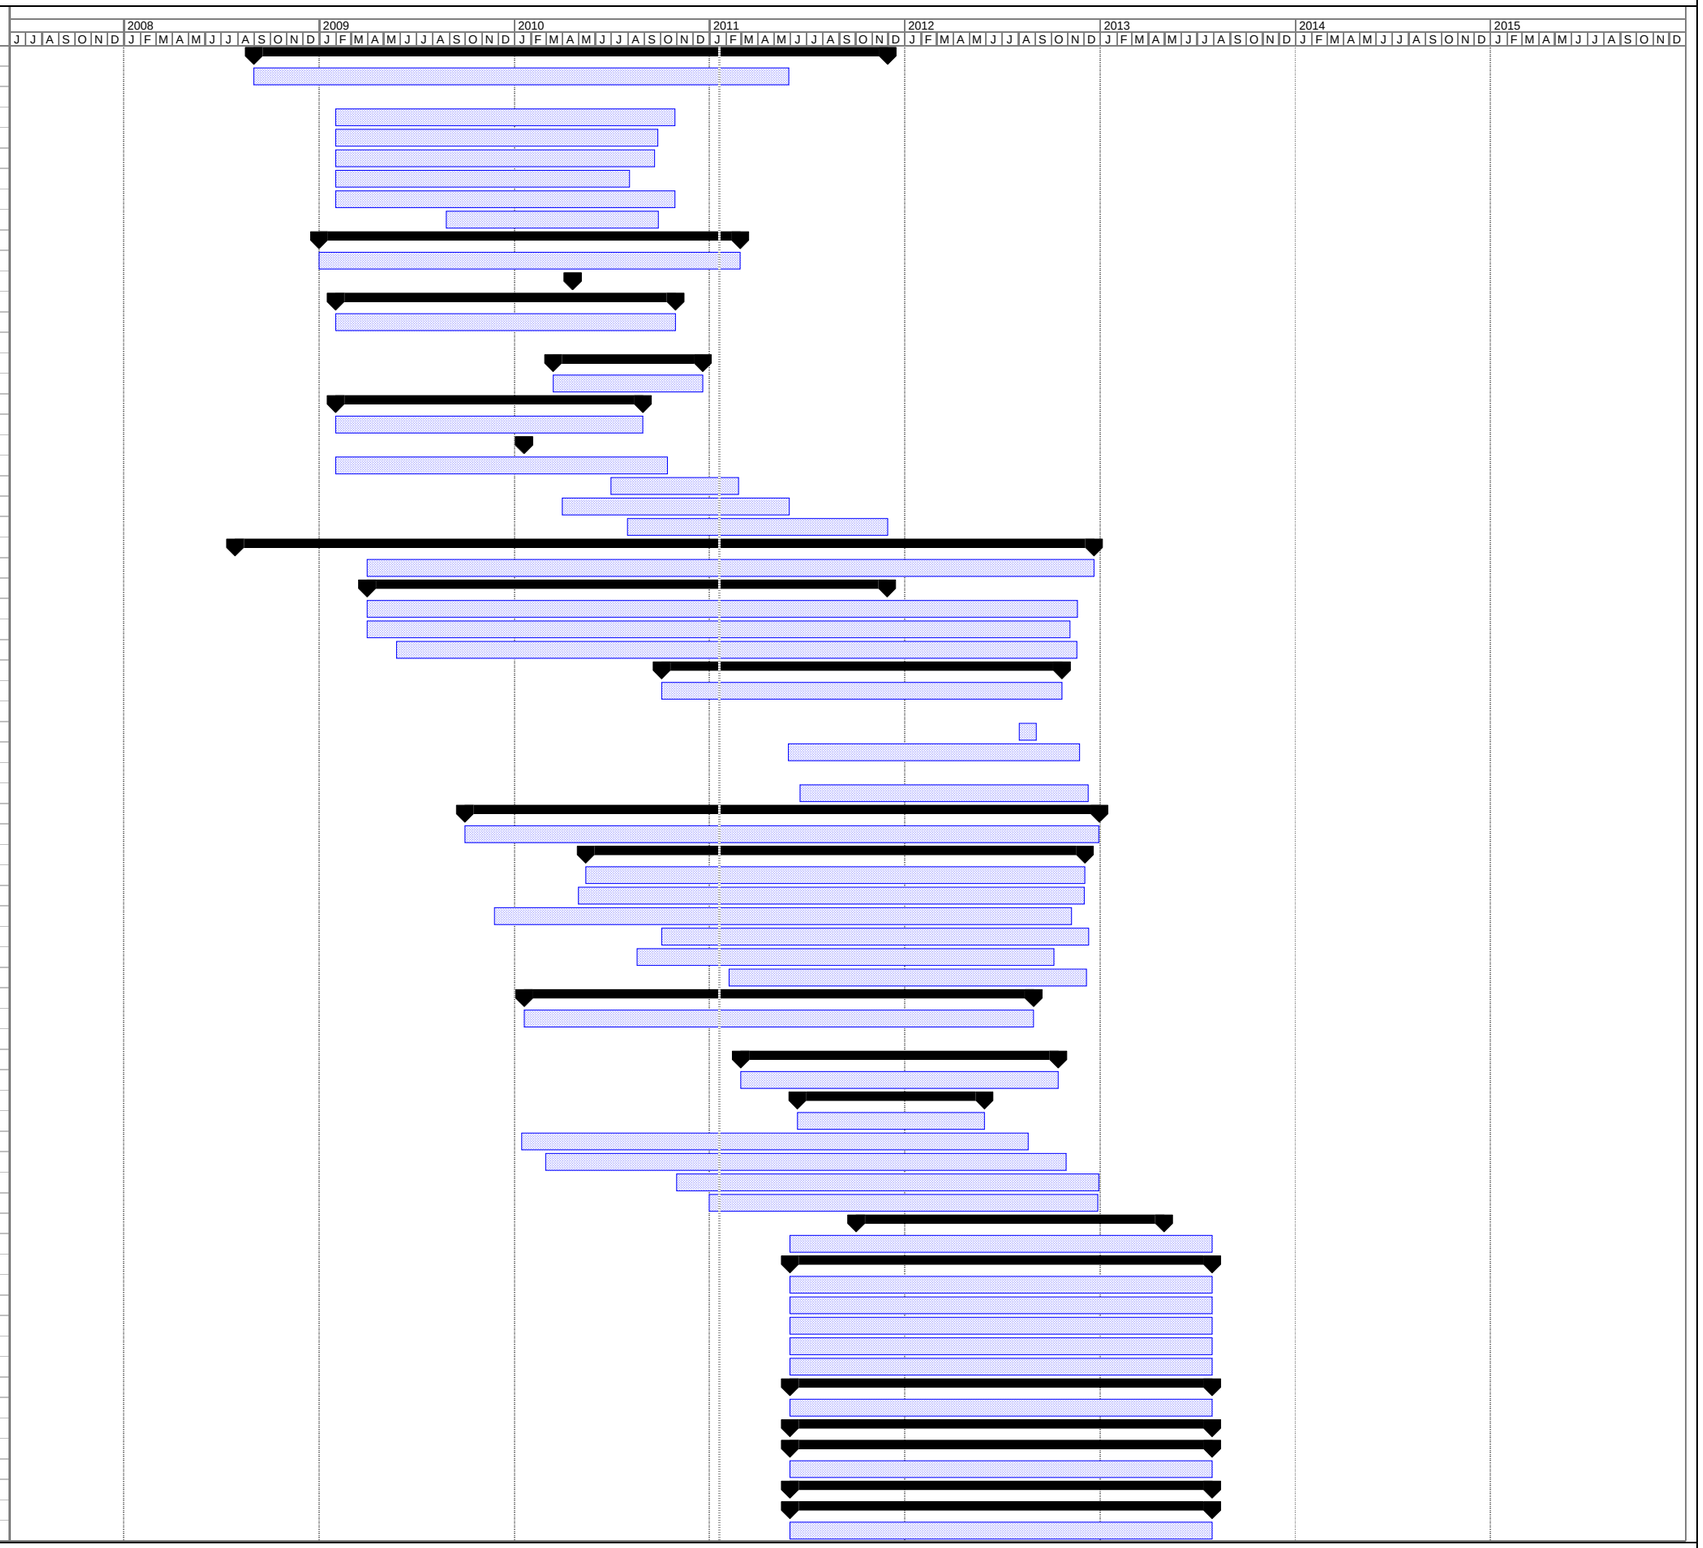

Projeto: CRONOGRAMA MASTER
Data: 18/1/11

Tarefa | Divisão | Etapa | Resumo | Resumo do projeto | Tarefas externas | Etapa externa | Prazo final

consórcio
LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(prazos contratuais)

Id		Nome da tarefa
173		**Equipamento**
177		**Reservatório Cana Brava**
178		Obras Civis
179		**Equipamento**
183		**Reservatório Cipó**
184		Obras Civis
185		**Equipamento**
189		**Reservatório Boi I**
190		Obras Civis
191		**Equipamento**
195		**Reservatório Boil II**
196		Obras Civis
197		**Equipamento**
198		Tubulação
199		Válvulas
200		Comportas e Grades
201		**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
202		**Obras - Lote 06**
203		Mobilização e Canteiro
204		**Canal de Condução**
205		Obras Civis
206		Segmento de Canal entre Res. Boi e Aqueduto Boi
207		Segmento de Canal entre Aqueduto Boi e Aqueduto do Pinga
208		Segmento de Canal entre Aqueduto do Pinga e Aqueduto Catingueira
209		Segmento de Canal entre Aqueduto Catingueira e Bueiro Palha
210		Segmento de Canal entre Bueiro Palha e Galeria Sobradinho
211		**Aqueduto Boi**
212		Obras Civis
213		**Aqueduto Pinga**
214		Obras Civis
215		**Aqueduto Catingueira**
216		Obras Civis
217		**Galeria Sobradinho**
218		Obras Civis
219		**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
220		**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
221		**Montagem de Equipamentos**
222		**Ações Ambientais**
223		**Obras - Lote 07**
224		Mobilização e Canteiro
225		**Canal de Condução**
226		Obras Civis
227		Segmento de Canal entre Túnel Cuncas I e Res. de Morros
228		Segmento de Canal entre Res. de Morros a Ponte (estaca 81)
229		Segmento de Canal entre Res. Caiçara e Aqueduto Piranhas
230		Segmento de Canal entre Aq. Piranha e Câmara Carga da UHE Ávidos I
231		**Reservatório Morros**
232		Obras Civis
233		**Equipamento**
237		**Reservatório Boa Vista (Cuncas)**
238		Obras Civis
239		**Equipamento**
243		**Reservatório Caiçara**
244		Obras Civis
245		**Equipamento**
249		**Reservatório Ávidos I**
250		Obras Civis
251		**Equipamentos**
256		**Estrutura de Controle para o Túnel Cuncas II**
257		Obras Civis
258		**Estrututa de Controle de Saída para Àvidos I**
259		Obras Civis
260		**Aqueduto Piranhas**
261		Obras Civis
262		**Casa de Força e Conduto Forçado de Ávidos I**
263		Obras Civis
264		**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
265		**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
266		**Montagem de Equipamentos**
267		**Ações Ambientais**
268		**Obras - Lote 08**
269		Mobilização e Canteiro
270		**EBI- 1**

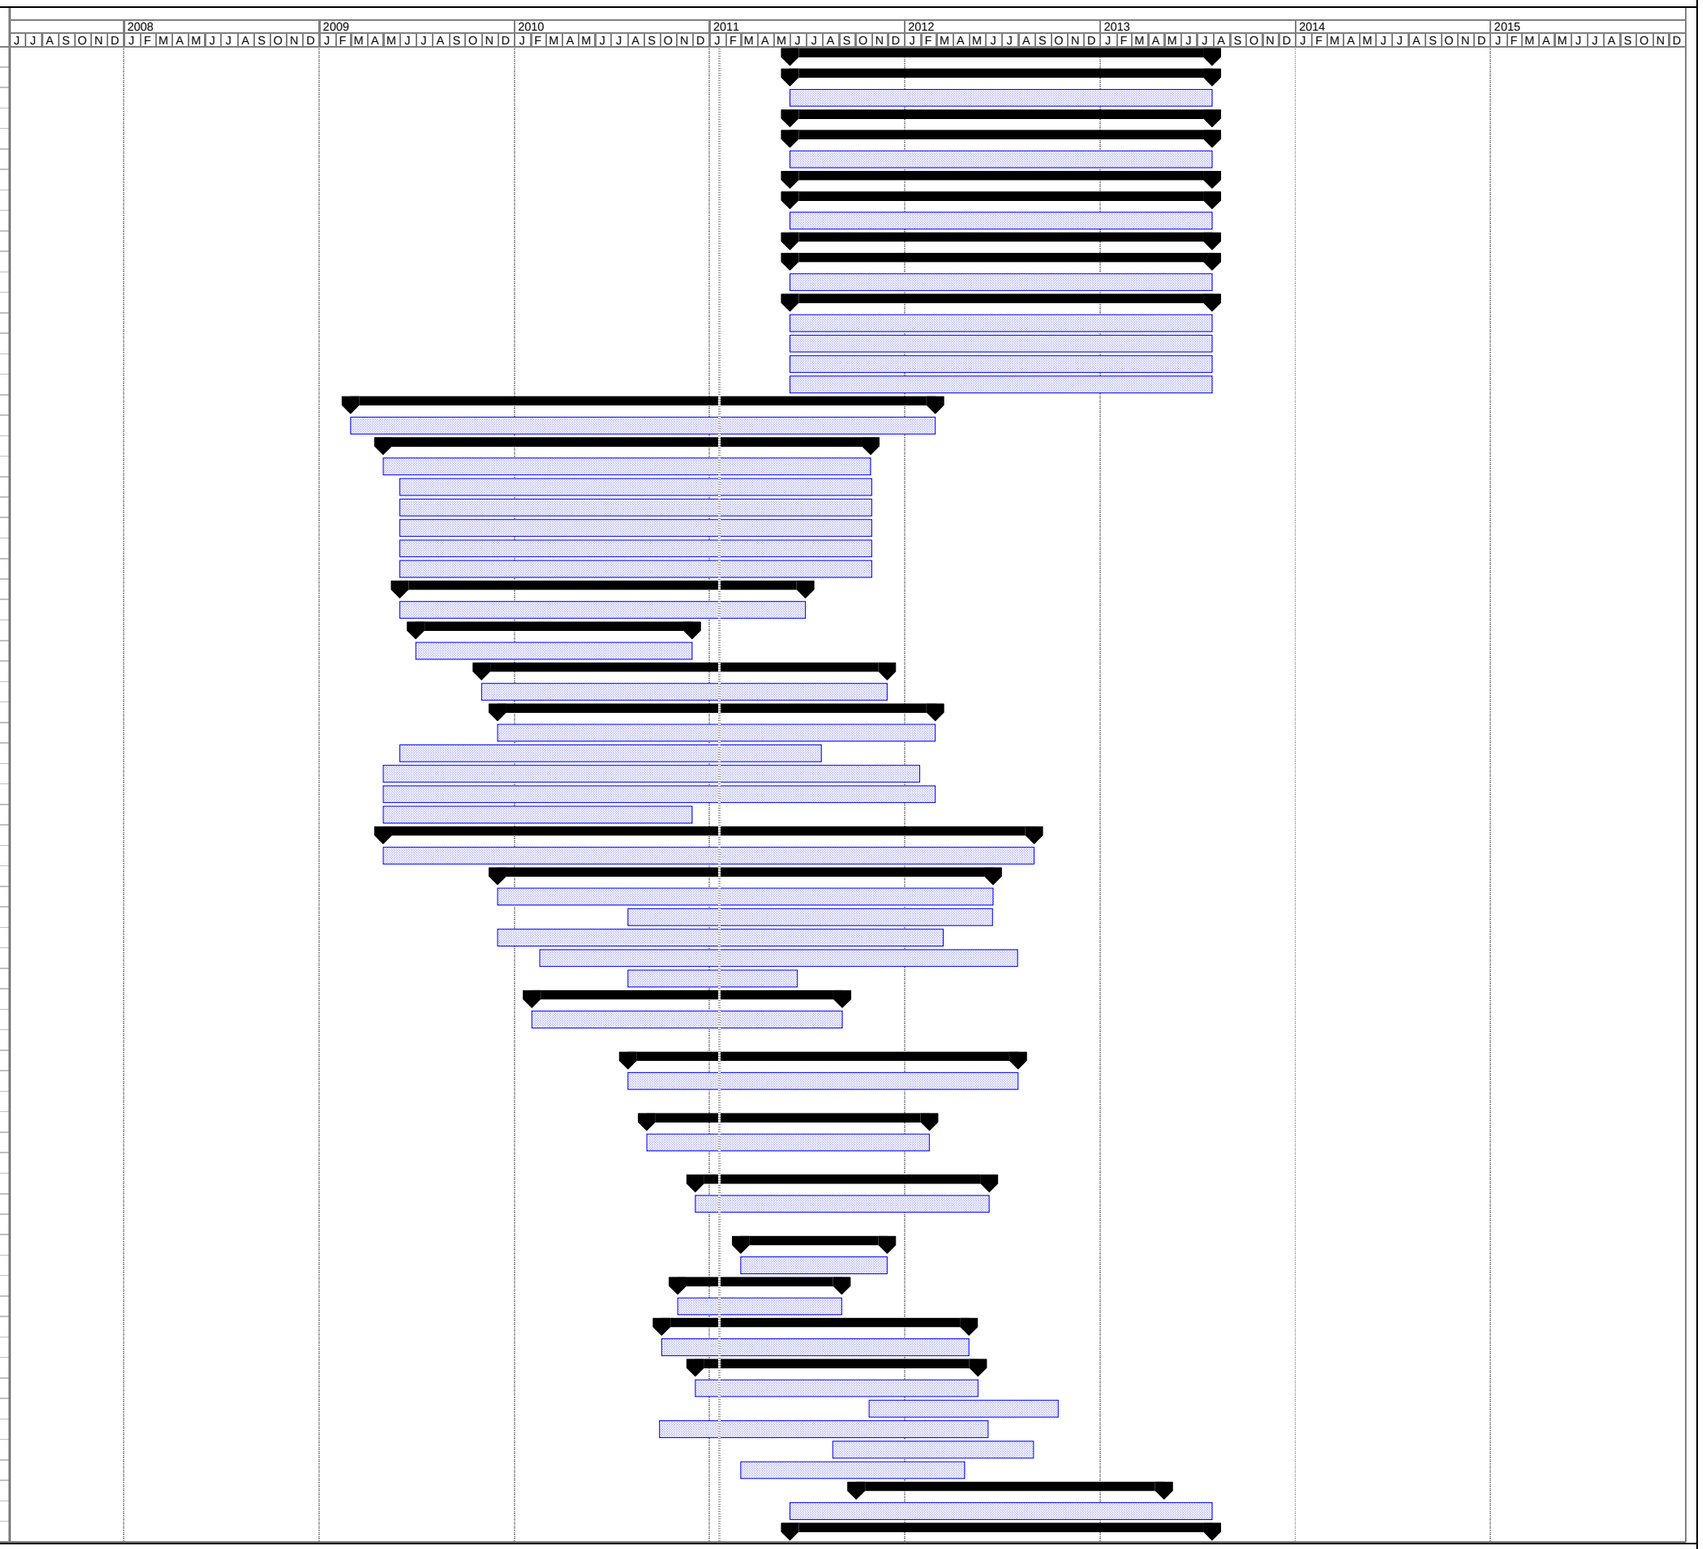

Projeto: CRONOGRAMA MASTER
Data: 18/1/11

Tarefa | Divisão | Etapa | Resumo | Resumo do projeto | Tarefas externas | Etapa externa | Prazo final

consórcio
LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(prazos contratuais)

Id	Nome da tarefa
271	Obras Civis
272	**Equipamento**
277	**EBI- 2**
278	Obras Civis
279	**Equipamento**
284	**EBI- 3**
285	Obras Civis
286	**Equipamento**
291	**Montagem de Equipamentos**
292	**Ações Ambientais**
293	**Obras - LOTE 14**
294	**Mobilização e Canteiro**
295	**Túnel Cuncas I**
299	**Túnel Cuncas II**
304	**Ações Ambientais**
305	**EIXO LESTE**
306	**EXÉRCITO**
307	**Serviços Preliminares**
308	**Canal de Aproximação à EBV-1**
309	Obras Civis
310	**Reservatório Areias**
311	Obras Civis
312	**Equipamento**
317	**Obras - Lote 09**
318	Mobilização e Canteiro
319	**Canal de Condução**
320	Obras Civis
321	Segmento de Canal entre a EBV-1 e o Res. Areias
322	Segmento de Canal entre o Res. Areias e a EBV-2
323	Segmento de Canal entre a EBV-2 e o Res. Braúnas
324	Segmento de Canal entre o Res. Braúnas e o Res. Mandantes
325	Segmento de Canal entre o Res. Mandantes e a EBV-3
326	Segmento de Canal entre a EBV-3 e o Res. Salgueiro
327	Segmento de Canal entre o Res. Salgueiro e o Res. Múquem
328	**Reservatório e Dique Braúnas**
329	Obras Civis
330	**Equipamento**
334	**Reservatório Mandantes**
335	Obras Civis
336	**Equipamento**
340	**Reservatório Salgueiro**
341	Obras Civis
342	**Equipamento**
346	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
347	**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
348	**Montagem de Equipamentos**
349	**Ações Ambientais**
350	**Obras - Lote 10**
351	Mobilização e Canteiro
352	**Canal de Condução**
353	Obras Civis
354	Segmento de Canal entre Res. Múquem e Aqueduto Jacaré
355	Segmento de Canal entre o Aqueduto Jacaré e o Res. Cacimba Nova
356	Segmento de Canal entre o Res. Cacimba Nova e a EBV-4
357	Segmento de Canal entre a EBV4 e o Res. Bagres
358	Segmento de Canal entre o Res. Bagres e o Aqueduto Caetitu
359	Segmento de Canal entre o Aqueduto Caetitu e o Res. Copiti
360	**Reservatório Muquem**
361	Obras Civis
362	**Equipamento**
366	**Aqueduto Jacaré**
367	Obras Civis
368	**Reservatório Cacimba Nova**
369	Obras Civis
370	**Equipamento**
374	**Reservatório Bagres**
375	Obras Civis
376	**Equipamento**
380	**Aqueduto Caetitu**
381	Obras Civis
382	**Reservatório de Copiti**
383	Obras Civis
384	**Equipamento**

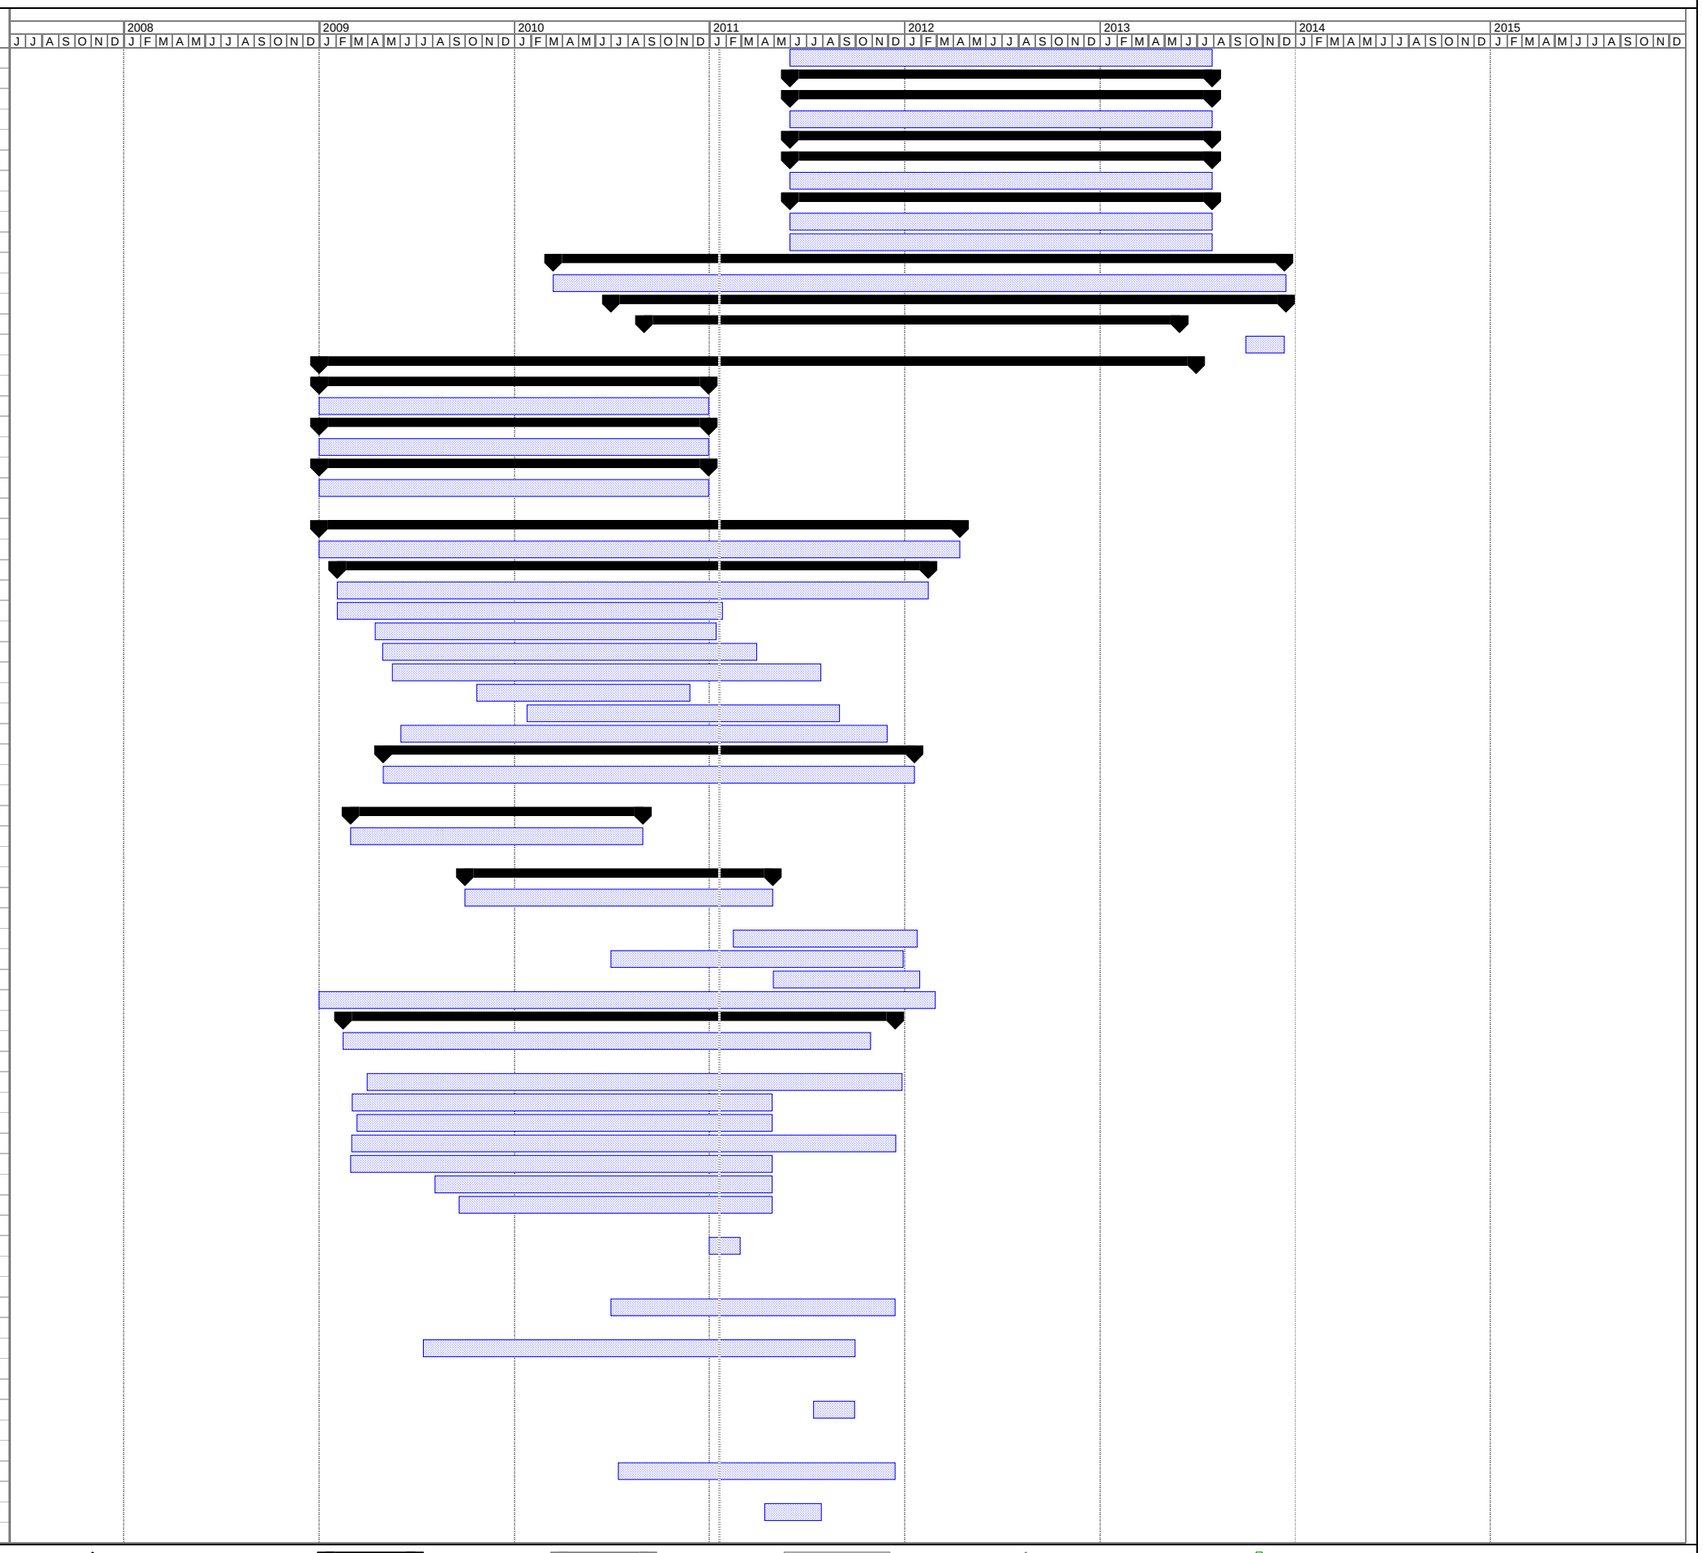

Projeto: CRONOGRAMA MASTER
Data: 18/1/11

Tarefa | Divisão | Etapa | Resumo | Resumo do projeto | Tarefas externas | Etapa externa | Prazo final

consórcio
LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(prazos contratuais)

Id	Nome da tarefa
388	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
389	**Pistas Laterais, Pontes, Passarelas (Infra estrutura)**
390	**Montagem de Equipamentos**
391	**Ações Ambientais**
392	**Obras - Lote 11**
393	Mobilização e Canteiro
394	**Canal de Condução**
395	Obras Civis
396	Segmento de Canal entre Res. Copiti e Aqueduto Branco
397	Segmento de Canal entre Aqueduto Branco e Aqueduto Barreiros
398	Segmento de Canal entre Aqueduto Barreiros e Res. Moxotó
399	Segmento de Canal entre Res. Moxotó e EBV-5
400	Segmento de Canal entre a EBV-5 e Res. Barreiros
401	**Aqueduto Branco**
402	Obras Civis
403	**Aqueduto Barreiros**
404	Obras Civis
405	**Reservatório Moxotó**
406	Obras Civis
407	**Equipamento**
411	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
412	**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
413	**Montagem de Equipamentos**
414	**Ações Ambientais**
415	**Obras - Lote 12**
416	Mobilização e Canteiro
417	**Canal de Condução**
418	Obras Civis
419	Segmento de Canal entre Res. Barreiro e EBV-6
420	Segmento de Canal entre a EBV-6 e o Res. Campos
421	Segmento de Canal entre o Res. Campos e o Res. Barro Branco
422	Segmento de Canal entre o Res. Barro Branco e o Túnel Monteiro
423	Segmento de Canal entre o Túnel Monteiro e Adutora Monteiro Poções
424	Segmento de Canal de Restituição ao Açude Poções
425	**Reservatório Barreiros**
426	Obras Civis
427	**Equipamento**
431	**Reservatório Campos**
432	Obras Civis
433	**Equipamento**
437	**Reservatório Barro Branco**
438	Obras Civis
439	**Equipamento**
443	**Túnel Monteiro**
444	Obras Civis
445	**Estrutura Controle - Ramal do Agreste**
446	Obras Civis
447	**Estrutura Controle - Cont Techo V**
448	Obras Civis
449	**Tomadas d´água de uso difuso em canais**
450	**Travessias/ Pontes/ Passarelas (Infra estrutura)**
451	**Montagem de Equipamentos**
452	**Ações Ambientais**
453	**Obras - Lote 13**
454	Mobilização e Canteiro
455	**EBV-1**
456	Obras Civis
457	**Equipamento**
462	**EBV-2**
463	Obras Civis
464	**Equipamento**
470	**EBV-3**
471	Obras Civis
472	**Equipamento**
478	**EBV-4**
479	Obras Civis
480	**Equipamento**
486	**EBV-5**
487	Obras Civis
488	**Equipamento**
494	**EBV-6**
495	Obras Civis
496	**Equipamento**

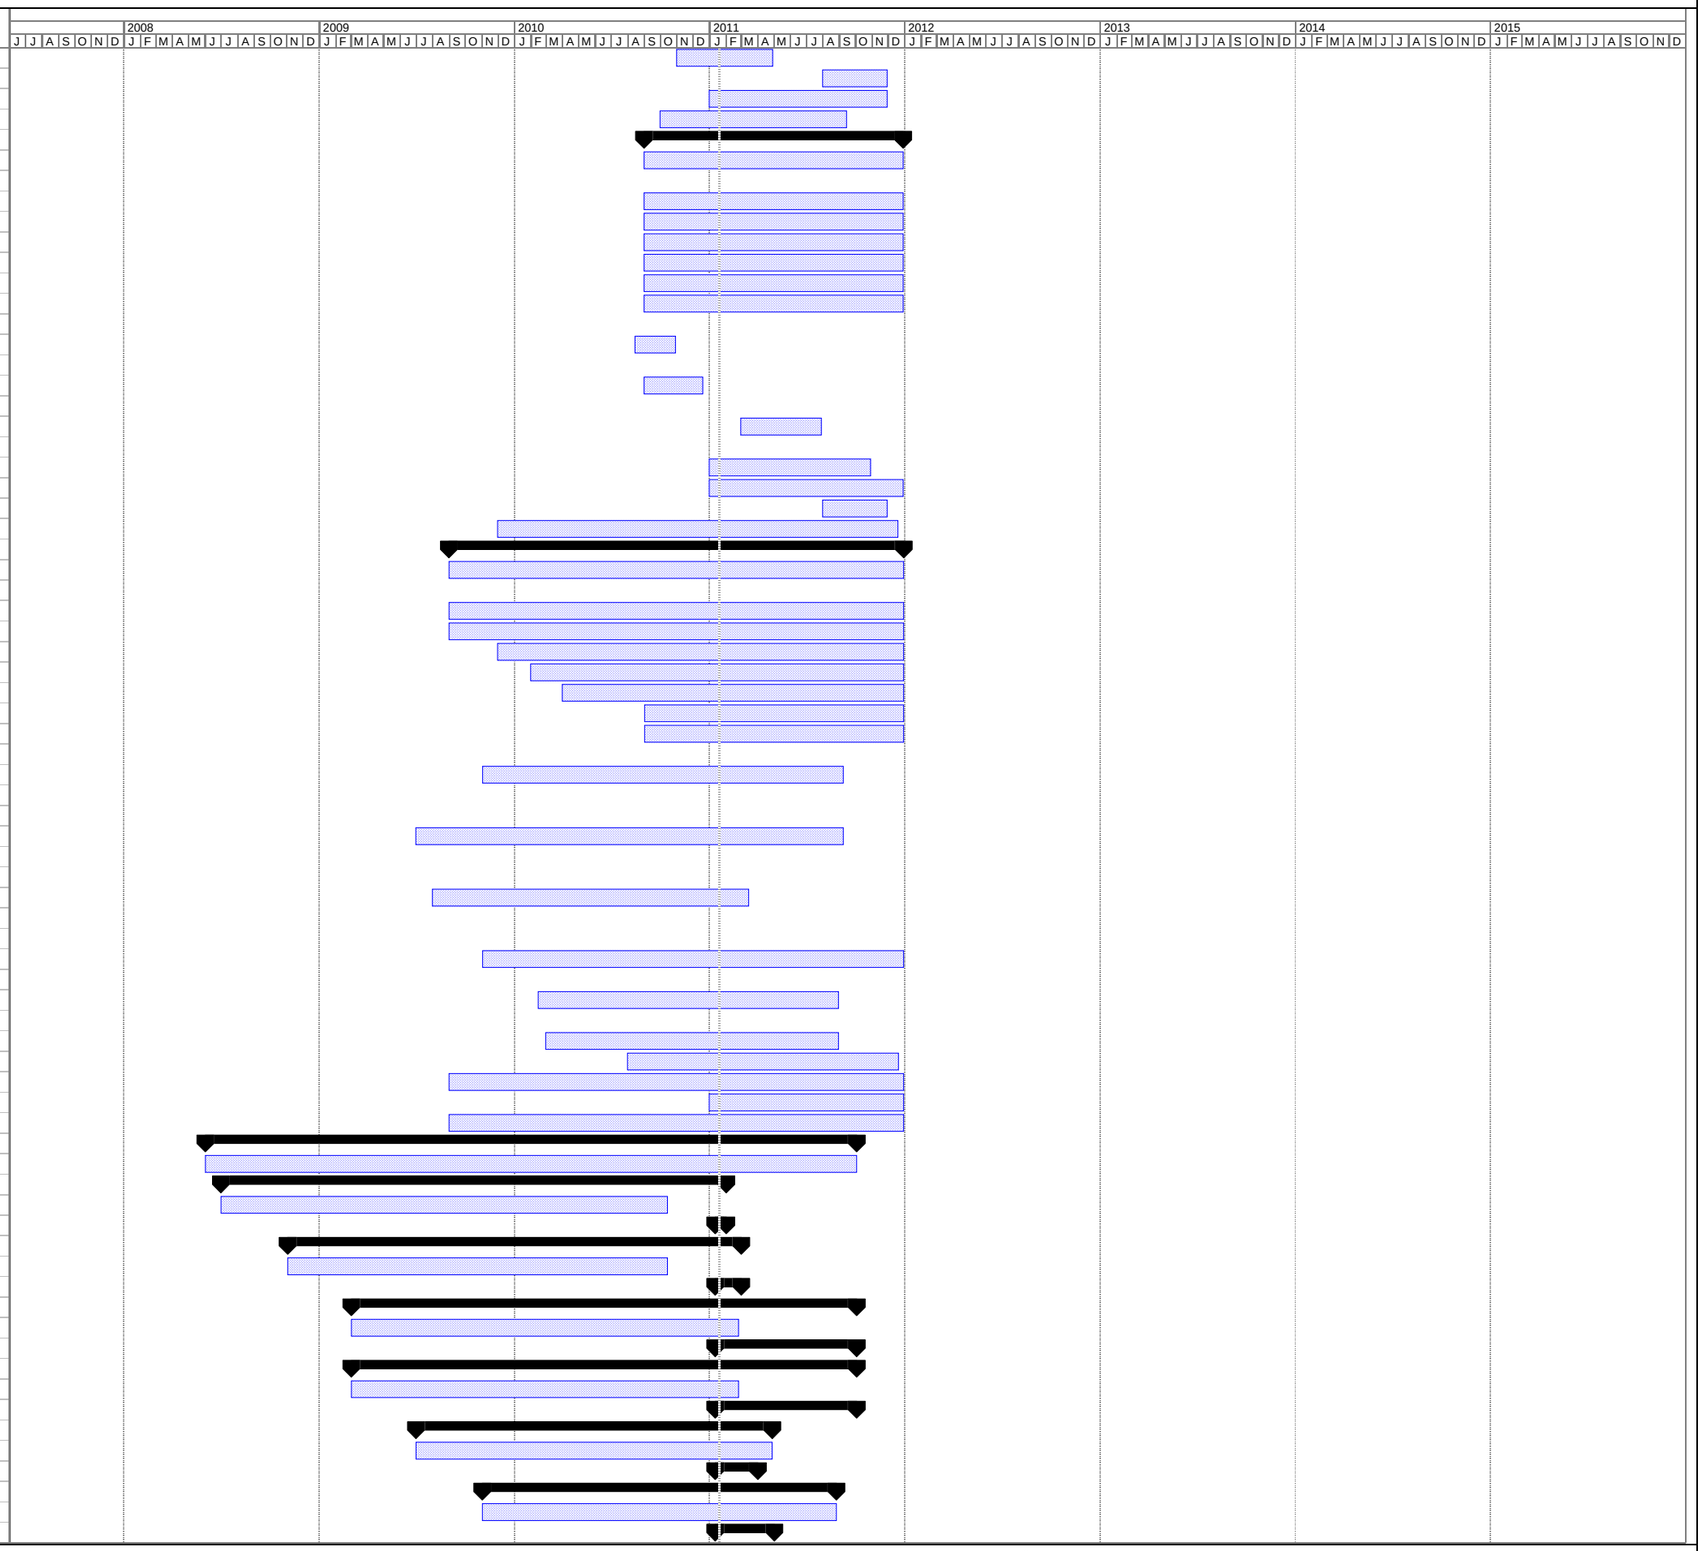

Projeto: CRONOGRAMA MASTER
Data: 18/1/11

Tarefa | Divisão | Etapa | Resumo | Resumo do projeto | Tarefas externas | Etapa externa | Prazo final

consórcio
LOGOS-CONCREMAT2

CRONOGRAMA MASTER - PISF
(prazos contratuais)

Id	Nome da tarefa
502	**Montagem de Equipamentos**
503	**Ações Ambientais**
504	**RAMAL DO AGRESTE**
505	**Obras - Lote 15**
506	Mobilização de Canteiro
507	**Canal de Condução**
516	**Túnel Cacimba da Mata**
518	**Túnel Cachoeira**
520	**Túnel Bom Nome**
522	**Aqueduto Passagem**
524	**Aqueduto Boqueirão**
526	**Aqueduto Jiboi**
528	**Aqueduto Lagoa do Meio**
530	**Obras de Infra-estrutura**
531	**Obras Complementares**
532	**Obras - Lote16**
533	Mobilização de Canteiro
534	**Canal de Condução**
539	**Túnel Tigre**
541	**Aqueduto Minador**
543	**Obras de Infra-estrutura**
544	**Obras Complementares**
545	**Obras - Lote 17**
546	Mobilização de Canteiro
547	**Canal de Condução**
551	**Túnel Ipojuca I**
553	**Obras de Infra-estrutura**
554	**Obras Complementares**
555	**Obras - Lote 18**
556	Mobilização de Canteiro
557	**Canal de Condução**
560	**Reservatório Ipojuca**
566	**Túnel Ipojuca II**
568	**Obras de Infra-estrutura**
569	**Obras Complementares**
570	**FORENCIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS**
571	**Eixo Norte**
572	Comporta/ Grades
573	Pontes e Pórticos Rolantes
574	Tubulação
575	Válvulas
576	Conjunto Motobomba Lote II
577	Conjunto Motobomba Lote III
578	**Eixo Leste**
579	Comporta/ Grades
580	Pontes e Pórticos Rolantes
581	Tubulação
582	Válvulas
583	Conjunto Motobomba Lote I
584	Conjunto Motobomba Lote II
585	**SISTEMAS ELÉTRICOS**
586	**Eixo Norte**
587	Linha de Distribuição
588	Linha de Transmissão
589	Subestações
590	SDSC
591	Softstart
592	**Eixo Leste**
593	Linha de Distribuição
594	Linha de Transmissão
595	Subestações
596	SDSC
597	Softstart
598	**TEMPO DE ENCHIMENTO**
599	Eixo Norte
600	Eixo Leste
601	Ramal do Agreste
602	**OPERAÇÃO**
603	Eixo Norte
604	Eixo Leste
605	Ramal do Agreste

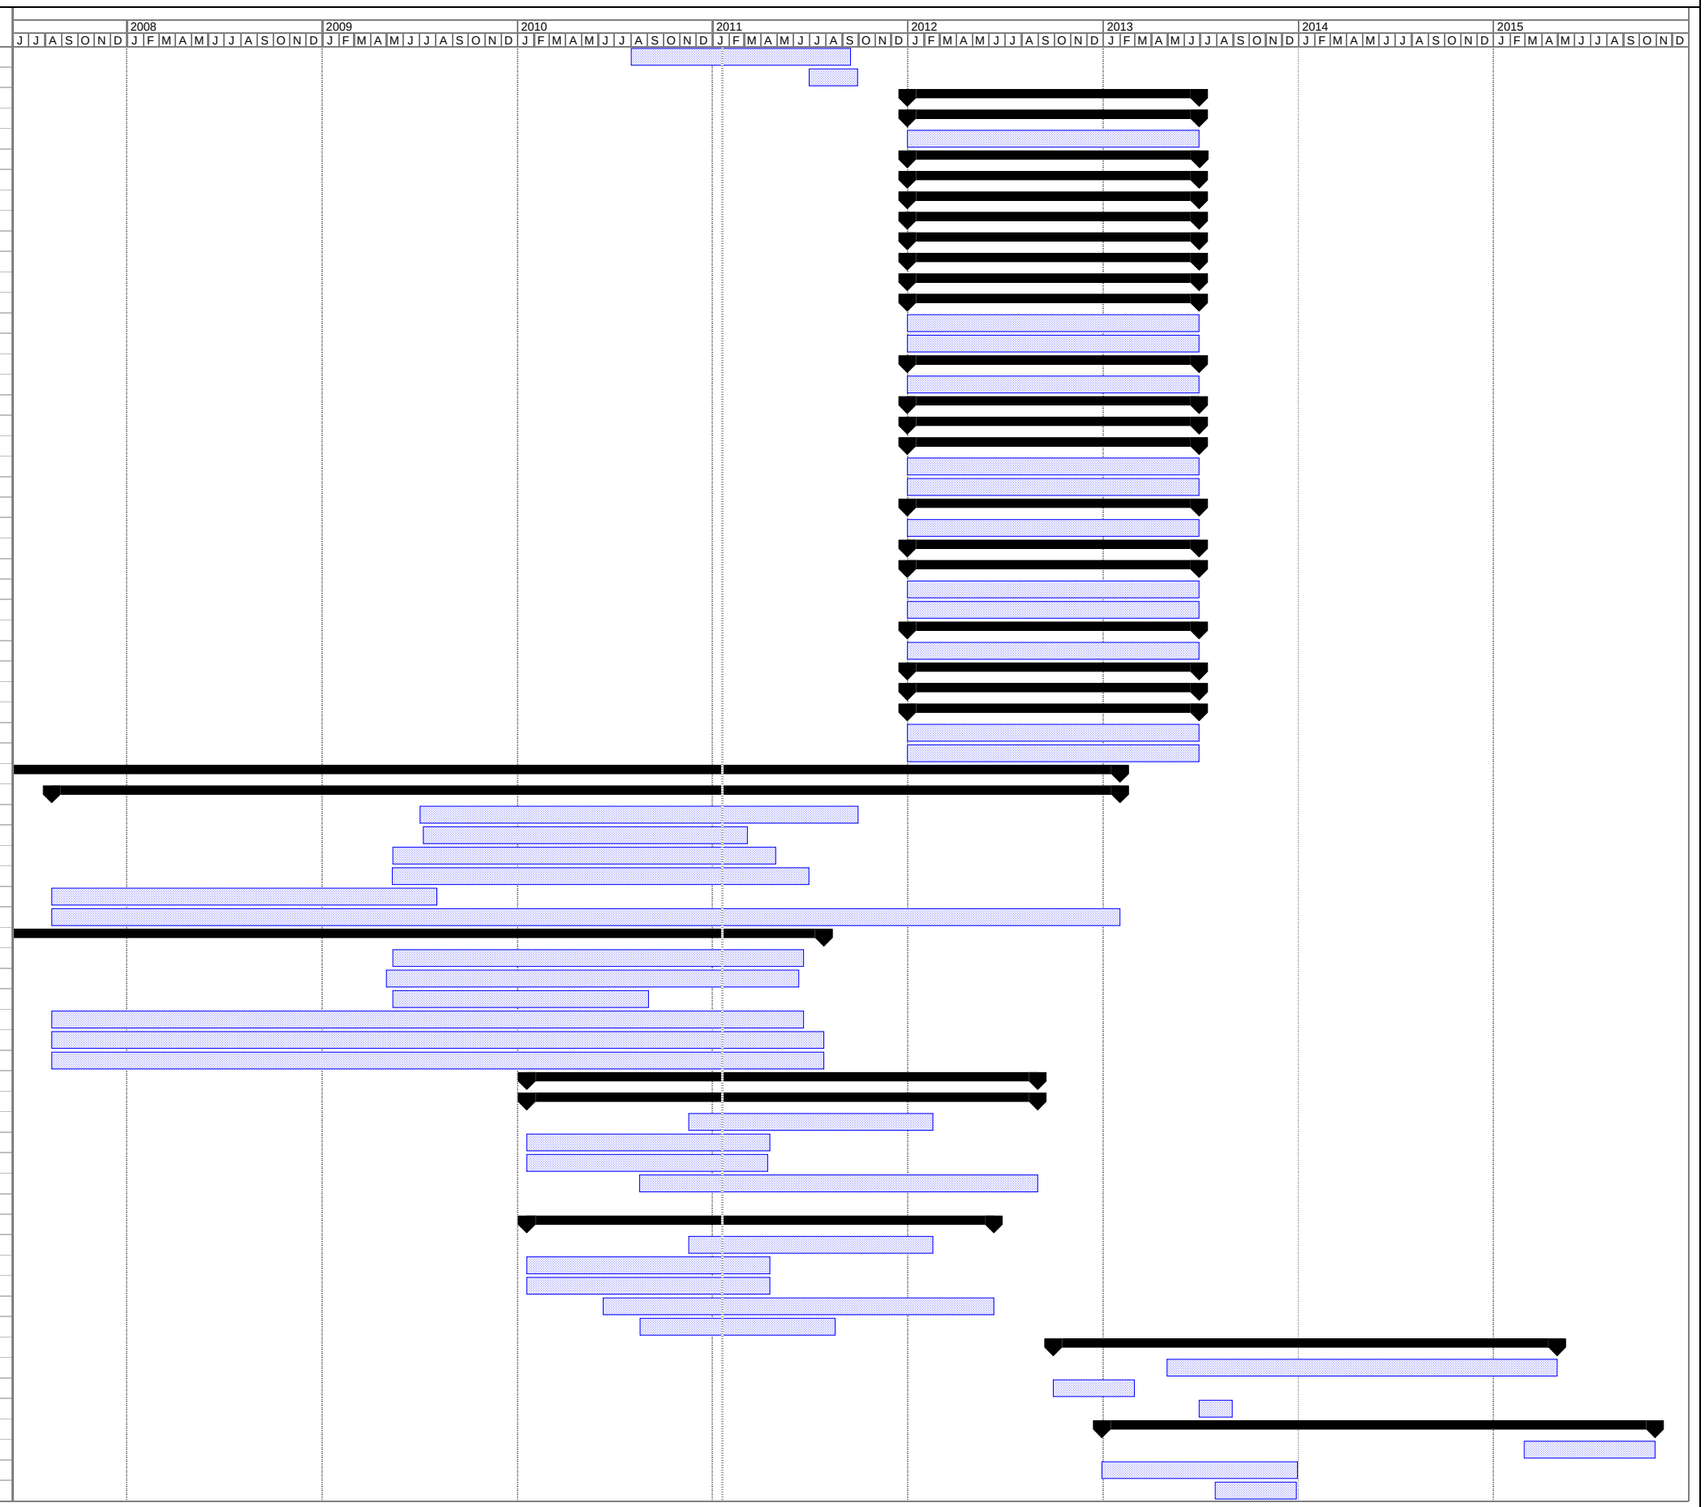

Projeto: CRONOGRAMA MASTER
Data: 18/1/11

Tarefa | Divisão | Etapa | Resumo | Resumo do projeto | Tarefas externas | Etapa externa | Prazo final
