

Plano de Transferência

005/2010

VILA PRODUTIVA RURAL
URI



Projeto
São Francisco
Água a quem tem sede

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO
DE POPULAÇÕES - 08

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE
SETENTRIONAL**

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES - 08

PLANO DE TRANSFERÊNCIA 005/2010

VILA PRODUTIVA RURAL URI

Agosto/2010



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO.....	5
3. PÚBLICO-ALVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	6
5. AÇÕES PROPOSTAS.....	7
6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS.....	8
7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO.....	11
8. CRONOGRAMA.....	14
9. ENCAMINHAMENTOS.....	19
10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL.....	20



RELAÇÃO DE QUADROS

Quadro 01. Relação de reassentados da VPR Uri	5
Quadro 02. Número de famílias e membros cadastrados	8
Quadro 03. Número de animais cadastrados por comunidade.....	9
Quadro 04. Equipamentos Agrícolas cadastrados.....	9
Quadro 05. Lista de móveis e utensílios domésticos.....	10
Quadro 06. Cronograma de mudança	11
Quadro 08. Distribuição de refeições por grupos de pessoas.....	13
Quadro 09. Quantificação e estimativa de valores de refeições e descartáveis.....	13
Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Uri.....	14



1. INTRODUÇÃO

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias residentes nas comunidades Uri de Baixo, Uri do Meio e Uri de Cima para a Vila Produtiva Rural Uri, uma vez que estas se encontram inseridas na faixa de servidão do Projeto Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, Trecho I, município de Salgueiro/PE.

O referido Plano foi elaborado em conformidade com o Programa de Reassentamento de Populações, que prevê em seu item 8.7.2.1, a execução de 9 etapas, sendo que as etapas 4 e 6 abordam exclusivamente do processo de transferência, conforme descrito abaixo.

“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência para Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo:

- (i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;*
- (ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser reassentada;*
- (iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote.*
- (v) elaboração do calendário de mudança.*
- (vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento.*

Etapa 6 - Transferências das Famílias

Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo desenvolvidas as seguintes principais atividades:

- (i) deslocamento das famílias;*
- (ii) transferência dos móveis e utensílios;*
- (iii) transporte dos animais domésticos;”*



As atividades previstas nas etapas acima elencadas estão contempladas no Termo de Referência anexo ao Contrato nº 023/2010, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a CMT Engenharia Ltda., para a execução e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do PISF, cabendo à CMT executar a preparação e transferência das famílias para as vilas produtivas rurais, com vistas à reinserção e organização social e econômica, à consolidação de práticas socioambientais, ao monitoramento e avaliação.

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens, a partir de visita às famílias a serem reassentadas com a aplicação de questionário (ficha cadastral de móveis, utensílios, equipamentos e animais domésticos), com o objetivo de subsidiar o planejamento logístico da transferência.

2. OBJETIVO

O Plano objetiva orientar a transferência de 45 (quarenta e cinco) famílias para a Vila Produtiva Rural Uri.

3. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na Vila Produtiva Rural Uri, 45 famílias que receberão casa e lote agrícola, conforme especificado no quadro abaixo.

Quadro 01. Relação de reassentados da VPR Uri

Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa	Benefício	
					Casa	Lote Agrícola
1	ENTI-187 -V2-001	A	Antônio Alves da Silva	17	X	X
2	ENTI-187 -V2-002	B	Roque Sandro Alves	18	X	X
3	ENTI-RN-002	A	João Galdino dos Santos	30	X	X
4	ENTI-RN-002	B	Ademilson Borges Rodrigues	39	X	X
5	ENTI-RN-002	C	Lucia de Fátima Marins	32	X	X
6	ENTI-RN-002	D	Maria Goreti de Marins	31	X	X
7	ENTI-RN-004		Francisco Simplício Ferreira	22	X	X
8	ENTI-RN-007	A	Poliana Bezerra Xavier	24	X	X
9	ENTI-RN-012	A	Donizete Alves Ferreira	16	X	X
10	ENTI-RN-012	B	Diocino Alves Ferreira	45	X	X
11	ENTI-RN-012	E	Luciano Alves da Silva Ferreira	42	X	X
12	ENTI-RN-013		Maria do Socorro Marins Santiago	33	X	X
13	ENTI-RN-014	A	Daniela Ferreira Alves da Silva	43		X



Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa	Benefício	
					Casa	Lote Agrícola
14	ENTI-RN-014	B	Demetrius André Alves Ferreira	44	X	X
15	ENTI-RN-015		Maria de Fátima dos Santos Silva	29	X	X
16	ENTI-RN-015	B	Expedita Maria Bernadino de Melo	25	X	X
17	ENTI-RN-015	C	Maria Lourdes dos Santos Silva	26	X	X
18	ENTI-RN-015	D	Maria Dilma dos Santos Matias	28	X	X
19	ENTI-RN-015	F	Maria Bernadina dos Santos	27	X	X
20	ENTI-RN-016	A	João Caldas Nascimento	36	X	X
21	ENTI-RN-016	D	Joelson Ferreira de Souza	21	X	X
22	ENTI-RN-016	F	Luiz Bernadino dos Santos	09	X	X
23	ENTI-RN-016	H	Manoel Joaquim de Souza	11	X	X
24	ENTI-RN-016	I	Antônio de Caldas Sobrinho	15	X	X
25	ENTI-RN-016	M	Geraldo Antônio de Freitas	12	X	X
26	ENTI-RN-016	O	Maria Eurides Caldas do Nascimento	14	X	X
27	ENTI-RN-016	Q	Josias Carlos de Carvalho	34	X	X
28	ENTI-RN-016	R	Maria Bezerra de Barros	08	X	X
29	ENTI-RN-016	S	Francisco Pedro da Silva	35	X	X
30	ENTI-RN-016	T	Edileuza Helena do Nascimento dos Reis	10	X	X
31	ENTI-RN-016	U	Janicléa Ferreira de Souza	20	X	X
32	ENTI-RN-016	V	Poliana Bezerra do Nascimento	23	X	X
33	ENTI-RN-016	X	Lucia Raimunda Martins	19	X	X
34	ENTI-RN-016	B	Tarcila Raimunda Maria dos Santos	01	X	X
35	ENTI-RN-017	C	José Severino da Silva	02	X	X
36	ENTI-RN-018		Agenor Bernadino dos Santos	07	X	X
37	ENTI-RN-018	A	Valquiria Bernadino dos Santos Silva	04	X	X
38	ENTI-RN-018	B	Jailson Bernadino dos Santos	06	X	X
39	ENTI-RN-018	C	Valmir Alves de Aquino	03	X	X
40	ENTI-RN-018	E	Cícero de Souza	40	X	X
41	ENTI-RN-018	F	Valdirene Bernadino dos Santos	05	X	X
42	ENTI-RN-018	G	Reinaldo Antônio Alves	13	X	X
43	ENTI-188	A	Ursula Maria da Conceição	37	X	X
44	ENTI-188	B	Raimundo Antero dos Santos	38	X	X
45	ENTI-RN-018	H	Vicente Amancio de Sousa	41	X	X

4. METODOLOGIA

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Plano de Reassentamento de Populações, onde no item 8.7.1 destaca-se a interação comunitária como premissa no processo de transferência das famílias. Este item determina que “durante a fase de



planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas, constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor para encaminhar as reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas.”

Assim, durante reunião realizada em 02 de dezembro de 2009 foi criada a Comissão Organizadora da Vila Produtiva Rural Uri composta pelos seguintes moradores: Donizete Alves Ferreira, Janicléa Ferreira de Sousa e Marinelma Caldas Nascimento, que acompanharam a equipe da CMT Engenharia durante o levantamento dos móveis, utensílios e animais domésticos.

Para a elaboração deste Plano, foram realizadas visitas individuais nas casas das 45 famílias a serem reassentadas para levantamento de informações sobre bens, utensílios e animais, utilizando, para tanto, questionários estruturados.

As informações levantadas foram tabuladas e sistematizadas, subsidiando a elaboração do planejamento logístico.

5. AÇÕES PROPOSTAS

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações:

- O Ministério da Integração Nacional – MI deverá disponibilizar, uma semana antes da data prevista para a transferência, o acesso prévio das famílias à VPR para a limpeza das casas e construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos lotes residenciais;
- A transferência observará o critério de vizinhança (exemplo: Comunidade do Uri de Baixo, Comunidade do Uri do Meio e Comunidade Uri de Cima), priorizando-se as famílias com idosos, crianças de colo, portadores de necessidades especiais e gestantes;



- Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para transferência das famílias beneficiárias até a VPR;
- O transporte (carga e descarga) dos bens, utensílios e animais deverá ser acompanhado de, no mínimo, um representante da família beneficiada;
- As famílias deverão:
 - ✓ Preparar e encaixotar seus pertences, identificando os frágeis;
 - ✓ Assinar, através dos seus representantes, o Termo de Recebimento do Imóvel e o Termo de Transferência, bem como o Termo de Negativa de Mudança para aqueles que se negarem a mudar na data estabelecida;
 - ✓ Reunir os animais em local adequado para viabilizar o encarretamento no dia agendado para a mudança;
- O Ministério da Integração deverá:
 - ✓ Instituir uma Comissão de Acompanhamento para apoio às atividades de transferência que atuará em regime de plantão;
 - ✓ Articular com a Prefeitura Municipal de Salgueiro e com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, visando garantir atendimento emergencial e segurança para as famílias e profissionais envolvidos, durante processo de transferência;

6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS

Com o levantamento cadastral foi possível quantificar um total de 178 pessoas, residentes em 3 comunidades distintas, além de animais, equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme quadros abaixo.

Quadro 02. Número de famílias e membros cadastrados

Comunidade	Nº de Família	Nº de Membros da Família			TOTAL
		Adultos	Idosos	Crianças	
Uri de Baixo	23	52	8	26	86
Uri do Meio	17	47	6	21	74
Uri de Cima	5	10	0	8	18
TOTAL	45	109	14	55	178



Quadro 03. Número de animais cadastrados por comunidade.

Comunidade	Caprinos	Ovinos	Felinos	Caninos	Aves	Equinos	Bovinos	Suínos	Muare	Total
Uri de Baixo	20	5	20	12	94	2	36	43	2	234
Uri do Meio	1	0	5	9	166	1	3	7	1	193
Uri de Cima	1	0	0	4	43	1	6	0	0	55
TOTAL	22	5	25	25	303	4	45	50	3	482

Quadro 04. Equipamentos Agrícolas cadastrados.

Comunidade	Equipamento Agrícola					TOTAL
	Motor	Cano	Arado	Pulverizador	Forrageira	
Uri de Baixo	1	20	3	1	2	27
Uri do Meio	0	0	3	0	1	4
Uri de Cima	0	0	0	0	1	1
TOTAL	1	20	6	1	4	32



Quadro 05. Lista de móveis e utensílios domésticos.

Comunidade	Geladeira	Freezer / Tanquinho	Fogão	Guarda-roupas / Sapateira	Sofá	Cama / Berço	Mesa / Centro	Cômoda	Maq. Costurar	Cadeira	Armário	Bicicleta	TV	Som / DVD	Antena	Rack / Estante	Computador	Cx d'água	Vaso / Planta	TOTAL
Uri de Baixo	24	3	22	36	18	64	39	11	7	224	28	21	27	11	14	25	0	18	0	592
Uri do Meio	15	1	16	22	13	54	27	7	0	177	19	19	20	11	4	15	1	11	30	462
Uri de Cima	5	0	5	7	8	13	10	2	0	45	5	6	8	4	1	8	0	0	0	127
TOTAL	44	4	43	65	39	131	76	20	7	446	52	46	55	26	19	48	1	29	30	1.181

7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

O planejamento logístico prevê a disponibilização de caminhões com motoristas e ajudantes, veículo de transporte coletivo, lonas, papelão e cordas, de responsabilidade da Comissão Regional de Obras da Sétima Região Militar - CRO-7.

Para a transferência das famílias, bens, móveis e utensílios serão necessário 03 (três) caminhões truck, tipo baú ou carga seca, 01 (um) caminhão tipo gaiola e 01 (um) veículo para transporte coletivo, tipo Van, com motorista. Cada caminhão deverá contar com motorista e 03 (três) ajudantes.

Para efeito de cálculo considerou-se um período total de 04 (quatro) dias corridos para a conclusão da transferência das 45 famílias.

Desta forma, ocorrerão aproximadamente 12 (doze) mudanças por dia, conforme o quadro abaixo:

Quadro 06. Cronograma de mudança

COMUNIDADE	1º Dia	2º Dia	3º Dia	4º Dia
Uri de Baixo	12	11		
Uri do Meio			12	5
Uri de Cima				5
TOTAL	12	11	12	10

Para o plantão e apoio às famílias, durante o processo de transferência, sugere-se a participação de técnicos do MI, CRO/7 e CMT Engenharia, conforme quadro abaixo.

Quadro 07. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.

INSTITUIÇÃO / PERFIS PROFISSIONAIS	Nº DE INTEGRANTES	PRINCIPAIS ATIVIDADES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - Socioeconomia	02	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas, fornecendo ainda, informações institucionais.
CRO/7 – Coordenação de obras, Eletricista e Bombeiro Hidráulico	03	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Realizar manutenção em instalações elétricas e hidráulicas que necessitem de reparos;
CMT Engenharia – Socioeconomia, Comunicação Social e Educação Ambiental	08	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Acompanhar as frentes de mudança desde o carregamento na origem até a recepção na vila produtiva rural; Prestar orientação às famílias sobre boas práticas intradomiciliares à medida que forem se instalando nas residências; Realizar o registro fotográfico do processo de transferência.
TOTAL		13

A Comissão de Acompanhamento da Transferência poderá se instalar no prédio destinado à associação da VPR para a execução de suas atividades, necessitando para tal de mesas e cadeiras.

No dia da transferência deverá ser fornecida alimentação para todos os membros das famílias e para os profissionais envolvidos, conforme quadros abaixo.



Quadro 08. Distribuição de refeições por grupos de pessoas.

Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Reassentados	178	04	1	2	178	356
Motorista Caminhão	4	04	1	2	16	32
Motorista do ônibus	1	04	1	2	4	8
Ajudantes para Caminhão	12	04	1	2	48	96
Motorista da CMT	3	04	1	2	12	24
Equipe Técnica CMT, MI e CRO-7	13	04	1	2	42	84
Total					300	600
Margem de Segurança 10%					330	660

Quadro 09. Quantificação e estimativa de valores de refeições e descartáveis.

Refeição/Descartáveis	Quantidade (unid.)	Valor (R\$)	
		Valor (und.)	Valor Total
Lanche (manhã e tarde)	660	3,00	1.980,00
Almoço	330	6,00	1.980,00
Água (garrafa de 1,5 L)	250	2,70	675,00
Copos descartáveis	2000 (20 pacotes)	3,50	70,00
Talheres descartáveis (garfos e facas)	300 (3 pacotes)	4,00	12,00
Papel Toalha	30 pacotes	4,00	120,00
Refrigerantes de 02 Litros	80	4,50	180,00
Saco de lixo de 100 litros	4 pacotes	3,20	12,80
Total			5.029,80

Obs. Considerada a margem de segurança para os valores de lanche e almoço



8. CRONOGRAMA

Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Uri.

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por Dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa sorteada	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
Uri de Baixo	12	01	CA 1 CG 1	Maria do Socorro Marins Santiago	33	08h00min	06		15 Aves 2 Muas 11 Bovinos	
			CA 2	Antônio Alves da Silva	17	08h00min	06			Mora no Sítio Negreiro, atrás da VPR Negreiros.
			CA 3	Daniela Ferreira Alves da Silva	43	08h00min	05		10 Felinos 5 Aves 1 Canino	
			CA 1	Roque Sandro Alves	18	10h00min	06			Mora no Sítio Negreiro, atrás da VPR Negreiro
			CA 2	João Galdino dos Santos	30	10h00min	03			Rua Manoel Leondas 172, Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro-PE
			CA 3	Adeilson Borges Rodrigues	39	10h00min	05			Rua 23, casa 45, COAHB, Salgueiro-PE

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por Dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa sorteada	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
			CA 1	Lucia de Fátima Marins	32	13h00min	04		15 aves	Rua Coronel Honorato, 192, Nossa Senhora da Apresentação, Salgueiro-PE
			CA 2	Maria Goreti de Marins	31	13h00min	06			Rua Coronel Honorato, 192, Nossa Senhora da Apresentação, Salgueiro-PE
			CA 3 CG 1	Francisco Simplício Ferreira	22	13h00min	02		20 Caprinos 40 Suínos 25 Bovinos 2 Equínos 5 Aves 4 Caninos 1 Felino	
			CA 1	Donizete Alves Ferreira	16	15h00min	03		2 Felinos	
			CA 2	Diocino Alves Ferreira	45	15h00min	02			
			CA 3	Luciano Alves da Silva Ferreira	42	15h00min	02		1 Felino	
			CA 1	Ursula Maria da Conceição	37	08h00min	01		2 Felinos	
			CA 2	Manoel Joaquim de Souza	11	08h00min	02			
			CA 3	Demetrius André Alves Ferreira	44	08h00min	02			
			CA 1	Maria de Fátima dos Santos Silva	29	10h00min	02		10 Aves	
				11						



Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por Dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa sorteada	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
			CA 2	Expedita Maria Bernadino de Melo	25	10h00min	04		1 Canino 2 Aves	
			CA 3 CG 1	Maria de Lourdes dos Santos Silva	26	10h00min	02		1 Ovino 1 suíno 12 Aves 2 Caninos 3 Felinos	
			CA 1 CG 1	Maria Dilma dos Santos Matias	28	13h00min	03		4 Ovinos 2 Suínos 30 Aves 1 Canino	
			CA 2	Joelson Ferreira de Souza	21	13h00min	05		1 Felino	
			CA 3	Antônio de Caldas Nascimento	15	13h00min	01			
			CA 1	Raimundo Antero dos Santos	38	15h00min	03		2 Caninos	
			CA 2	Vicente Amancio de Sousa	41	15h00min	05		1 Canino	
			Uri do Meio	12	01	CA 1	Poliana Xavier	24	08h00min	08
			CA 2 CG 1	João Caldas Nascimento	36	08h00min	04		50 Aves	
			CA 3	Maria Eurides Caldas do Nascimento	14	08h00min	03			
			CA 1 CG 1	Poliana Bezerra do Nascimento	23	10h00min	10		1 Caprino 4 Suínos 45 Aves 4 Caninos 2 Felinos	

Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por Dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa sorteada	Horário	Membros	Data	Animais	Observação		
			CA 2	Luiz Bernadino dos Santos	09	10h00min	04		4 Aves			
			CA 3	Geraldo Antônio de Freitas	12	10h00min	08					
			CA 1 CG 1	Josias Carlos de Carvalho	34	13h00min	04		30 Aves			
			CA 2	Maria Bezerra de Barros	08	13h00min	01		15 Aves	Reside em Umari, seguindo pelo Alazão, fone: (8829-6174)		
			CA 3	Francisco Pedro da Silva	35	13h00min	01					
			CA 1	Edileuza Helena do Nascimento dos Reis	10	15h00min	04		1 Felino 1 Canino			
			CA 2	Janicléa Ferreira de Souza	20	15h00min	03					
			CA 3	Lúcia Raimunda Martins	19	15h00min	04					
			05	01	CA 1	Tarcila Raimunda Maria dos Santos	01	08h00min	05		2 Felinos 10 Aves 1 Canino	
					CA 2 CG 1	Agenor Bernadino dos Santos	07	08h00min	03		2 Caninos 1 Muare 2 Suínos 3 Bovinos 1 Equino 12 Aves	
					CA 3	Valquiria Bernadino da Silva	04	08h00min	04			
					CA 1	Valmir Alves de Aquino	03	10h00min	06		1 Canino	



Comunidade	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por Dia	Caminhão	Nome das Famílias	Nº da casa sorteada	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
			CG 1						1 suíno	
			CA 2	Valdirene Bernadino dos Santos	05	10h00min	02			
Uri de Cima	05	01	CA 3 CG 1	Maria Bernadina dos Santos	27	10h00min	03		1 Caprino 6 Bovinos 12 Aves 2 Caninos	
			CA 1	José Severino da Silva	02	13h00min	03		1 Canino	
			CA 2 CG 1	Jailson Bernadino dos Santos	06	13h00min	04		1 Equino	
			CA 3	Cícero de Souza	40	13h00min	05		1 Canino 1 Ave	
			CA 1 CG 1	Reinaldo Antônio Alves	13	15h00min	03		30 Aves	


9. ENCAMINHAMENTOS

Para viabilizar a execução deste Plano de Transferência é necessário o MI adote as seguintes providências:


- Aprovar este Plano de Transferência e o cronograma de mudança, definindo os responsáveis pela realização das despesas decorrentes de sua execução;
- Apresentar o Plano para as famílias, prestando esclarecimentos sobre as condições para a transferência e pactuando a sua execução;
- Solicitar apoio à Prefeitura de Salgueiro/PE para atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel;
- Solicitar apoio à Polícia Militar do Estado de Pernambuco para garantia da segurança das famílias e profissionais envolvidos, durante o processo de transferência;
- Instituir a Comissão de Acompanhamento da Transferência, solicitando à CRO/7 e à CMT Engenharia a indicação de seus representantes, observando os perfis profissionais descritos no quadro 7 deste Plano;
- Verificar a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de entrega da Vila Produtiva Rural à comunidade.



10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL



Geraldo Barboza
Antropólogo
Analista Ambiental




Edivam José da Silva
Tecnólogo em Recursos Hídricos
Analista Ambiental

Visto:



Mariana Veríssimo Pacheco
Engenheira Agrônoma
Inspetora Ambiental

De acordo:



Rômulo Rogério J. Mascarenhas
Eng.º Ambiental – CREA113487D-TO
Coordenador Setorial – Salgueiro/PE




Alexandre Tadeu M. Rodrigues
Geógrafo – CREA 92766/D-TO
Coordenador de Campo



Anexo I - LAY-OUT DO NÚCLEO HABITACIONAL.



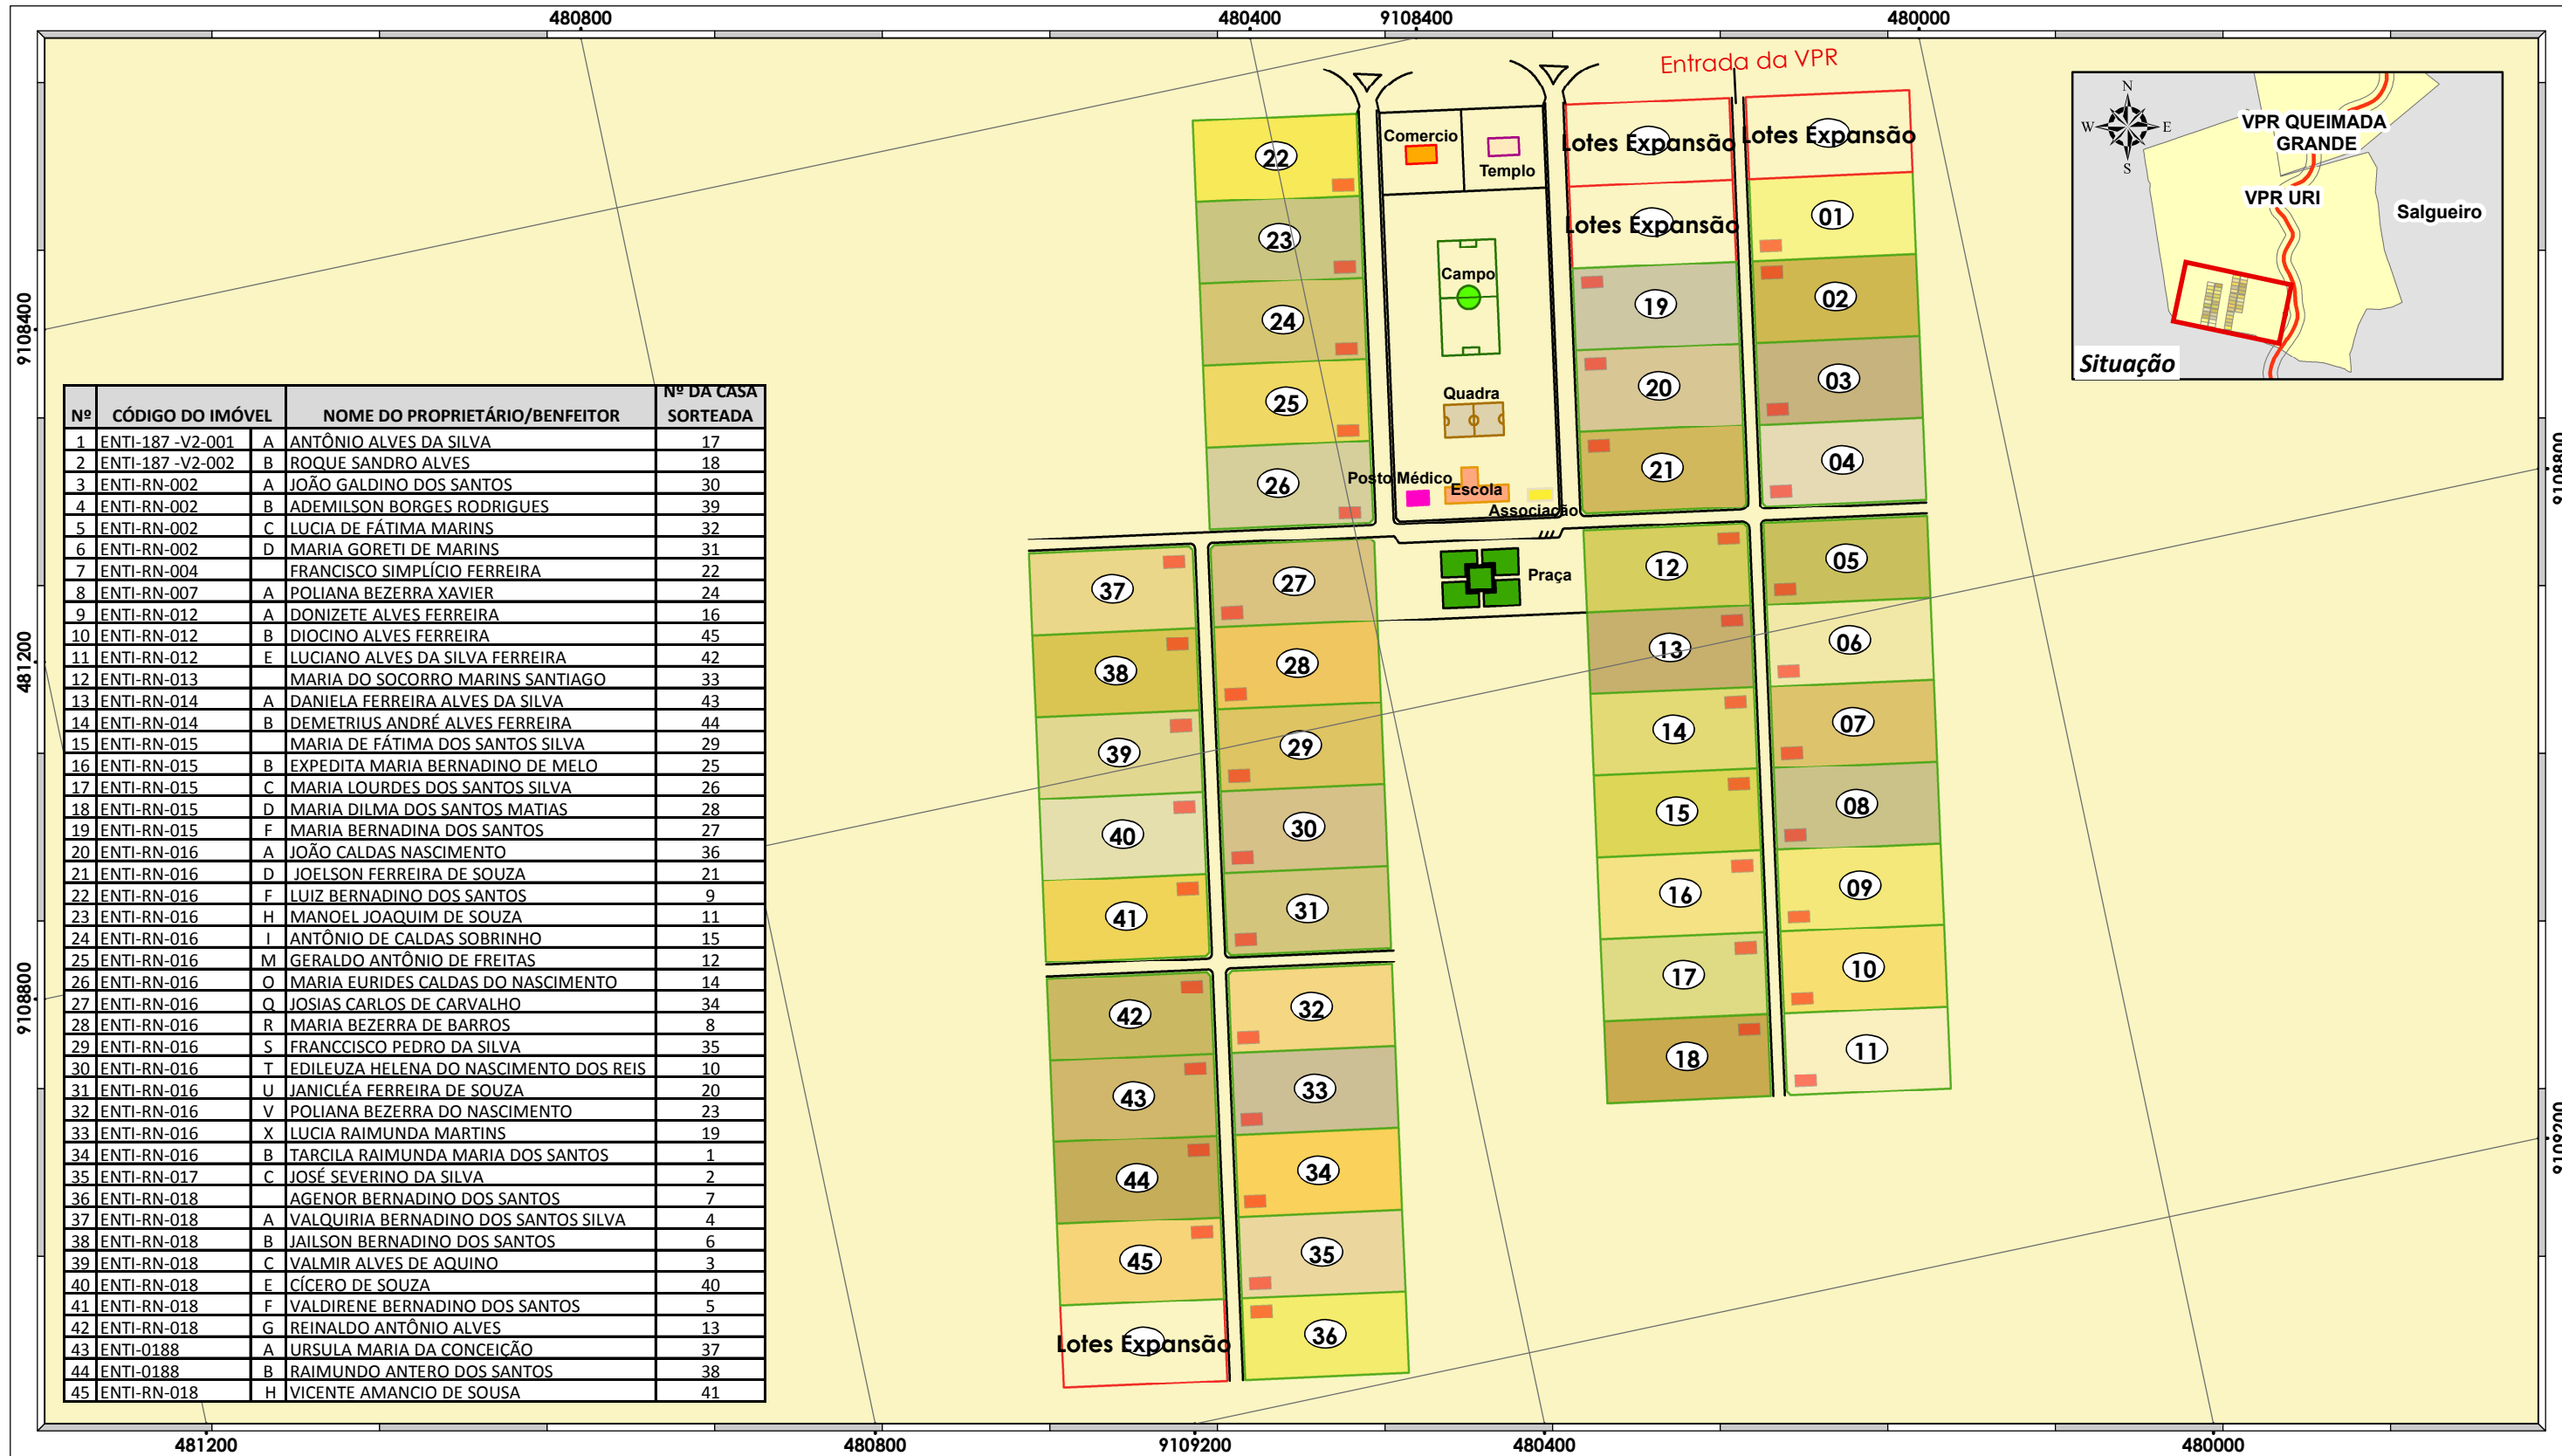

- Legenda**
- Lotes
 - Área de Expansão
 - Casas
 - Associação de Moradores
 - Campo de Futebol
 - Comercio
 - Escola
 - Posto Médico
 - Praça



CMT Ambiental
engenharia

Base de dados:
Mapa elaborado a partir de do projeto executivo dos canais de transposição das águas do rio São Francisco de janeiro/2010, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69 Fuso 24.

Produzido por: **Audrey Oliveira de Lima** Rubrica: *[assinatura]*
Analista Ambiental

Verificado por: **Fábio Henrique Julião** Rubrica: *[assinatura]*
Analista Ambiental

Desenho nº: **1711-MAP-1VC-94-08-172 R1**

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 08 - PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES

VPR URI - NÚCLEO HABITACIONAL

Data: **23/08/2010** Localização: **Eixo Norte -Trecho I - Lote 03**

Folha nº: **01** Revisão nº.: **02** Escala: **1:4.028**
